

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise:	BRETAGNE FORAGE SARL
Client:	GAEC LE POTAGER DE TREBESTAN
Maître d'oeuvre:	BRETAGNE FORAGE
Exploitant:	GAEC LE POTAGER DE TREBESTAN

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Trébestan

56760 PENESTIN

Coordonnées : **Longitude** 239 259 **Latitude** 2 285 284 **Altitude :** 0.00 m
Zone Lambert 2 étendu métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 06/05/2019 **Resp. M. Ouvrage :** FAVRY

Date fin de l'ouvrage : 06/05/2019 **Resp. M. Oeuvre :** PL

Machine : 903 **Resp. Chantier :** PL

Date début pompage : **Niveau statique non perturbé :** 5.00 m

Date fin de pompage : **Débit Maxi. d'essai :** 4.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : **Rabattement correspondant :** 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client: GAEC LE POTAGER DE TREBESTAN

Maître d'oeuvre: BRETAGNE FORAGE

Lieu de l'ouvrage : Trébestan

56760 PENESTIN

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	4.00	Remblai
4.00	85.00	Schiste
85.00	100.00	Granite

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
10.00	100.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
21.00	1.00
55.00	1.00
70.00	1.00
85.00	1.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	52.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
52.00	56.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	
56.00	60.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
60.00	64.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	
64.00	68.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
68.00	96.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	
96.00	100.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	10.00	4"7/8	125.00	Ciment	Prestobent	Cimentation par			


ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
10.00	10.20	Packer

Travaux réalisés : 1\1
du : 06/05/2019 au : 06/05/2019

Coordonnées de l'ouvrage :
 Lambert 2 étendu métrique
 Longitude (X): 239 259
 Latitude (Y): 2 285 284
 Altitude sol (Z): +0,000 m

Nombre de forages : 1

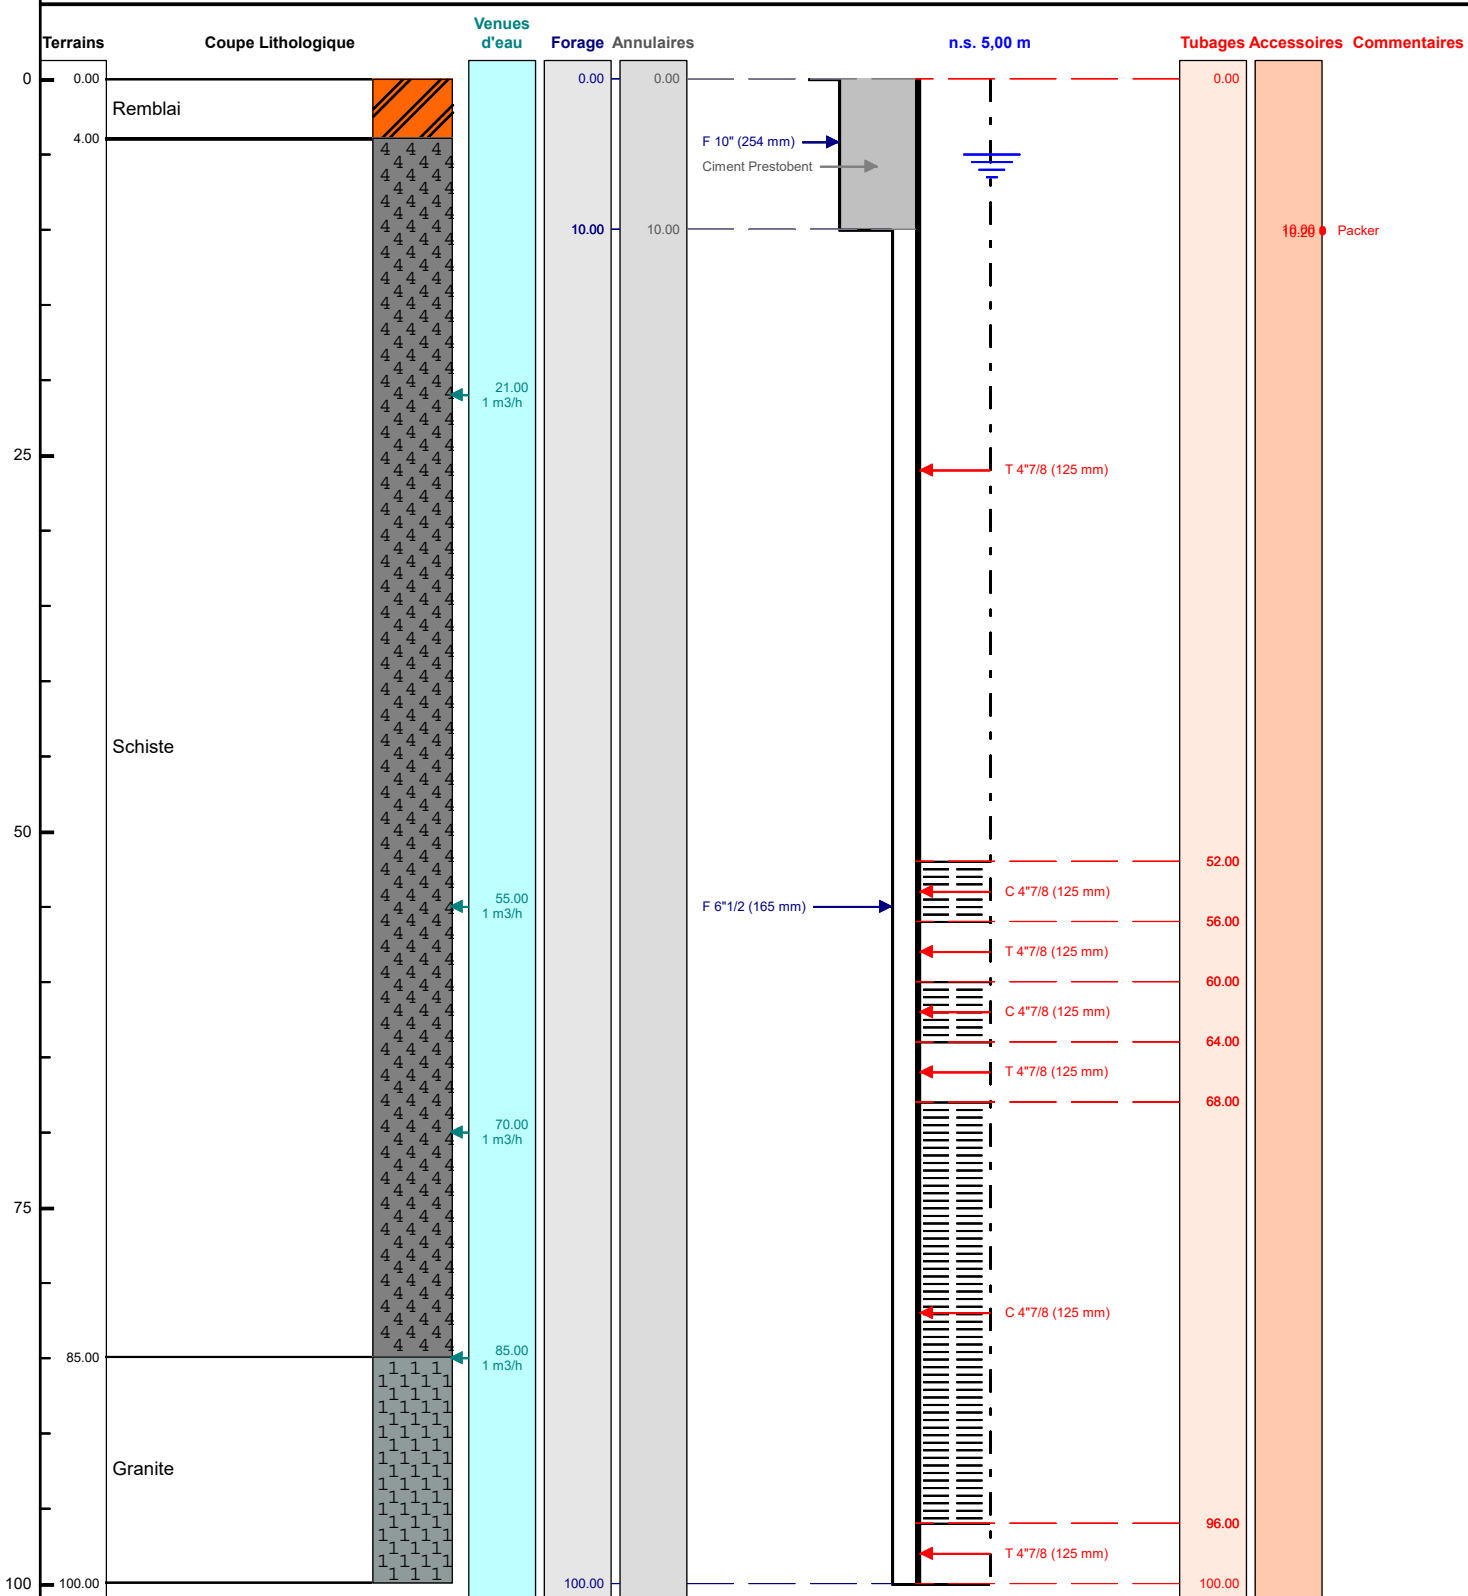

Le/...../..... à
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise
