



DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

B550037W70

Entreprise:	SARL PROSPER FORAGES
Client:	EARL BACH DE BORDES 18 route de la Chapelle 64190 CASTETNAU CAMBLONG
Maître d'oeuvre:	EARL BACH DE BORDES 18 route de la Chapelle 64190 CASTETNAU CAMBLONG
Exploitant:	EARL BACH DE BORDES 18 route de la Chapelle 64190 CASTETNAU CAMBLONG

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage :

64190 CASTETNAU CAMBLONG

Coordonnées :

Longitude 392 356

Latitude 6 255 578

Altitude : 151.46 m

Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 14/10/2019

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 15/10/2019

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Mori p30

Resp. Chantier :

Date début pompage : 15/10/2019

Niveau statique non perturbé : 4.42 m

Date fin de pompage : 15/10/2019

Débit Maxi. d'essai : 2.20 m³/h

Nombre de nappes identifiées : 1

Rabattement correspondant : 7.53 m

Notes : NS: 4.42m ND:11.95m - 2.20m³/h



TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client: EARL BACH DE BORDES
Maître d'oeuvre: EARL BACH DE BORDES
Lieu de l'ouvrage :
64190 CASTETNAU CAMBLONG

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	6.00	Terre argileuse sèche
6.00	8.00	Terre argileuse et grave humide
8.00	8.50	Marne grise sèche
8.50	9.00	Marne grise humide
9.00	13.00	Calcaire gris argileux + eau
13.00	18.00	Marne calcaire + eau

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	18.00	9"1/4	237.00	Autre	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	14.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
14.00	17.50	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	0.75	8
17.50	18.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-decanteur		
18.00	18.10	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Bouchon-de-pied		

REEMPLISSAGE


De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	18.00	4"7/8	125.00	Gravier	Gravier de sibelco	Gravitaire	Roule	1.00-1.25	

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
0.00	2.00	3m tube acier 219mm + socle en béton 1.75m x 1.75m x .30m avec capot métallique cadenassé

FORAGE D'EAU		Travaux réalisés : du : 14/10/2019 au : 15/10/2019	1/1
Client :	EARL BACH DE BORDES	Coordonnées de l'ouvrage :	
Maitre d'oeuvre :	EARL BACH DE BORDES	Lambert-93 métrique	
Localisation de l'ouvrage :	64190 CASTETNAU CAMBLONG	Longitude (X): 392 356	
		Latitude (Y): 6 255 578	
		Altitude sol (Z): +151,460 m	

Nombre de forages : 1

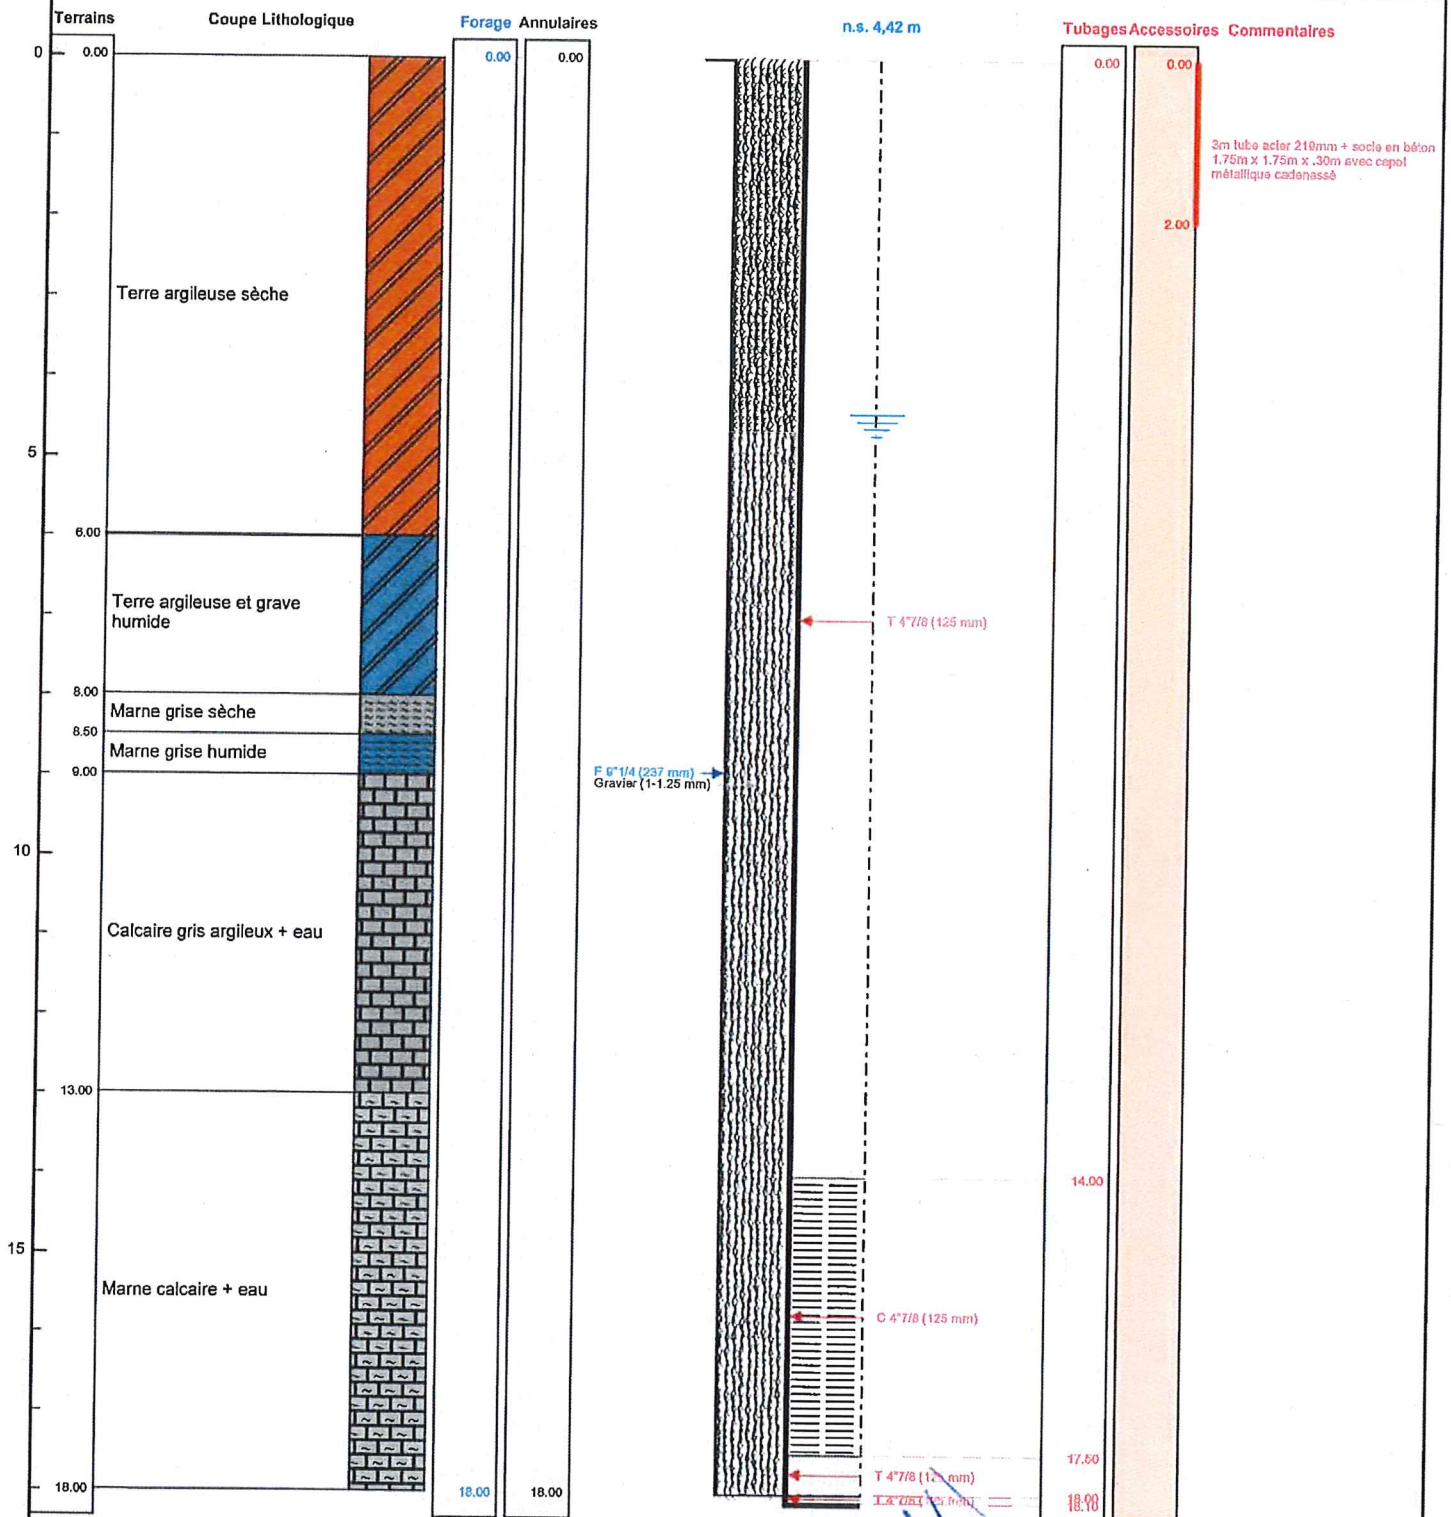

Le 4/11/2019 à 55.15h35
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise

Lambert-93 métrique Long.: 392 356 Lat.: 6 255 578 Alt.: +151,460 m
