

DOSSIER TECHNIQUE

BSS004APSU - PZ 01

Entreprise:	SOLUM HYDROGEOLOGIE
Client:	ETEX FRANCE Route de LAHONTAN 64270 CARRESSE CASSABER
Maître d'oeuvre:	ETEX FRANCE Route de LAHONTAN 64270 CARRESSE CASSABER
Exploitant:	

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : BAQUE

64270 CARRESSE CASSABER

Coordonnées : Longitude 000°59'18"W Latitude 043°29'8,4"N **Altitude :** 0.00 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 27/05/2020

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 27/05/2020

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Comacchio GEO 305

Resp. Chantier : DRUESNES

Date début pompage : 27/05/2020

Niveau statique non perturbé : 3.00 m

Date fin de pompage : 27/05/2020

Débit Maxi. d'essai : 0.60 m3/h

Nombre de nappes identifiées : 1

Rabattement correspondant : 2.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

BSS004APSU - PZ 01

Client:	ETEX FRANCE		
Maître d'oeuvre:	ETEX FRANCE		
Lieu de l'ouvrage :	BAQUE	64270	CARRESSE CASSABER

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.08	Enrobé
0.08	0.50	Remblais
0.50	3.50	Argile marron
3.50	5.00	Argile brune
5.00	8.00	Marne grisâtre à blanchâtre

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	8.00	6"	152.00	Turbo-forage	Eau-claire

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	1.00	2"3/8	60.00	4.50		P.v.c.	Tube-plein		
1.00	7.00	2"3/8	60.00	4.50		P.v.c.	Crepine fentes	0.50	

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	0.25	2"3/8	60.00	Ciment	Ciment-bentonite	Gravitaire			
0.25	0.60	2"3/8	60.00	Billes-argile	Compactonite				
0.60	7.00	2"3/8	60.00	Gravier	Autre	Gravitaire	Roule	2.00-4.00	


Client : ETEX FRANCE
 Maître d'oeuvre : ETEX FRANCE
 Localisation de l'ouvrage : BAQUE
 64270 CARRESSE CASSABER

Coordonnées de l'ouvrage :
 Géographique
 Longitude (X): 000°59'18"W
 Latitude (Y): 043°29'8,4"N
 Altitude sol (Z): +0,000 m

Echelle : 1/40

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

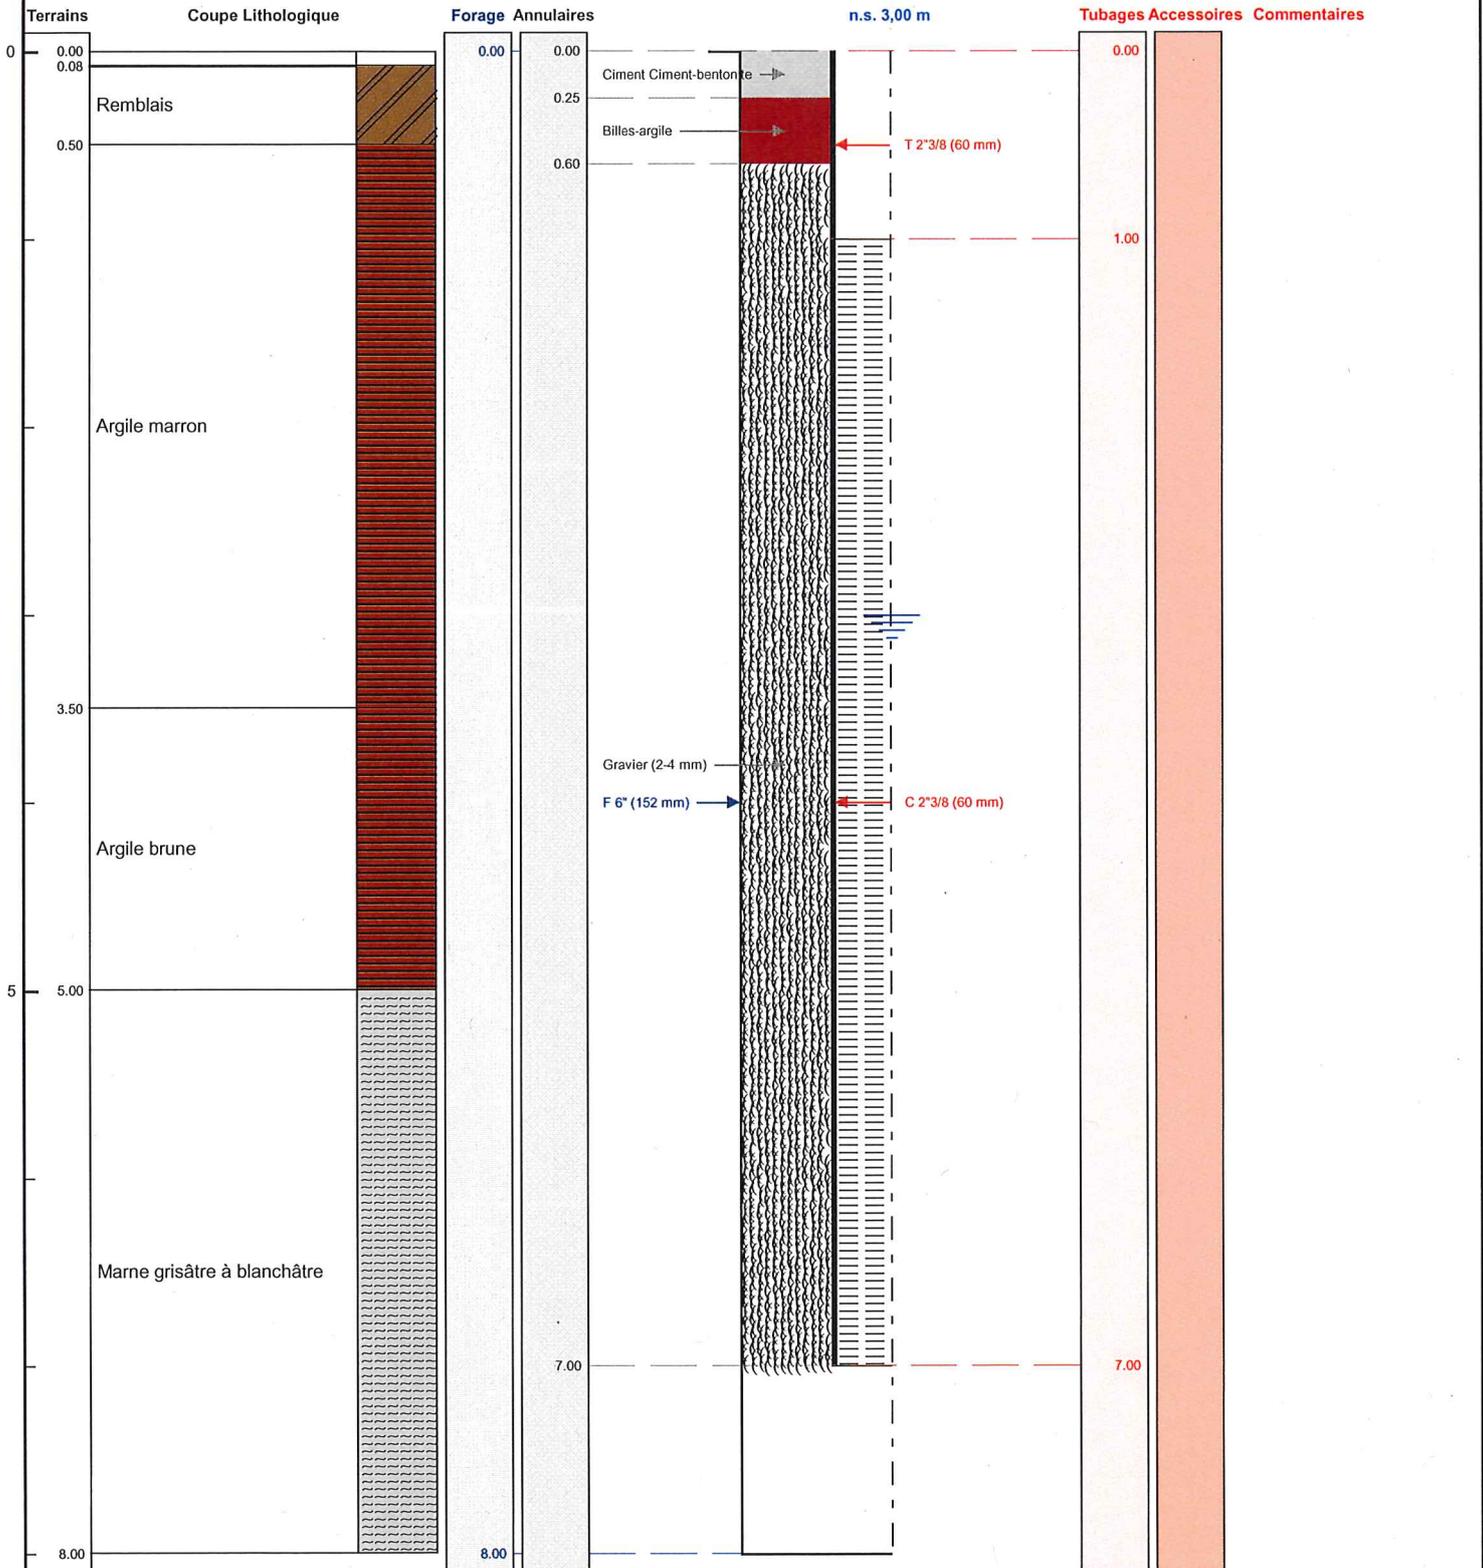

Le/...../..... à
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
 Tampon et signature du chef d'entreprise

BSS004APSU - PZ 01

Travaux réalisés :
du : 27/05/2020 au : 27/05/2020

Client :

ETEX FRANCE

Maitre d'oeuvre :

ETEX FRANCE

Localisation de l'ouvrage :

BAQUE

64270 | CARRESSE CASSABER

Coordonnées de l'ouvrage :

Géographique

X: 000°59'18"W

Y: 043°29'8,4"N

Z altitude sol: +0,000 m

