

DOSSIER TECHNIQUE

BSS004APSV - PZ 02

Entreprise:	SOLUM HYDROGEOLOGIE
Client:	ETEX FRANCE Route de LAHONTAN 64270 CARRESSE CASSABER
Maître d'oeuvre:	ETEX FRANCE Route de LAHONTAN 64270 CARRESSE CASSABER
Exploitant:	

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : BAQUE

64270 CARRESSE CASSABER

Coordonnées : Longitude 000°59'18,96"W Latitude 043°29'8,94"N Altitude : 0.00 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 27/05/2020

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 27/05/2020

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Comacchio GEO 305

Resp. Chantier : DRUESNES

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 3.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 0.60 m3/h

Nombre de nappes identifiées : 1

Rabattement correspondant : 2.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

BSS004APSV - PZ 02

Client:	ETEX FRANCE
Maître d'oeuvre:	ETEX FRANCE
Lieu de l'ouvrage :	BAQUE
	64270 CARRESSE CASSABER

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.10	Enrobé
0.10	0.50	Remblais
0.50	3.20	Argile marron avec quelques graviers
3.20	5.00	Argile brune
5.00	8.00	Marne grisâtre

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	8.00	6"	152.00	Turbo-forage	Eau-claire

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	1.60	2"3/8	60.00	4.50		P.v.c.	Tube-plein		
1.60	7.60	2"3/8	60.00	4.50		P.v.c.	Crepine fentes	0.50	

REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	0.25	2"3/8	60.00	Ciment	Ciment-bentonite	Gravitaire			
0.25	0.80	2"3/8	60.00	Billes-argile	Compactionite				
0.80	7.60	2"3/8	60.00	Gravier	Autre	Gravitaire	Roule	2.00-4.00	

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
0.00	0.00	Capot

Client : ETEX FRANCE
 Maître d'oeuvre : ETEX FRANCE
 Localisation de l'ouvrage : BAQUE

64270 CARRESSE CASSABER


Coordonnées de l'ouvrage :

Géographique
 Longitude (X): 000°59'18,96"W
 Latitude (Y): 043°29'8,94"N
 Altitude sol (Z): +0,000 m

Echelle : 1/40

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

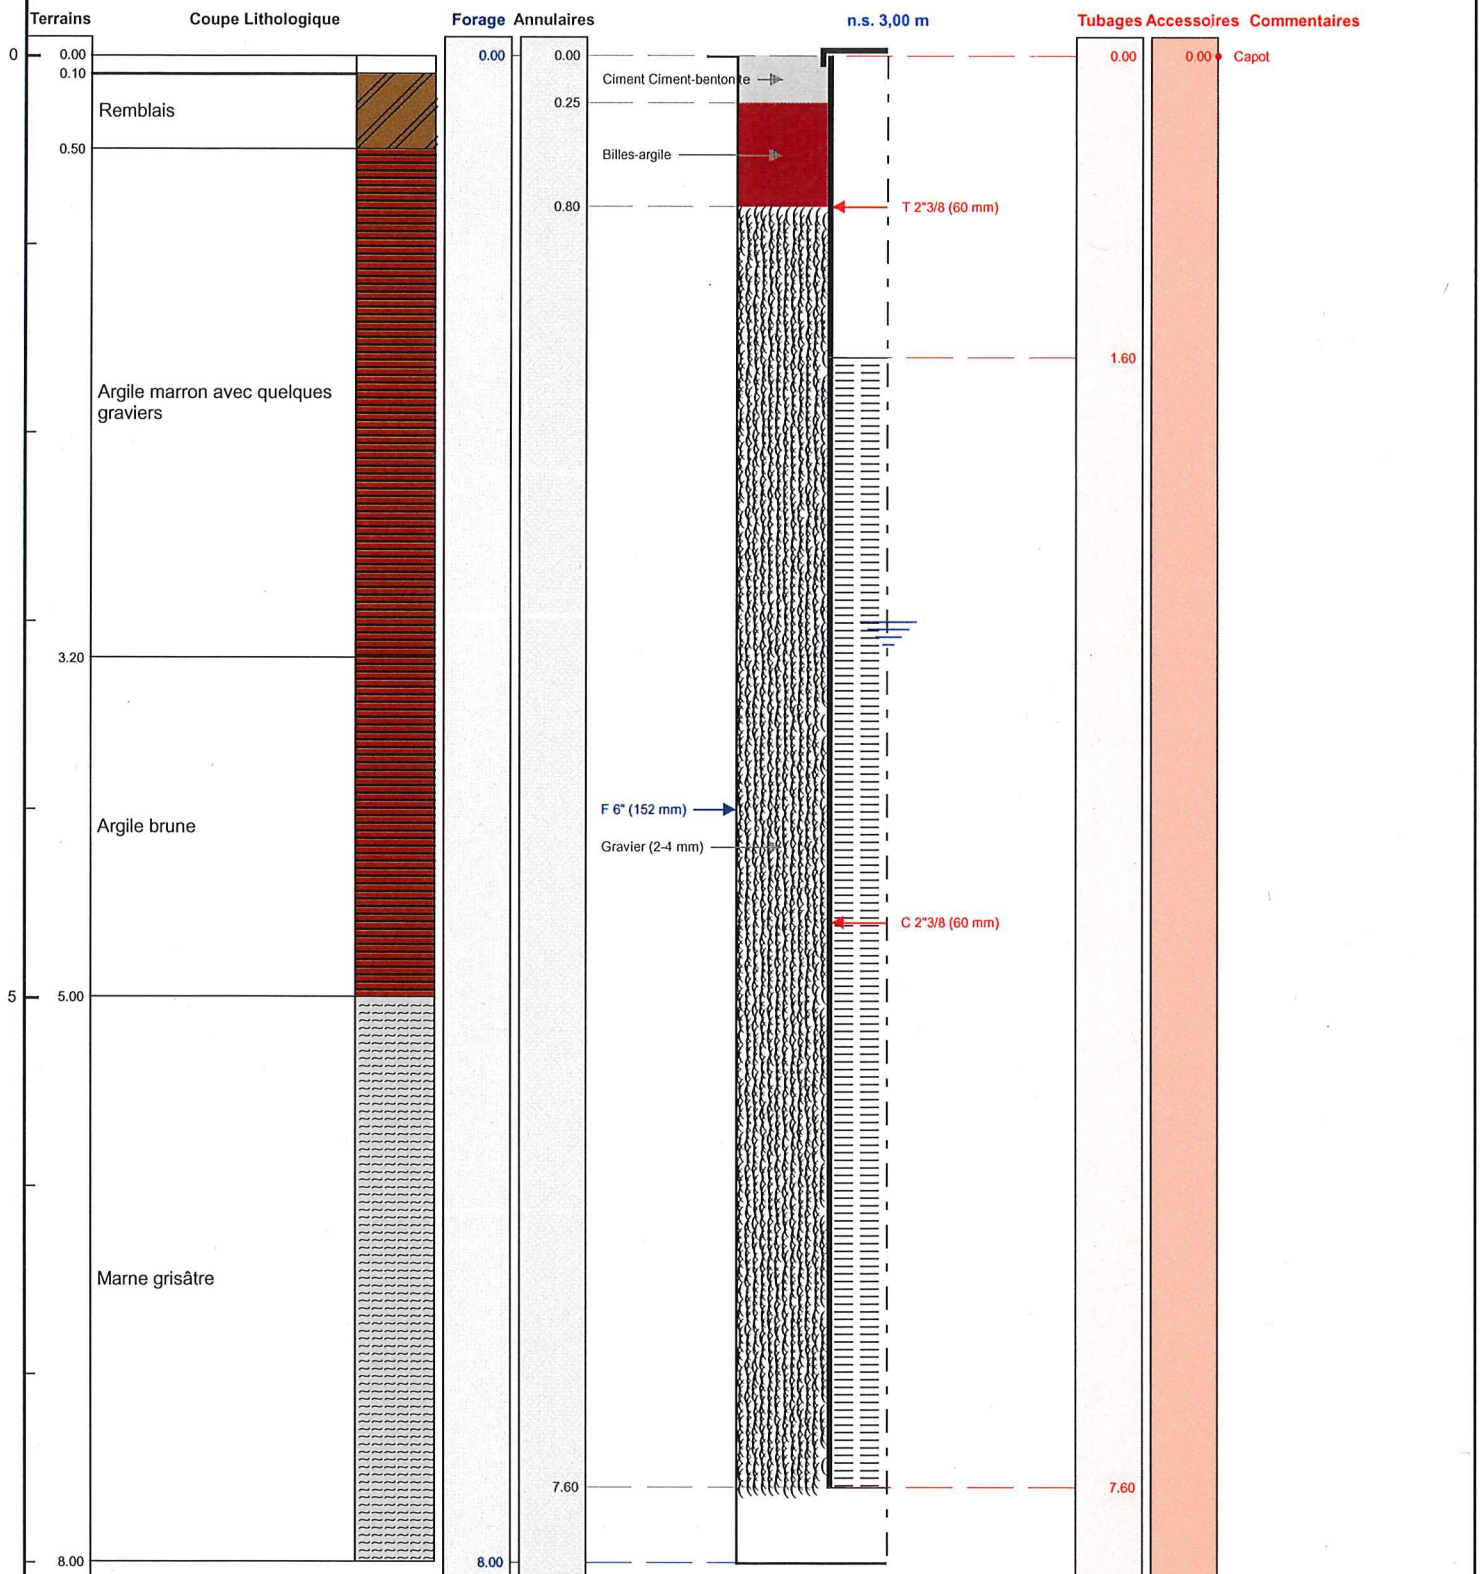

Le à
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
 Tampon et signature du chef d'entreprise

BSS004APSV - PZ 02

Travaux réalisés :
du : 27/05/2020 au : 27/05/2020

Client : ETEX FRANCE

Maitre d'oeuvre : ETEX FRANCE

Localisation de l'ouvrage : BAQUE

64270 CARRESSE CASSABER

Coordonnées de l'ouvrage :

Géographique

X: 000°59'18,96"W

Y: 043°29'8,94"N

Z altitude sol: +0,000 m

