

## FORAGE D'EAU

**Exploitant:**

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

PAGE: 1

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

02270

CHALANDRY

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	3.00	Terre et craie
3.00	35.00	Craie compact
35.00	49.00	Craie plus compact

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	49.00	6"3/4	171.00	Rotary	Eau-claire

\*Reconnaissance

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	40.00	4"7/8	125.00	5.00	5	P.v.c.	Tube-plein		
40.00	49.00	4"7/8	125.00	5.00	5	P.v.c.	Crepine fentes		

## REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	11.50	4"7/8	125.00	Ciment	Clk	Gravitaire			
11.50	12.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Sopranite				

Code BSS : BSS004ASVH / X

**FORAGE D'EAU****Travaux réalisés :****1\1**

du : 01/07/2020 au : 06/07/2020

**Client :****Maitre d'oeuvre :****Localisation de l'ouvrage :****02270 CHALANDRY****Coordonnées de l'ouvrage :**

Lambert-93 métrique

Longitude (X): 746 365


Latitude (Y): 6 951 584

Altitude sol (Z): +91,000 m

Echelle : 1/246

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

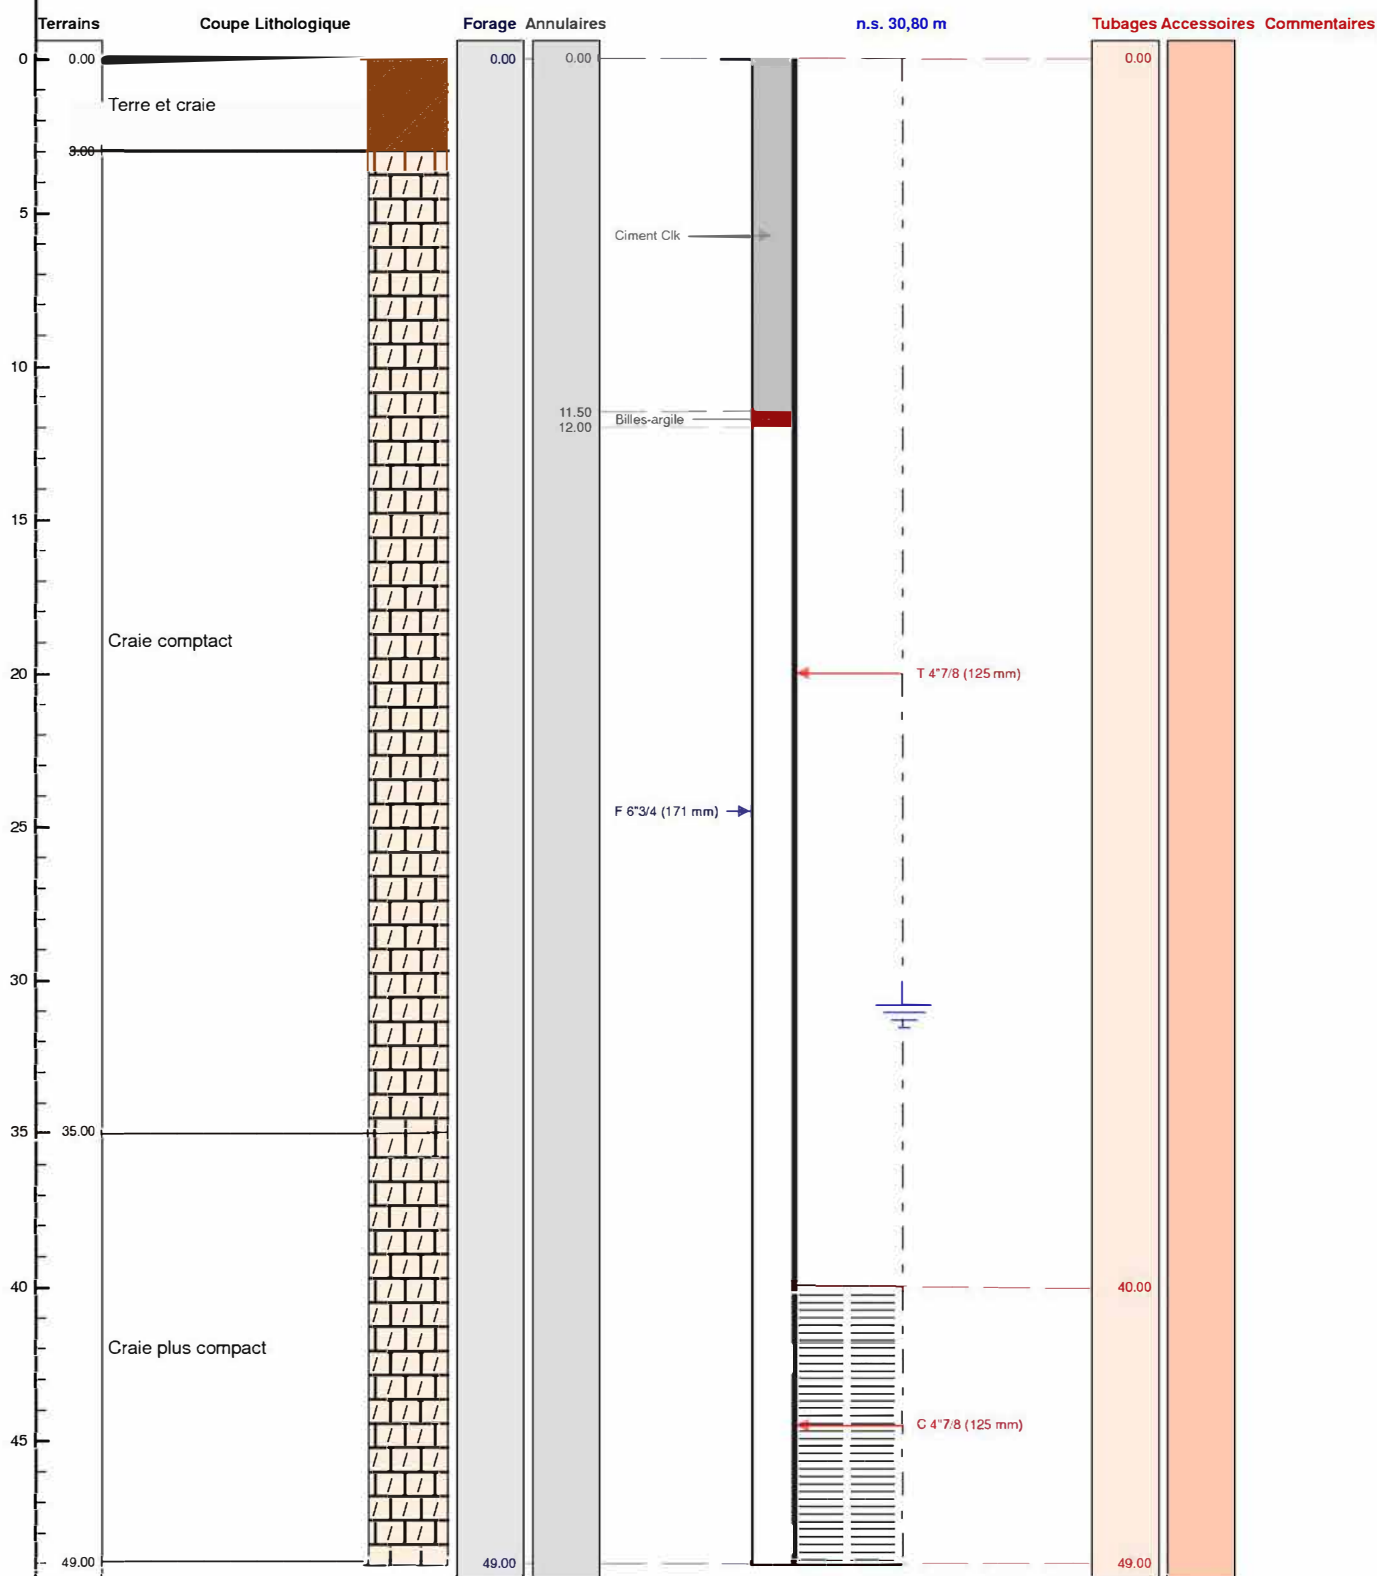

Le ...../...../..... à .....

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise
