



# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU

**Entreprise:** SARL PROSPER FORAGES

**Client:**

**Maître d'oeuvre:**

**Exploitant:**

### BSS004ATWB

**Code National BSS :**

**N° Déclaration \*\* :**

**Police de l'eau \* :**

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** 815 Chemin de Camentron  
40660 MESSANGES

**Coordonnées :**      **Longitude** 348 062      **Latitude** 6 310 164      **Altitude :** 6.32 m  
**Zone** Lambert-93 métrique

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :** 22/07/2020

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 23/07/2020

**Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :** MORI P30

**Resp. Chantier :**

**Date début pompage :** 23/07/2020

**Niveau statique non perturbé :** 1.73 m

**Date fin de pompage :**

**Débit Maxi. d'essai :** 13.00 m3/h

**Nombre de nappes identifiées :** 1

**Rabattement correspondant :** 1.77 m

**Notes :** NS: 1.73m ND: 2.40m - 5m3/h 3.10m - 10m3/h 3.50m - 13m3/h



## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

Client:

**BSS004ATWB**

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : 815 Chemin de Camentron

40660 MESSANGES

**LITHOLOGIE**

De	à	Libellé
0.00	0.10	Terre végétale
0.10	1.50	Sable marron foncé
1.50	5.50	Sable beige mouillé
5.50	5.60	Passage argileux
5.60	9.50	Sable gris mouillé et petits passages argileux
9.50	12.00	Sable gris

**FORAGE**

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	12.00	8"5/8	219.00	Battage	Air

\* Reconnaissance

**TUBAGE**

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	7.50	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
7.50	11.50	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	0.50	5
11.50	12.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-decanteur		
12.00	12.10	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Bouchon-de-pied		

**REPLISSAGE**

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	12.00	4"7/8	125.00	Gravier	Gravier de sibelco	Gravitaire	Roule	1.00-2.50	

# BSS004ATWB

## FORAGE D'EAU

Travaux réalisés : 1/1  
du : 22/07/2020 au : 23/07/2020


Client :  
Maitre d'oeuvre :  
Localisation de l'ouvrage : 815 Chemin de Camentron  
40660 MESSANGES

Coordonnées de l'ouvrage :  
Lambert-93 métrique  
Longitude (X): 348 062  
Latitude (Y): 6 310 164  
Altitude sol (Z): +6,320 m

Echelle : 1/61

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

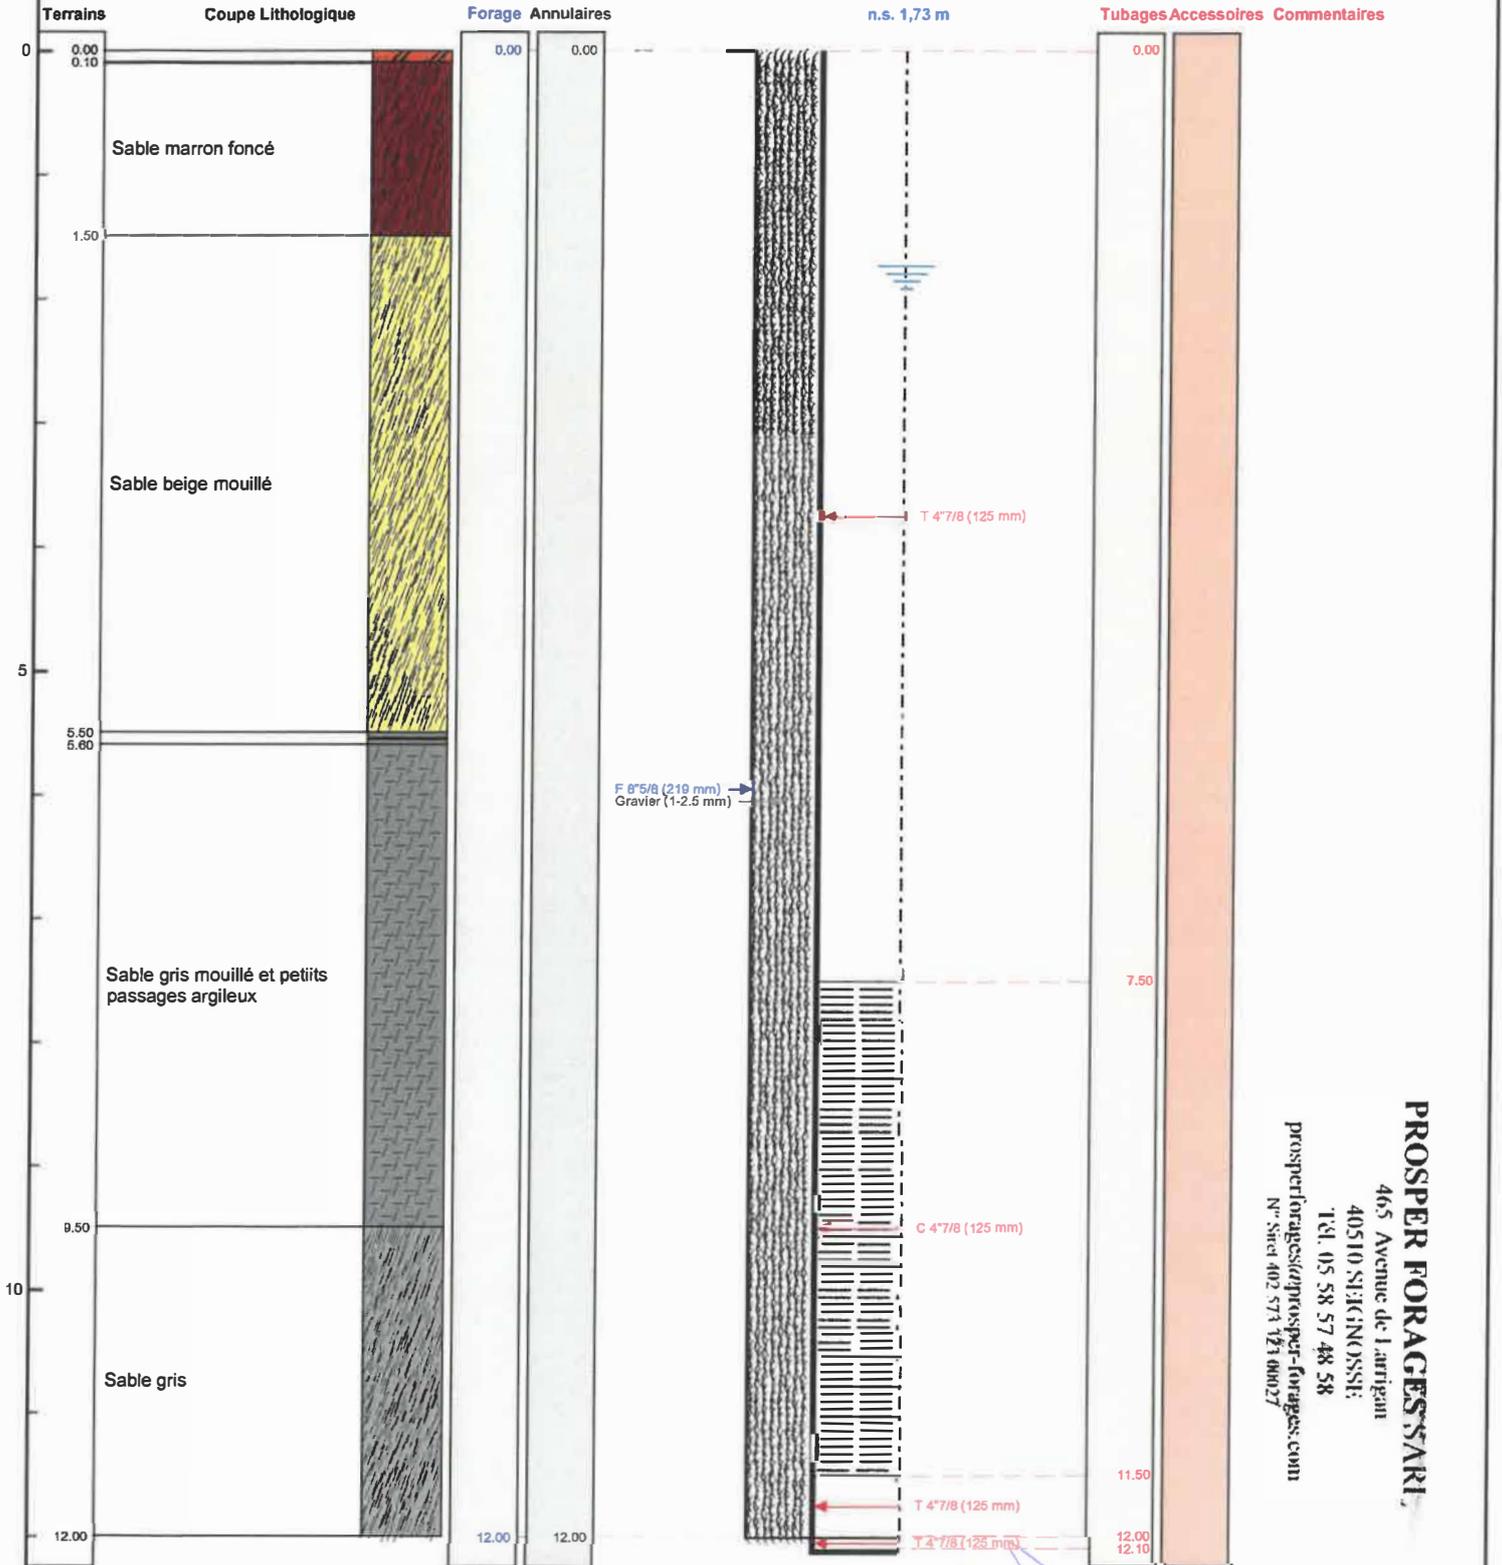

**PROSPER FORAGES SARI**  
465 Avenue de Larrigan  
40510 SIEGINOSSE  
Tél. 05 58 57 48 58  
prospertforages@prospertforages.com  
N° Siret 402 573 121 00027



Le 21/10/2020 à SIEGINOSSE  
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE  
Tampon et signature du chef d'entreprise
