

DOSSIER TECHNIQUE

SNDAGE S1

Entreprise: CMT FONDATIONS

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage :

63119 CHATEAUGAY

Coordonnées :

Longitude
Zone

Latitude

Altitude :

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 02/09/2020

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 02/09/2020

Resp. M. Oeuvre :

Machine : ECOFORE 402/3

Resp. Chantier : THEVENY

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé :

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai :

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant :

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

SNDAGE S1

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

63119

CHATEAUGAY

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.50	TERRE
0.50	8.00	BASALTE
8.00	30.00	BASALTE
30.00	40.00	ARGILE

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	40.00	4"1/2	114.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
9.00	0.60

SNDAGE S1

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage :

63119 CHATEAUGAY

Travaux réalisés :

du : 02/09/2020 au : 02/09/2020

1/1

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique

Longitude (X):


Latitude (Y):

Altitude sol (Z):

Echelle : 1/201

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

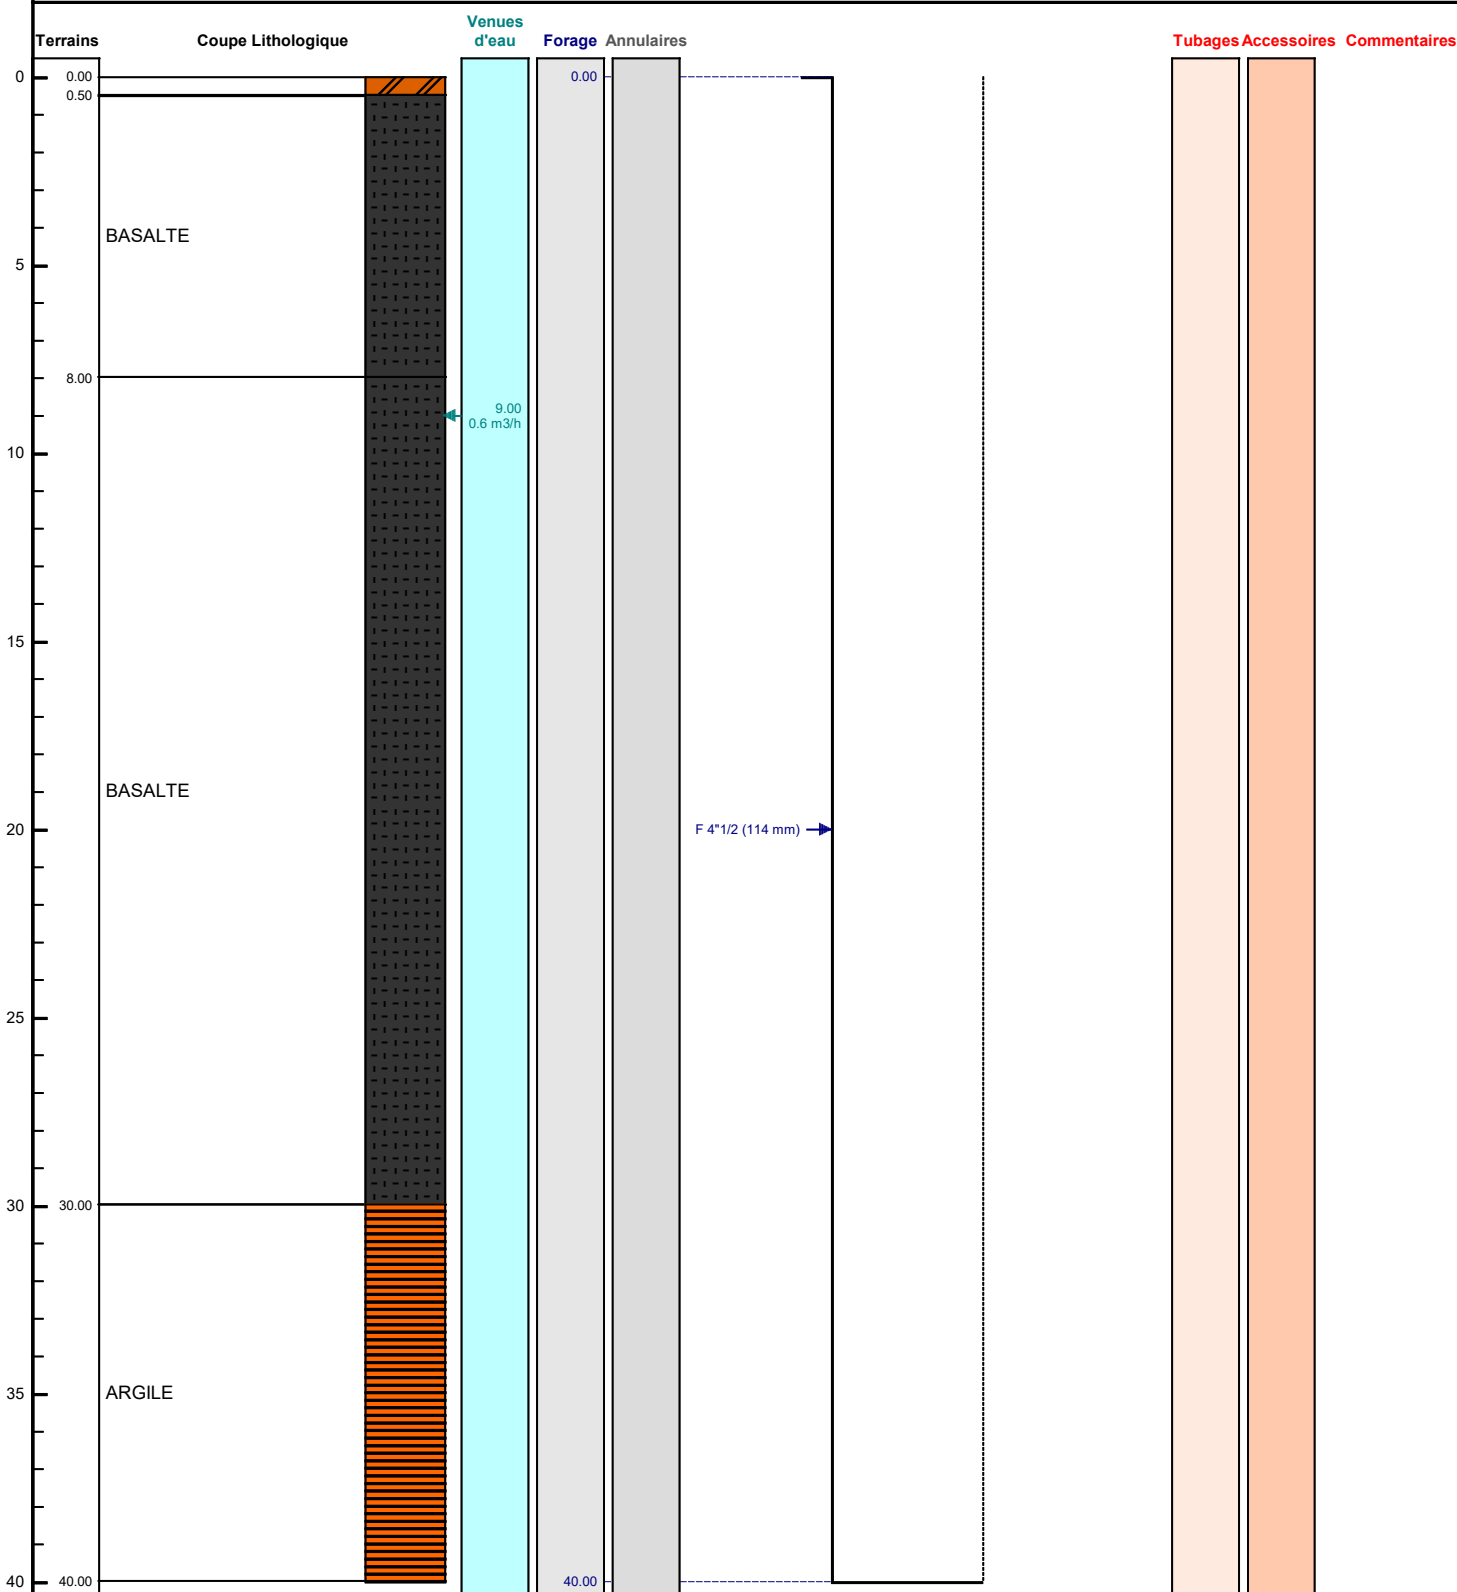

Le/...../..... à
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
 Tampon et signature du chef d'entreprise
