

# DOSSIER TECHNIQUE

## SONDAGE S3

Entreprise: CMT FONDATIONS

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :**

63119 CHATEAUGAY

**Coordonnées :**

Longitude  
Zone

Latitude

**Altitude :**

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :** 28/09/2020

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 28/09/2020

**Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :** ECOFORE 402/3

**Resp. Chantier :** THEVENY

**Date début pompage :**

**Niveau statique non perturbé :**

**Date fin de pompage :**

**Débit Maxi. d'essai :**

**Nombre de nappes identifiées :**

**Rabattement correspondant :**

**Notes :**

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## SONDAGE S3

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

63119

CHATEAUGAY

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.50	TERRE
0.50	8.00	BASALTE
8.00	31.00	BASALTE
30.00	41.00	ARGILE

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	41.00	4"1/2	114.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
15.00	0.60

# SONDAGE S3

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage :

63119 CHATEAUGAY

Travaux réalisés :

du : 28/09/2020 au : 28/09/2020

1/1

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique

Longitude (X):


Latitude (Y):

Altitude sol (Z):

Echelle : 1/206

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

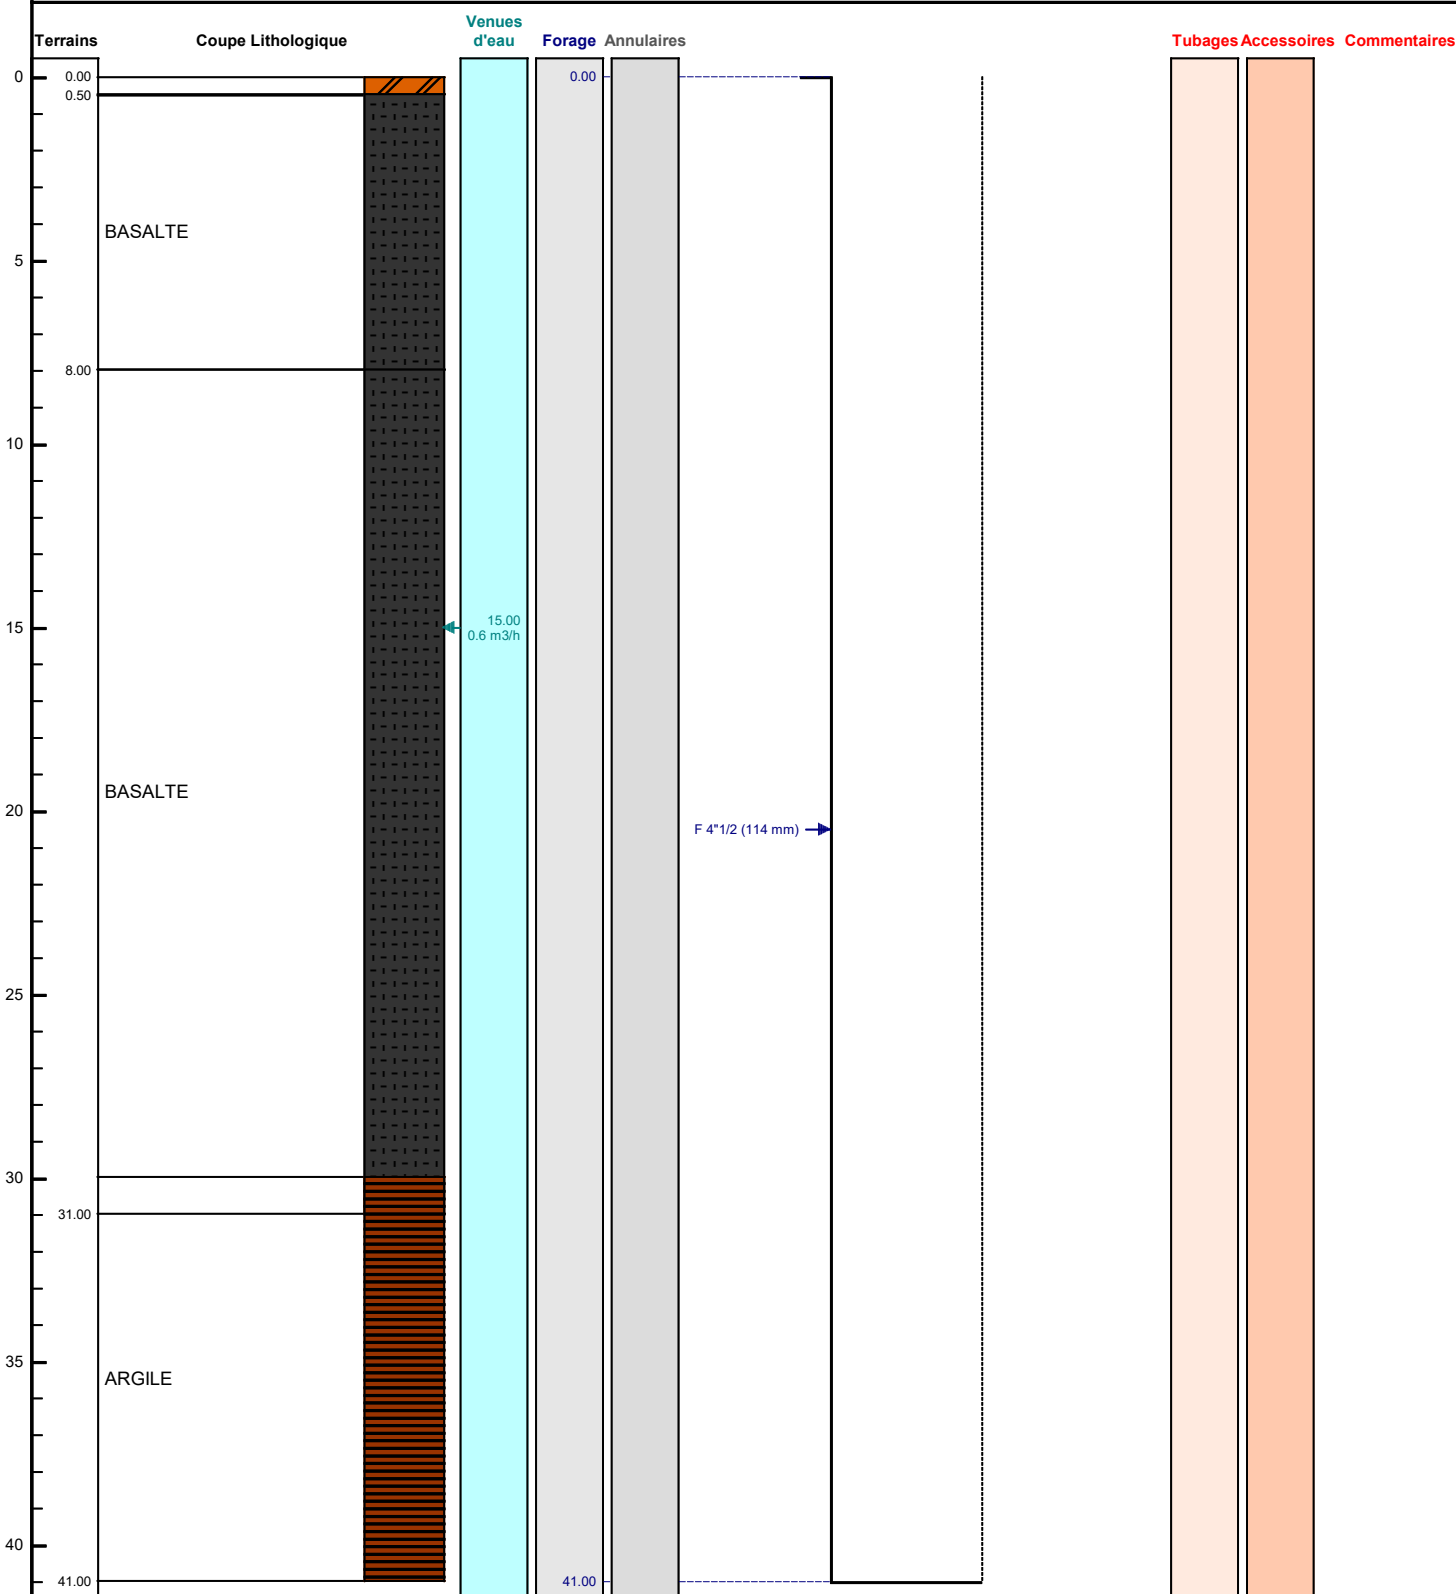

Le ...../...../..... à .....  
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE  
 Tampon et signature du chef d'entreprise

Lambert 1 carto métrique Long.: 0 Lat.: 0 Alt.: +0,000 m

PAGE: 3
