

# DOSSIER TECHNIQUE

## SONDAGE S5

Entreprise: CMT FONDATIONS

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

---

**Lieu de l'ouvrage :**

63119 CHATEAUGAY

**Coordonnées :**

Longitude  
Zone

Latitude

**Altitude :**

**Nombre de forages :** 1

---

**Date début de l'ouvrage :** 30/09/2020

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 30/09/2020

**Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :** ECOFORE 402/3

**Resp. Chantier :** THEVENY

---

**Date début pompage :**

**Niveau statique non perturbé :**

**Date fin de pompage :**

**Débit Maxi. d'essai :**

**Nombre de nappes identifiées :**

**Rabattement correspondant :**

---

**Notes :**

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## SONDAGE S5

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

63119

CHATEAUGAY

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.50	TERRE
0.50	29.00	BASALTE
29.00	39.00	ARGILE

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	42.00	4"1/2	114.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
11.00	0.50

# SONDAGE S5

Client :  
Maitre d'oeuvre :  
Localisation de l'ouvrage :

63119 CHATEAUGAY

Travaux réalisés :  
du : 30/09/2020 au : 30/09/2020


1/1

Coordonnées de l'ouvrage :  
Lambert 1 carto métrique  
Longitude (X):  
Latitude (Y):  
Altitude sol (Z):

Echelle : 1/211

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

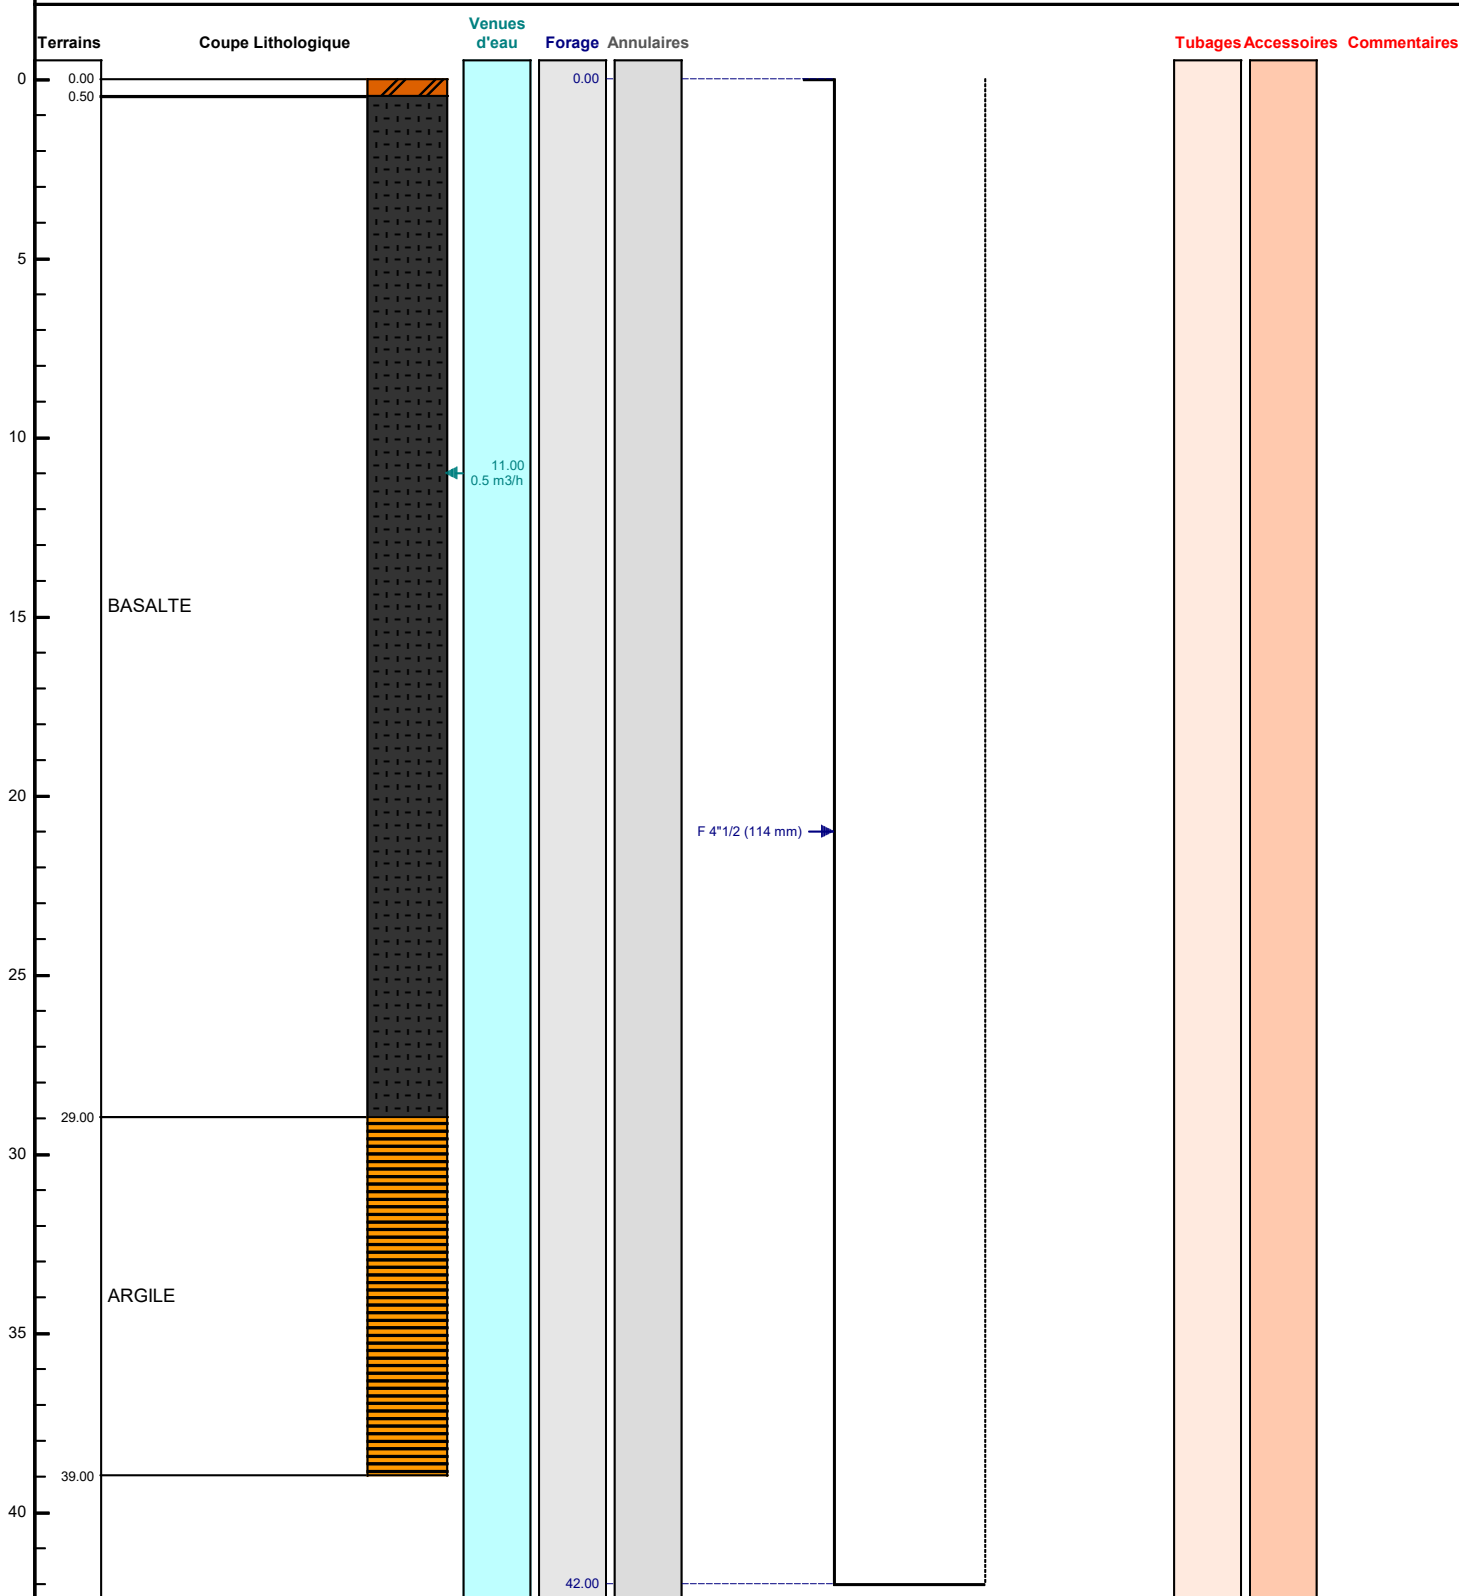

Le ...../...../..... à .....  
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE  
Tampon et signature du chef d'entreprise

Lambert 1 carto métrique Long.: 0 Lat.: 0 Alt.: +0,000 m

PAGE: 3
