

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU N°1

BSS004AXEG

Entreprise: SARL PROSPER FORAGES

Client: CEINTURE VERTE PAYS DE BEARN
HOTEL DE FRANCE
64000 PAU

Maître d'oeuvre: CEINTURE VERTE PAYS DE BEARN
HOTEL DE FRANCE
64000 PAU

Exploitant: CEINTURE VERTE PAYS DE BEARN
HOTEL DE FRANCE
64000 PAU

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : RD 817

64230 LESCAR

Coordonnées :

Longitude 422 411

Latitude 6 255 467

Altitude : 191.00 m

Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 02/11/2020

Res p. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 03/11/2020

Resp. M. Oeuvre :

Machine : MORI P30

Res p. Chantier :

Date début pom page :

Niveau statique non perturbé : 7.98 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 2.50 m3/h

Nombre de nappes identifiées : 1

Rabattement correspondant : 8.02 m

Notes : NS - 7.98m

Débit 0.3m³/hr 1h30, ND 8.52m // Débit 0.5m³/hr 1hr, ND - 10.29m // Débit 1m³/hr 1h00, ND -10.29m// Débit 3m³/hr 2h40, ND - 21.30m// Débit 2.50m³/hr 1h00, ND - 16.0 m niveau stable



TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU N°1

BSS004AXEG

Client: CEINTURE VERTE PAYS DE BEARN
Maître d'oeuvre: CEINTURE VERTE PAYS DE BEARN
Lieu de l'ouvrage : RD 817
 64230 LESCAR

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.70	Terre végétale
0.70	2.00	Argile marron molle
2.00	3.00	Argile rouge molle
3.00	6.00	Argile marron + grave
6.00	7.50	Argile sableuse + grave sèche
7.50	12.00	Argile marron molle + grave
12.00	15.00	Argile + grave humide
15.00	22.50	Gravier sableux + argile+ eau
22.50	23.50	Argile marron dure

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	23.50	8"5/8	219.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	16.00	4"7/8	125.00	8.50		P.v.c.	Tube-plein		
16.00	22.00	4"7/8	125.00	8.50		P.v.c.	Crepine fentes	0.50	5
22.00	23.50	4"7/8	125.00	8.50		P.v.c.	Tube-decanteur		
23.50	23.60	4"7/8	125.00	8.50		P.v.c.	Bouchon-de-pied		

REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	23.50	4"7/8	125.00	Gravier	Gravier de sibelco	Gravitaire	Roule	1.00-2.50	

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
0.00	0.00	Socle en béton 1.75m x 1.75m avec capot métallique cadenassé
0.00	2.00	Cimentation de l'espace inter-annulaire

FORAGE D'EAU N°1

Travaux réalisés : 1/2
du : 02/11/2020 au : 03/11/2020


Client :	CEINTURE VERTE PAYS DE BEARN
Maitre d'oeuvre :	CEINTURE VERTE PAYS DE BEARN
Localisation de l'ouvrage :	RD 817
	64230 LESCAR

Coordonnées de l'ouvrage :
 Lambert-93 métrique
 Longitude (X): 422 411
 Latitude (Y): 6 255 467
 Altitude sol (Z): +191,000 m

Echelle : 1/119

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

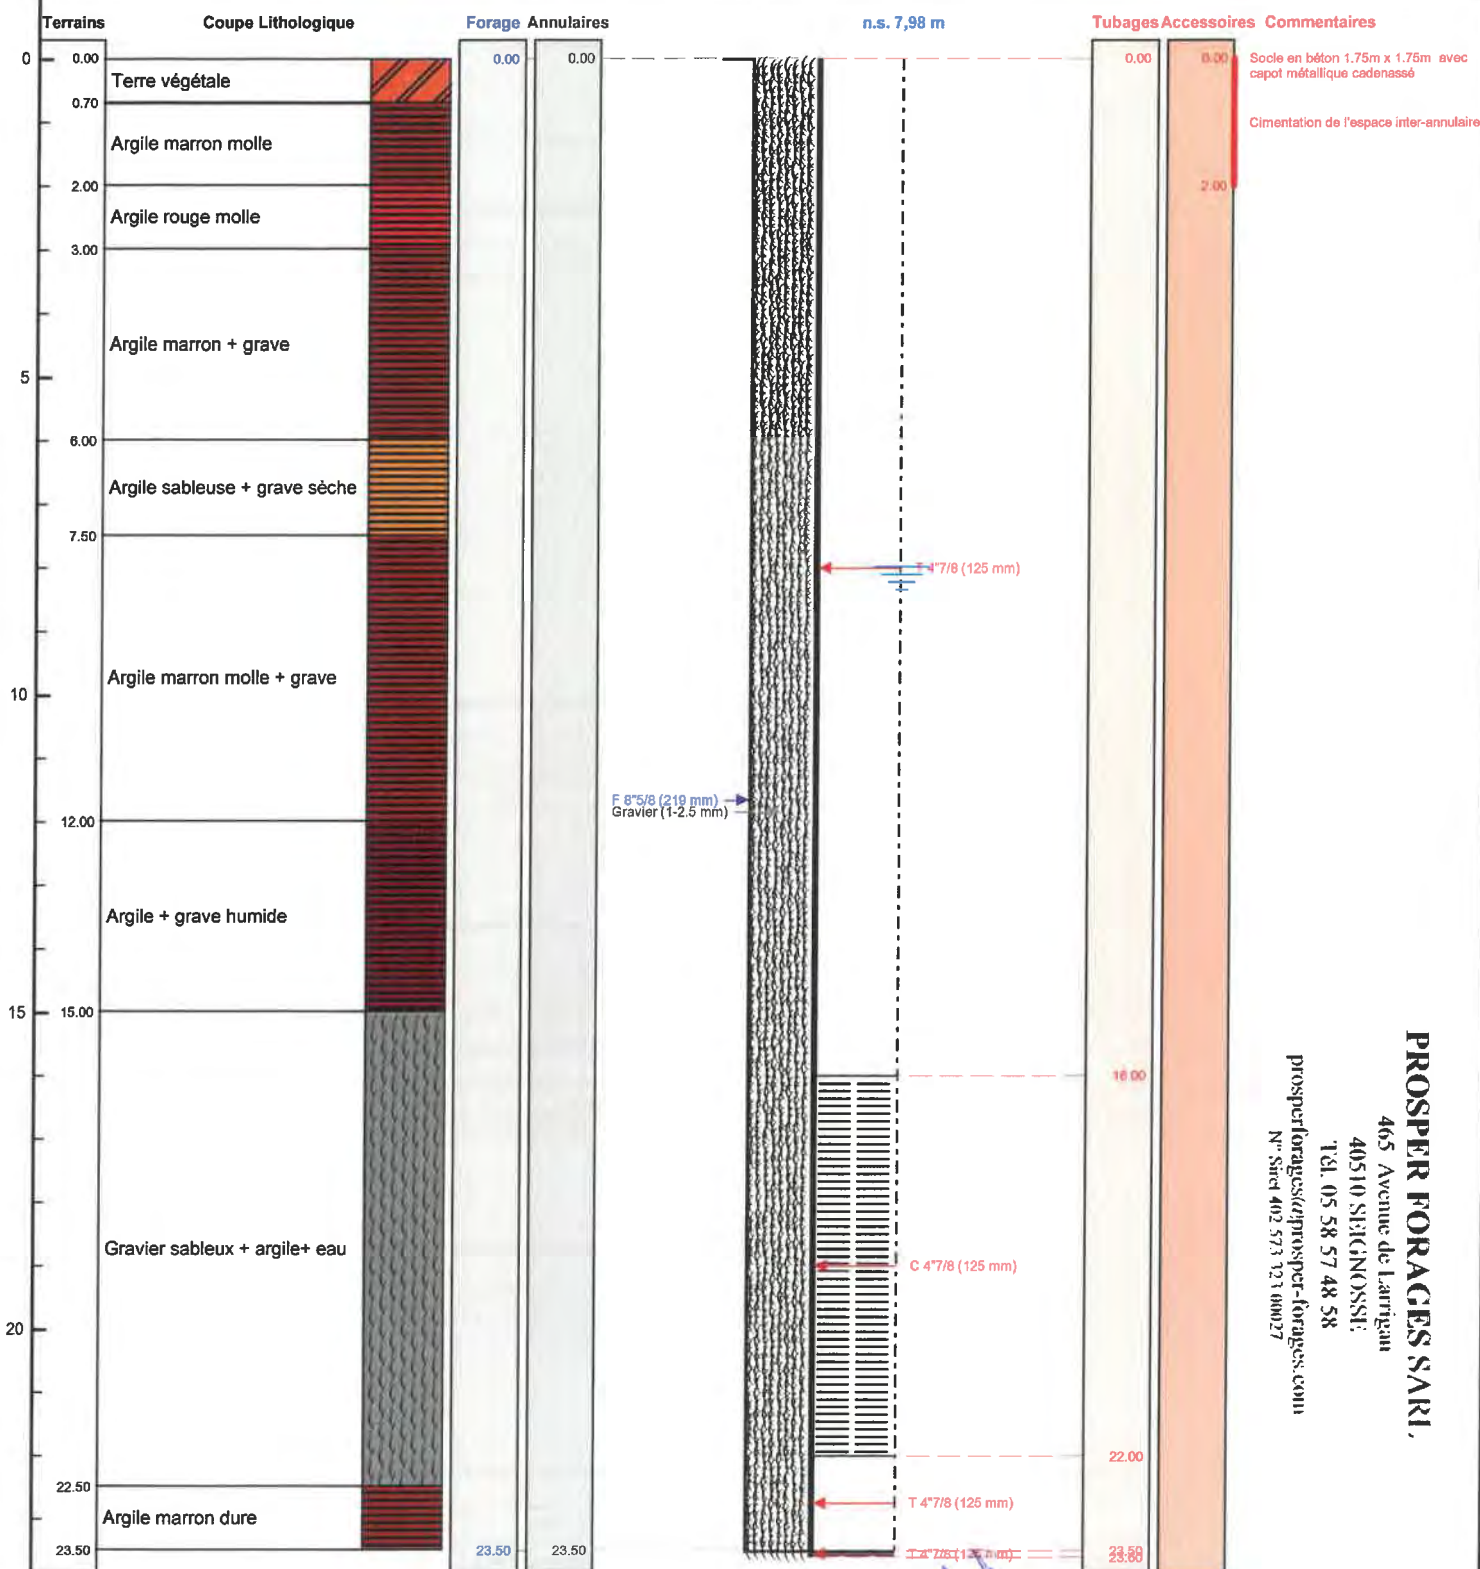

Le 12/11/2020 à 26/11/2020
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise

PROSPER FORAGES SARI
4065 Avenue de Larrigan
40510 SEIGNOSSAT
Tél. 05 58 57 48 58
prosperforages@prospersar.com
N° Siret 402 573 123 00027
