

S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-51.com


BSS004AXQM

**TRAVAUX DE FORAGE
POUR
LES BESOINS
DE L'EXPLOITATION
AGRICOLE**

à

**Mairy Sur Marne (51)
SARL AMDS**

**TRAVAUX REALISES
DU
26 Aout au 2 Septembre 2020**

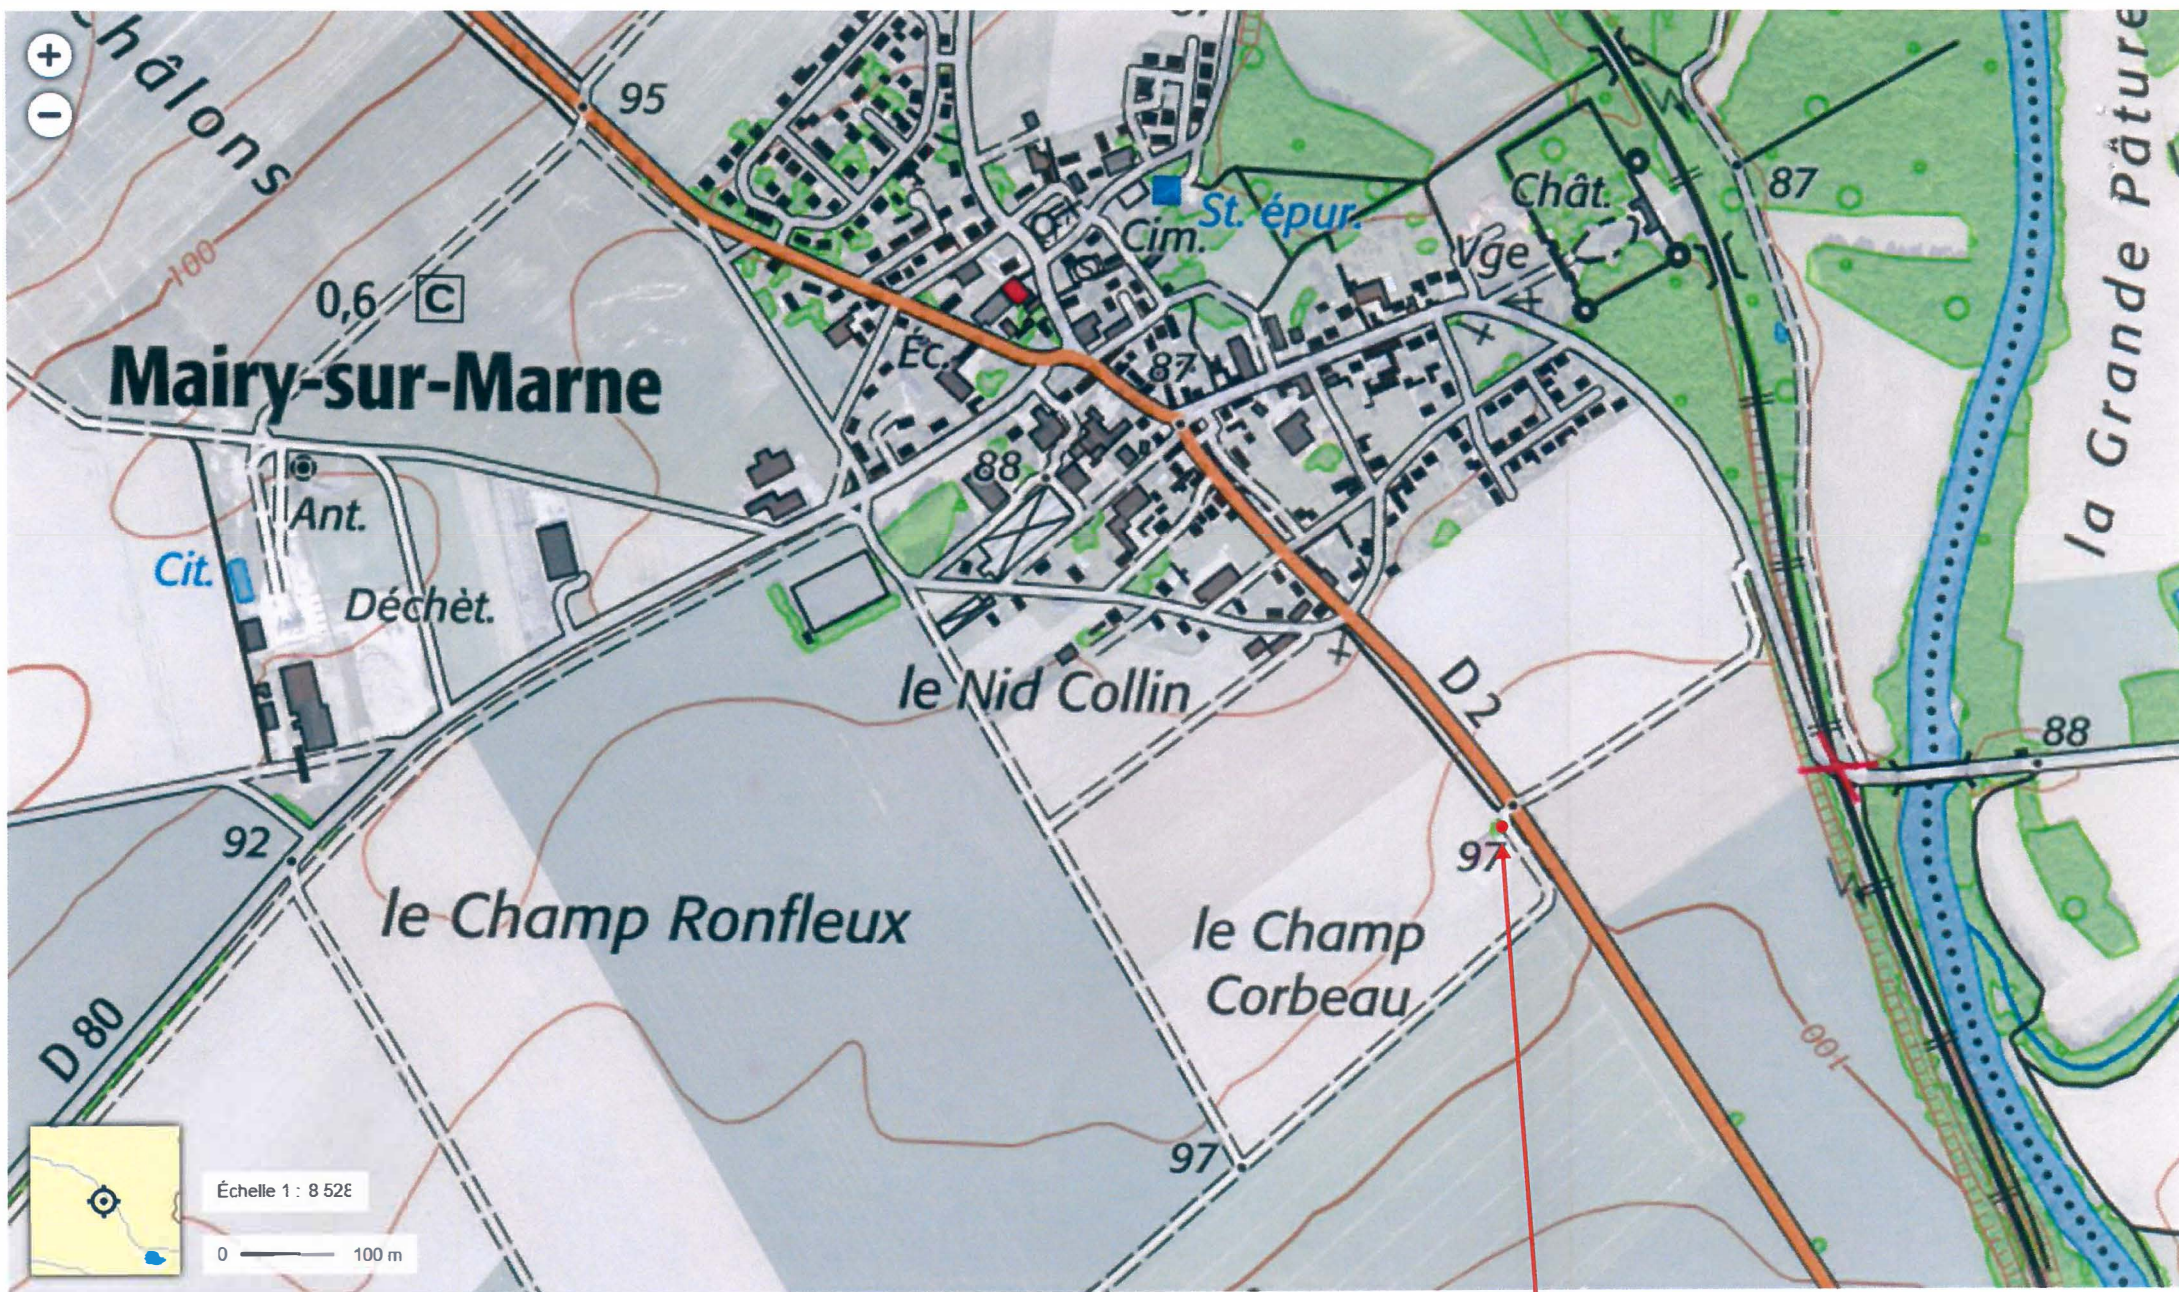

PROJET
Alt : 96 m

BSS004AXQM

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	SARL AMDS, Ferme Renumat - 51520 Sogny Aux Moulins	
Date :	26/08/2020	n° DREAL : 2264/2020
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins agricoles	
Lieu du chantier :	Mairy Sur Marne	

TERRAIN

[illegible]**FORAGE**

Profondeur finale :	39,75
----------------------------	--------------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	3,00	270	Tarière	à sec
3,00	40,00	171	Rotary	Eau

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
0,00	3,00	200	200/184	PVC		x
-0,50	14,50	140	140/126	PVC		x
14,50	39,75	140	140/126	PVC	x 2 mm	

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	SARL AMDS, Ferme Renumat - 51520 Sogny Aux Moulins	
Date :	26/08/2020	n° DREAL : 2264/2020
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins agricoles	
Lieu du chantier :	Mairy Sur Marne	

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	3,00	CPJ45	x		270	200
0,00	10,00	CPJ45	x		171	140
10,00	10,50	Jupe			171	140

POMPAGE	NS (m) :	17,75	Côte / Sol (m):	-0,5	Pompe :	20 m³
----------------	----------	-------	-----------------	------	---------	-------

ND (m)	Q (m3)	Temps
37,26	1,20	0h10
39,06	0,60	0h27
39,00	0,60	1h10
Acidification :		1,00 tonne(s)
ND (m)	Q (m3)	Temps
Pompage sur env. 3 jrs du 31/08 au 02/09 :		
33,20	1,18	64h
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m3)	Temps
33,20	1,18	64h
Débit spécifiques		
Q' =	0,08	m³ / h / m
Coordonnées :		
- X : 4°24'59.61"E		
- Y : 48°52'38.40"N		
- Z : 98 m		
Observations :		
Le forage sera exploité au maximum à 1,3 m³/h . La pompe sera positionnée à - 38 m et protégée par des sécurités "manque d'eau"		

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	SARL AMDS, Ferme Renumat - 51520 Sogny Aux Moulins	
Date :	26/08/2020	n° DREAL : 2264/2020
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins agricoles	
Lieu du chantier :	Mairy Sur Marne	

