



S.A.R.L. BONIFACE


ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-51.com

**TRAVAUX DE FORAGE
POUR
LES BESOINS DE
L'ARROSAGE
à
Bétheny (51)
Lot. Les Promenades de
Damoiselle**

BSS004BJKY

**TRAVAUX REALISES
LE
31 Mars 2021**

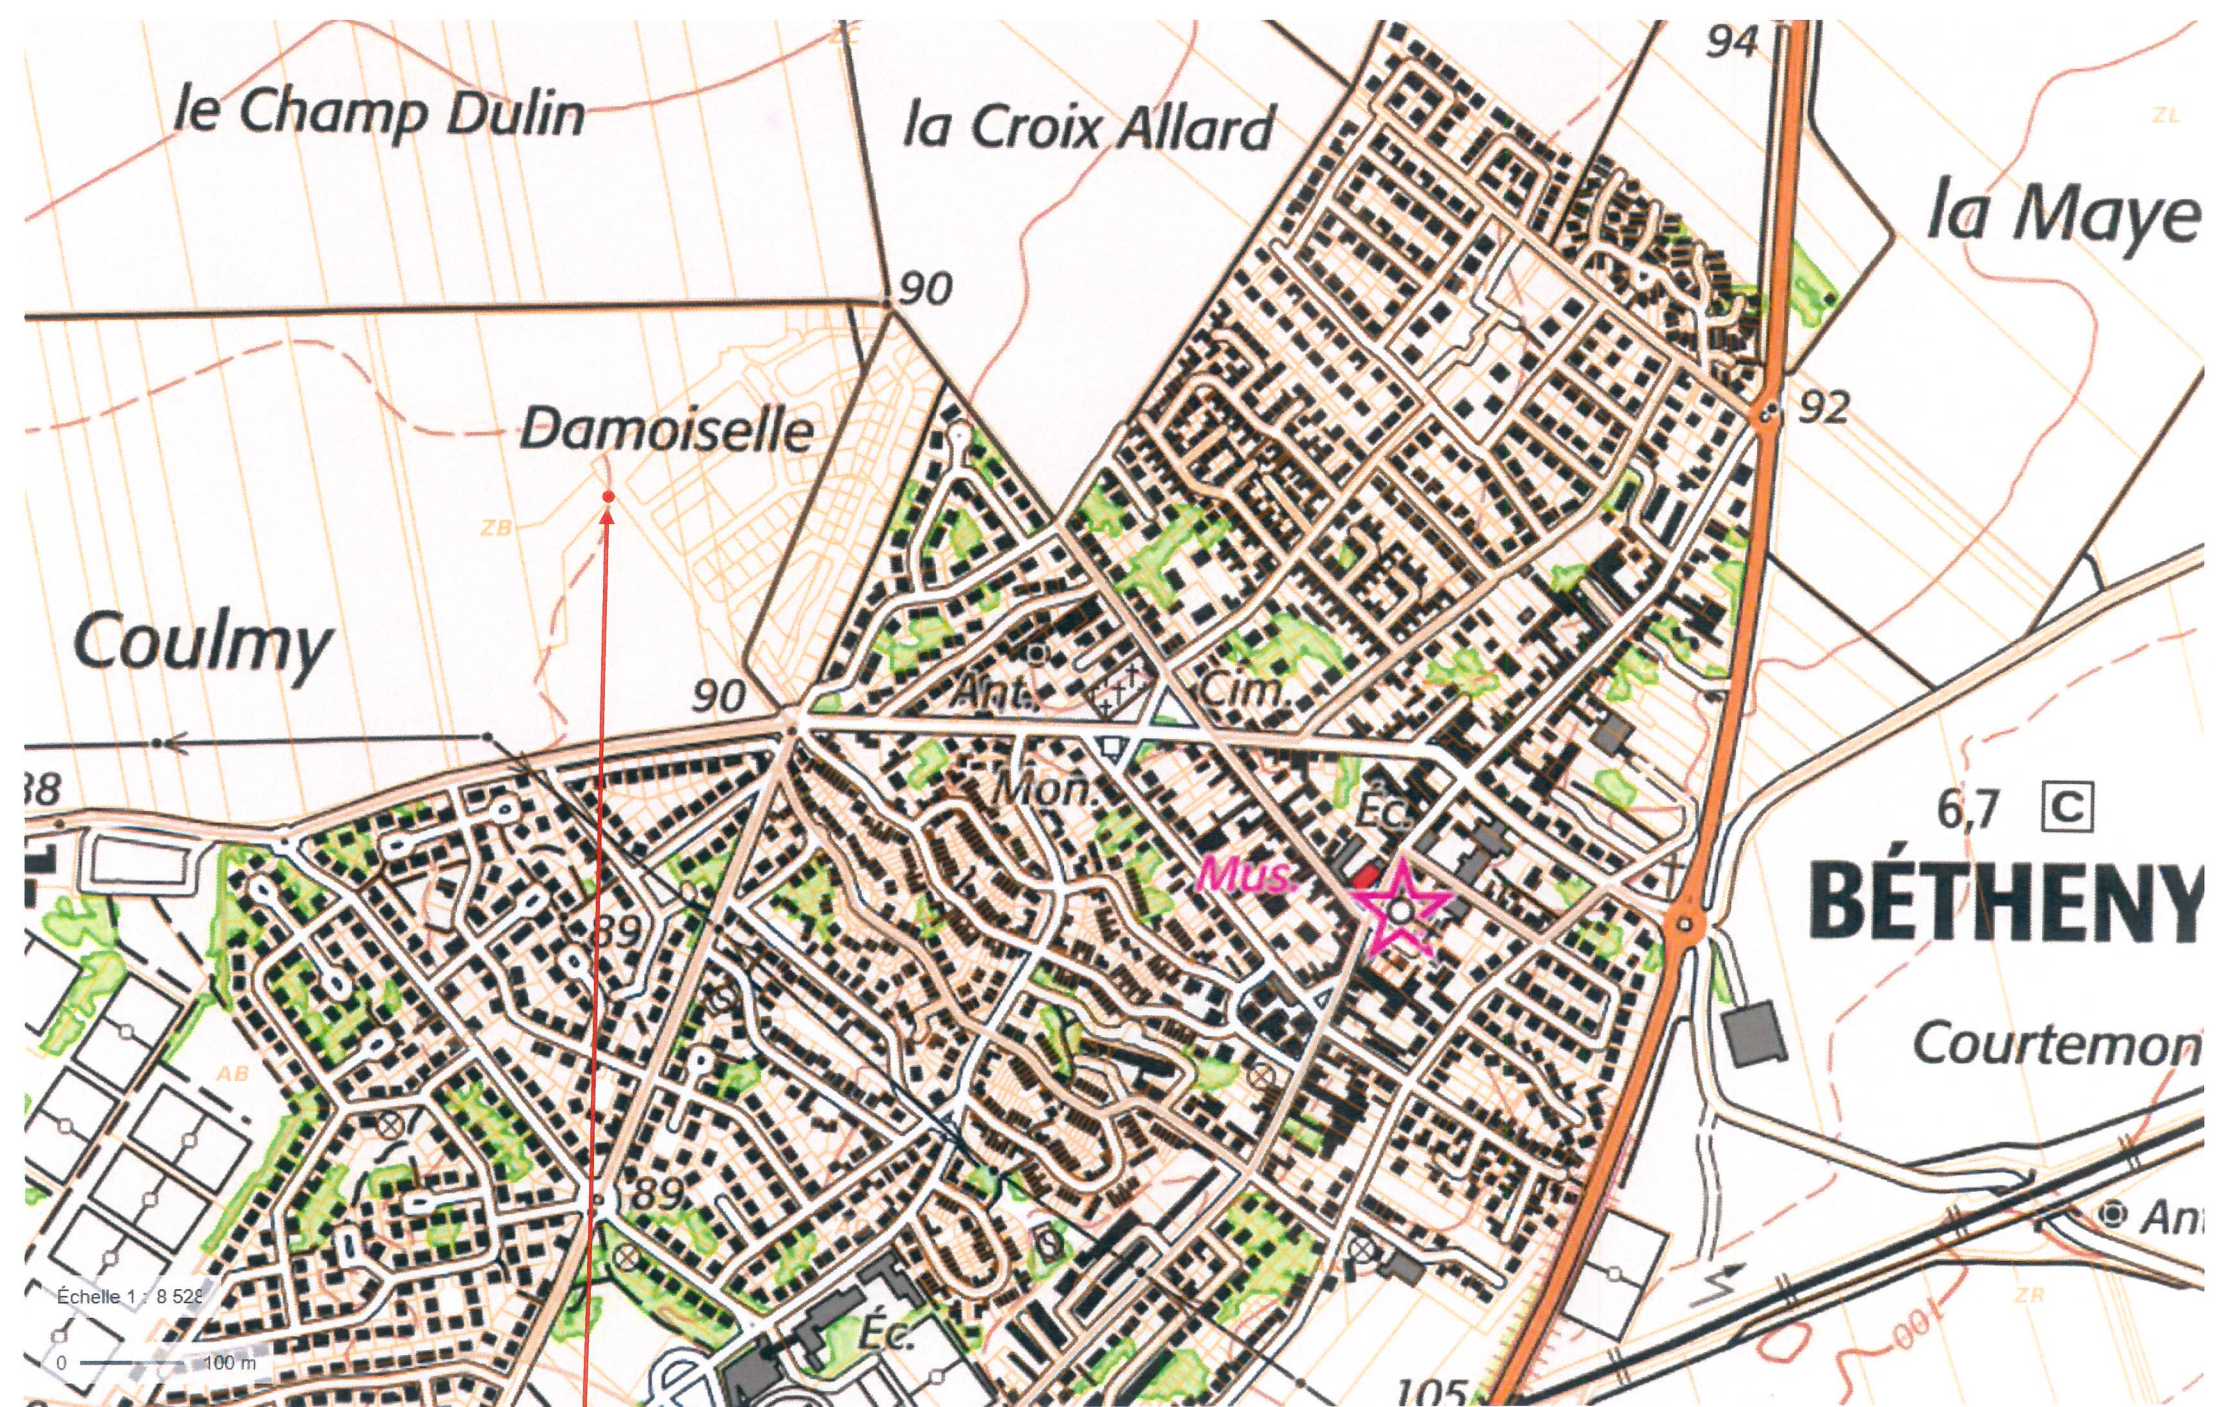

PROJET
Alt : 87.50 m

BSS004BJKY

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Chemin de Cernay - 51450 Bétheny	
Date :	31/03/2021	n° DREAL : 2290/2021
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'arrosage	
Lieu du chantier :	Bétheny, Lotissement Les Promenades de Damoiselle	

TERRAIN

[illegible]**FORAGE**

Profondeur finale :	21,80
----------------------------	--------------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	22,50	180	Tarière	à sec

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
-0,70	10,50	140	140/126	PVC		x
10,50	22,00	140	140/126	PVC	x	

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Chemin de Cernay - 51450 Bétheny	
Date :	31/03/2021	n° DREAL : 2290/2021
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'arrosage	
Lieu du chantier :	Bétheny, Lotissement Les Promenades de Damoiselle	

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de	Méthode		Entre Ø	et Ø
		ciment	Gravité	Tube		
0,00	5,50	CPJ45	x		180	140
5,50	6,00	Jupe			180	140

POMPAGE	NS (m) :	5,1	Côte / Sol (m):	-0,7	Pompe :	SP 8/10
----------------	----------	-----	-----------------	------	---------	---------

ND (m)	Q (m3)	Temps
5,80	10,00	2h00
Arrêts/démarrages		
Acidification :		tonne(s)
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m3)	Temps
5,80	10,00	2h
Débit spécifiques		
Q' =	14,29	m ³ / h / m

Coordonnées :

- X : 4.048359°
- Y : 49.289239°
- Z : 87,50 m

Observations :

Le forage sera protégé dans un regard étanche dépassant d'environ 30 cm au dessus du sol conformément aux obligations "loi sur l'eau"

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Chemin de Cernay - 51450 Bétheny	
Date :	31/03/2021	n° DRIRE : 2290/2021
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'arrosage	
Lieu du chantier :	Bétheny, Lotissement Les Promenades de Damoiselle	

