

FORAGE DE CAPTAGE

Entreprise:	SAS VAN INGEN FORAGES
Client:	SAS CENTRE AQUATIC 4 Rue Charles Coulomb 45140 ST JEAN DE LA RUELLE
Maître d'oeuvre:	SAS CENTRE AQUATIC 4 Rue Charles Coulomb 45140 ST JEAN DE LA RUELLE
Exploitant:	SAS CENTRE AQUATIC 4 Rue Charles Coulomb 45140 ST JEAN DE LA RUELLE

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Les perrières
41220 ST LAURENT NOUAN

Coordonnées : **Longitude** 595 505 **Latitude** 6 736 077 **Altitude :** 87.00 m
Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

<u>Date début de l'ouvrage :</u>	09/10/2017	<u>Resp. M. Ouvrage :</u>	SAS CENTRE AQUATIC
<u>Date fin de l'ouvrage :</u>	20/10/2017	<u>Resp. M. Oeuvre :</u>	SAS CECNTRE AQUATIC
<u>Machine :</u>	Ecofore 903 n158	<u>Resp. Chantier :</u>	SAS VAN INGEN

<u>Date début pompage :</u>	26/10/2017	<u>Niveau statique non perturbé :</u>	10.60 m
<u>Date fin de pompage :</u>	17/11/2017	<u>Débit Maxi. d'essai :</u>	0.00 m3/h
<u>Nombre de nappes identifiées :</u>		<u>Rabattement correspondant :</u>	0.00 m

Notes :

Client: SAS CENTRE AQUATIC
Maître d'oeuvre: SAS CENTRE AQUATIC
Lieu de l'ouvrage : Les perrières
41220 **ST LAURENT NOUAN**

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	3.00	Terre sableuse alluvionnaire
3.00	6.00	Argile
6.00	30.00	Argile + calcaire
30.00	35.00	Marne bleu verte + silex

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	35.00	17"1/2	444.00	Rotary	Boue
0.00	1.00	24"3/4	629.00	Tariere	Air
0.00	7.00	26"	660.00	Tariere	Air
0.00	35.00	20"	508.00	Rotary	Boue

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	1.50	28"	711.00	6.30		Acier-api	Tube-plein		
-0.50	7.00	20"7/8	530.00	6.30		Acier-api	Tube-plein		
-0.60	13.00	15"3/4	400.00	21.50		P.v.c.	Tube-plein		
13.00	31.00	14"	357.00	5.50		Inox-aisi-304	Crepine fil-enroule	3.00	

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	6.50	20"7/8	530.00	Ciment	Cpa 32.5	Sous pression			
6.50	7.00	20"7/8	530.00	Ciment	Sobranite	Gravitaire			
1.00	31.00	15"3/4	400.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Autre	4.00-10.00	5.40
31.00	35.00	Rebouc	0.00	Remblai					

FORAGE DE CAPTAGE

Client :

SAS CENTRE AQUATIC

Maitre d'oeuvre :

SAS CENTRE AQUATIC

Localisation de l'ouvrage :

Les perrières

41220

ST LAURENT NOUAN

Travaux réalisés :

du : 09/10/2017 au : 20/10/2017

1/1

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert-93 métrique

Longitude (X):

595 505

Latitude (Y):

6 736 077


Altitude sol (Z):

+87,000 m

Echelle : 1/179

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

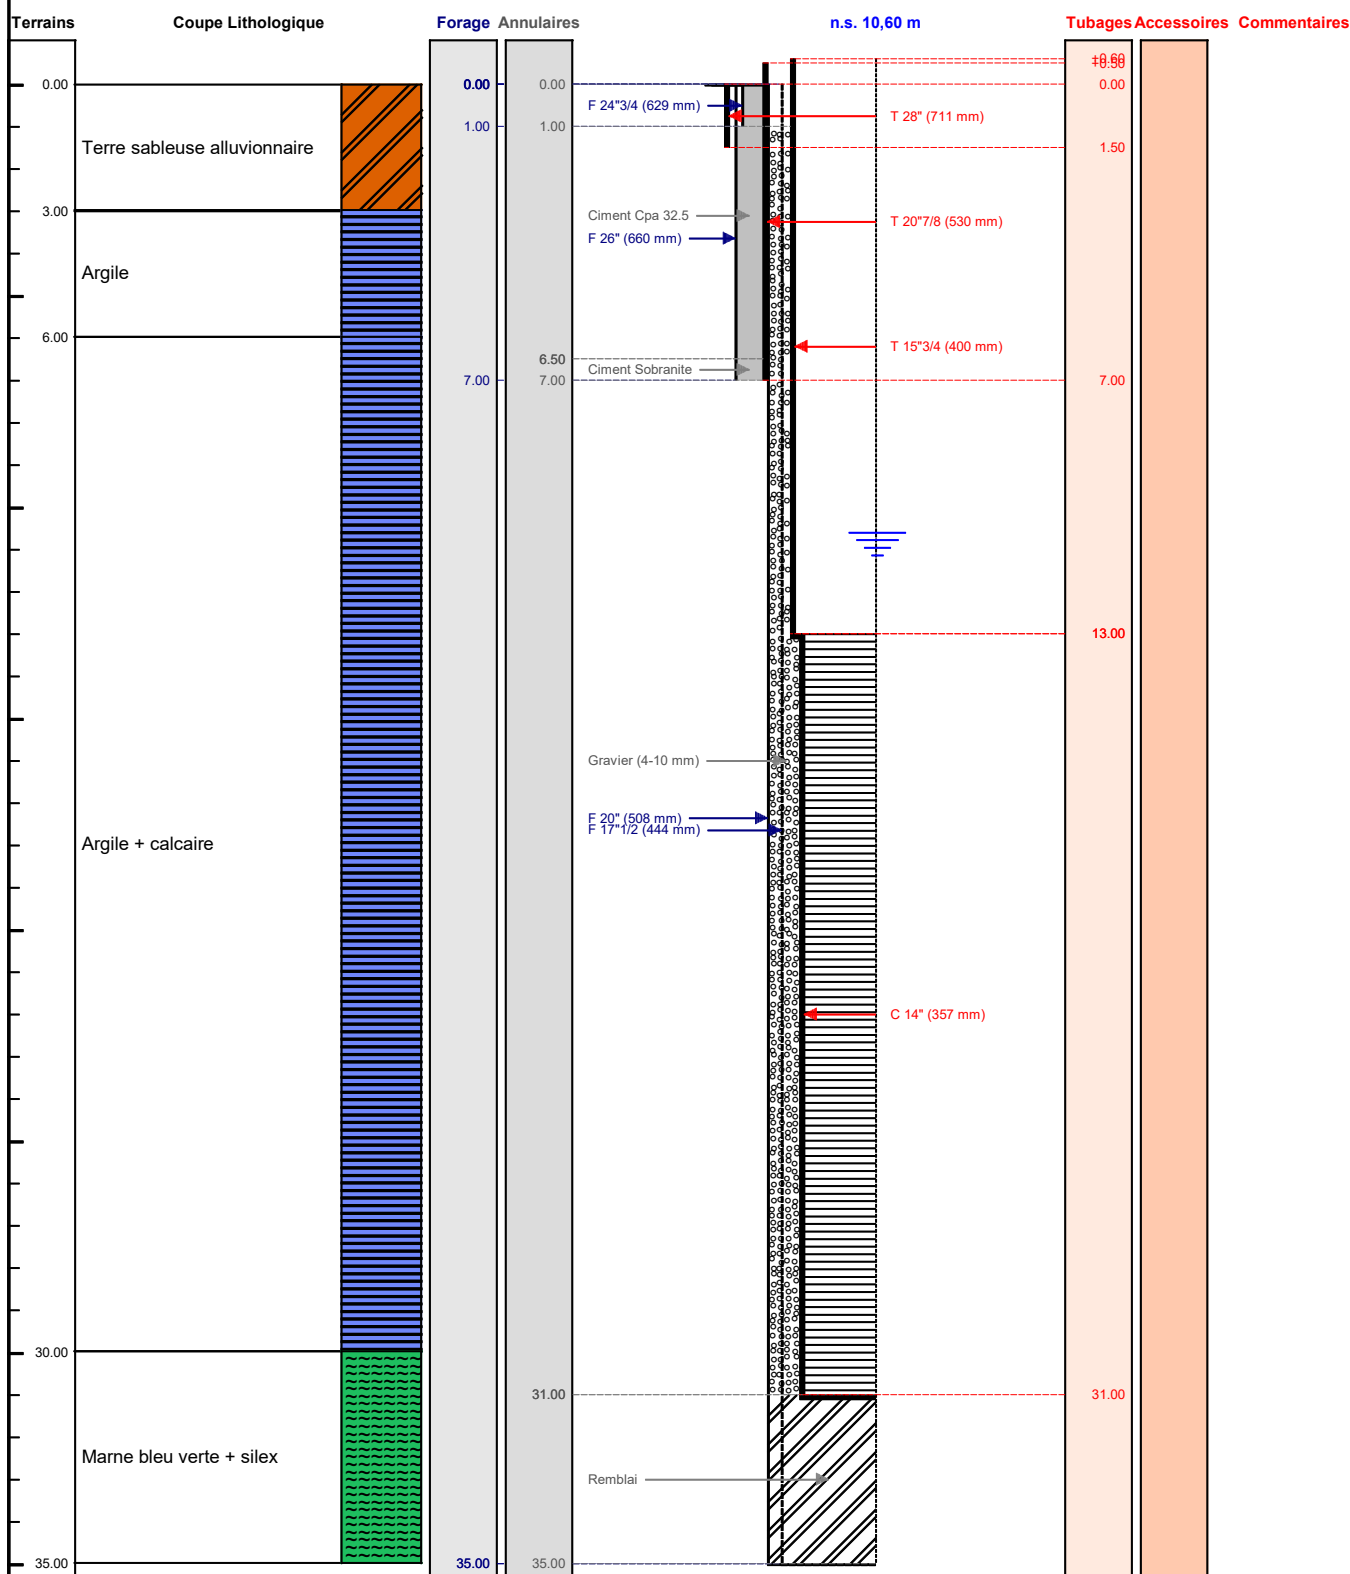

VANINGEN
FORAGES

Le/...../..... à

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise
