

FORAGE D'EAU

Entreprise: GTR FORAGES

Client: GAEC

Maître d'oeuvre: EFFITERR

Exploitant: GAEC

Code National BSS : BSS 004 BKWW

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Les Bruyères
61100 FLERS

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 **Altitude :** 0.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 10/06/2017

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 13/06/2017

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Fraste

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 6.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 14.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes : Air lift de nettoyage pendant 1 h



TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU



Client: GAEC
Maître d'oeuvre: EFFITERR
Lieu de l'ouvrage : Les Bruyères
 61100 FLERS

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	Terre
1.00	14.50	Sable granitique jaune
14.50	100.00	Schiste gris

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	4.00	12"1/4	311.00	M.f.t.	Air
4.00	100.00	8"1/2	215.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	16.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
16.00	91.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes-continues	1.00	
91.00	94.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
94.00	97.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes-continues	1.00	
97.00	100.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	14.50	5"1/2	140.00	Ciment	Clk	Sous pression			
14.50	15.00	5"1/2	140.00	Billes-argile	Compactonite				0.03
15.00	100.00	5"1/2	140.00	Gravier	Autre	Gravitaire	Roule	2.00-4.00	2.50

FORAGE D'EAU

Client : GAEC
Maitre d'oeuvre : EFFITERR
Localisation de l'ouvrage : Les Bruyères
61100 FLERS


Travaux réalisés : 1\1
du : 10/06/2017 au : 13/06/2017

Coordonnées de l'ouvrage :
 Lambert 1 carto métrique
 Longitude (X): 0
 Latitude (Y): 0
 Altitude sol (Z): +0,000 m

Echelle : 1/503

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

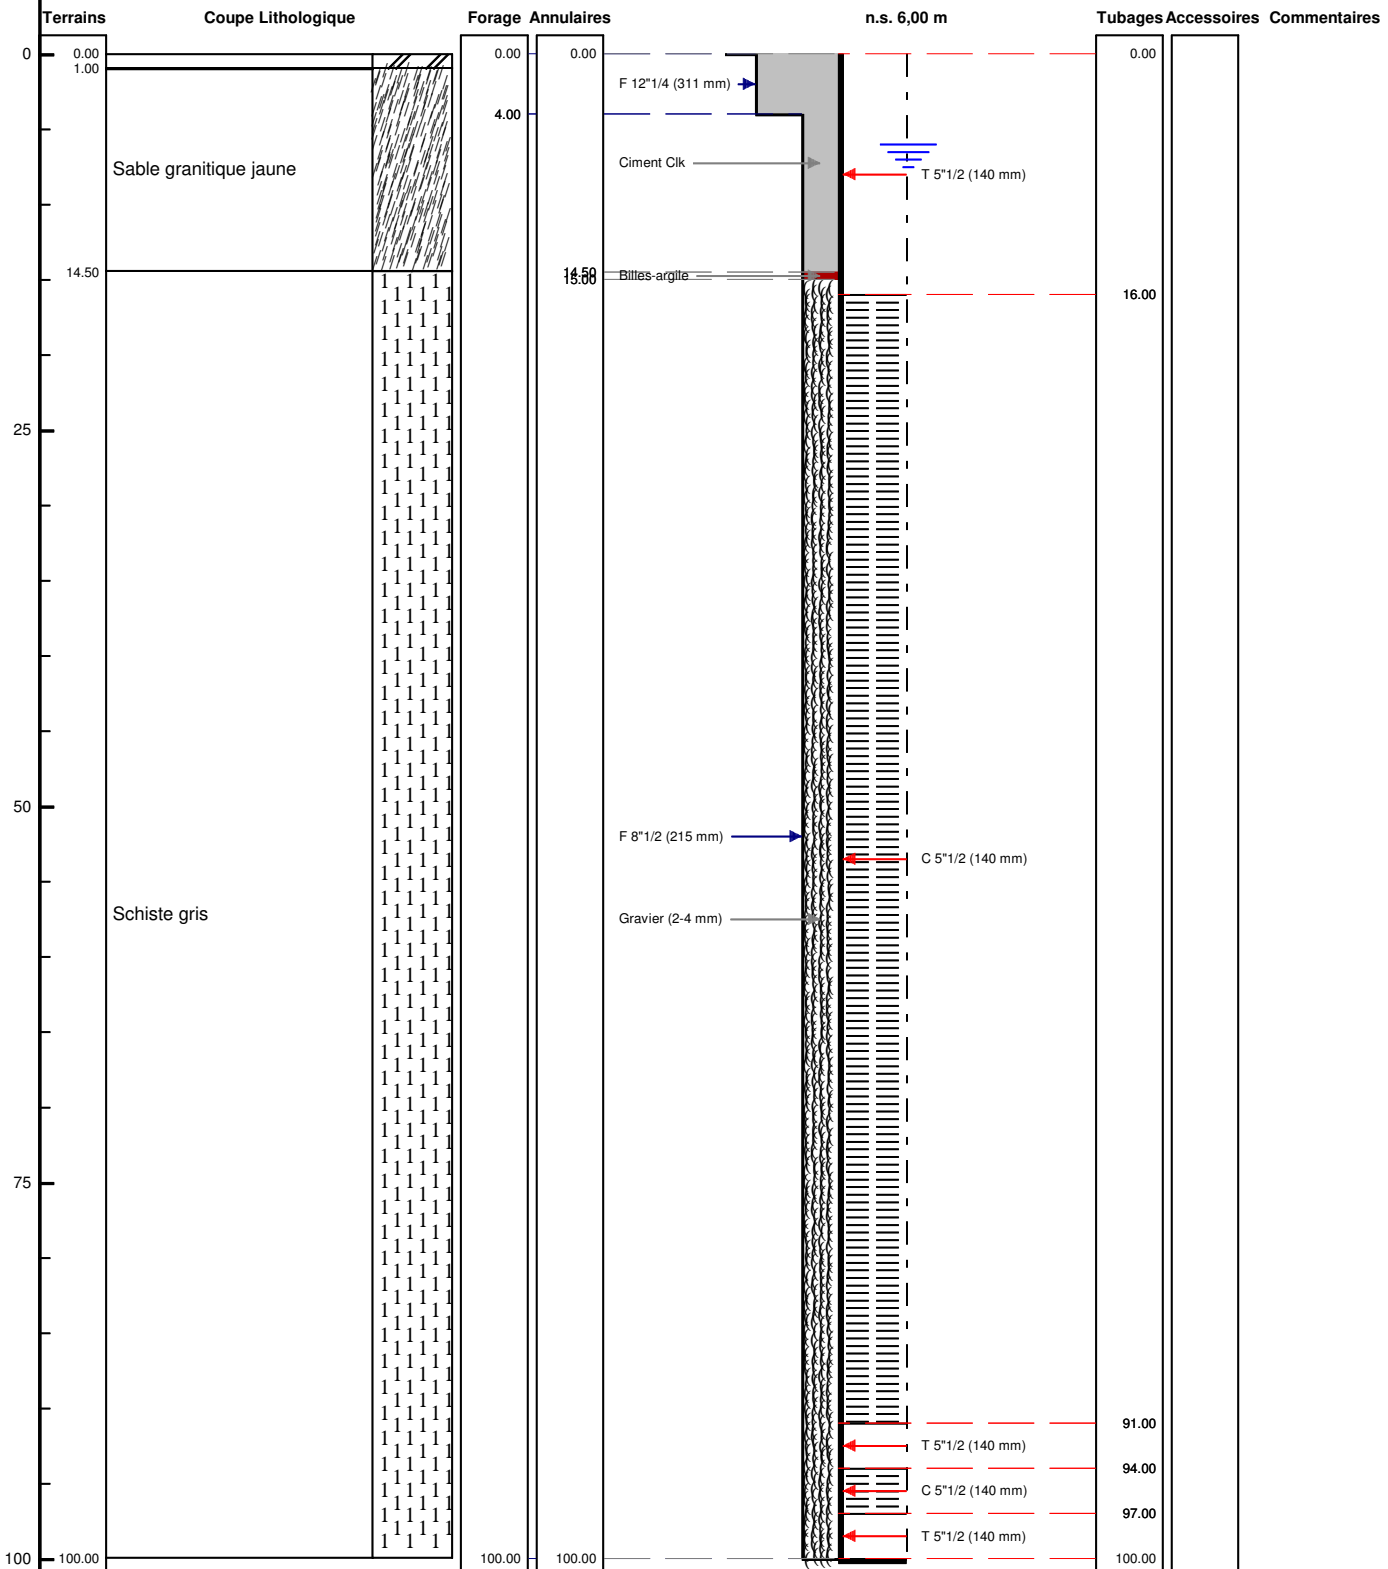

Le/...../..... à
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
 Tampon et signature du chef d'entreprise

Lambert 1 carto métrique Long.: 0 Lat.: 0 Alt.: +0,000 m

PAGE: 3
