

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU



Charte qualité

Entreprise: GTR FORAGES

Client: EARL BISSEY

Maître d'oeuvre: GDS SERVICES

Exploitant: EARL BISSEY

Code National BSS : BSS004BLCQ

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : La fontaine
61200 COMMEAUX

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 **Altitude :** 0.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 20/11/2013

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 22/11/2013

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Klemm

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 5.60 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 12.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes : Air lift de nettoyage pendant 1 heure

Tubage provisoire de 0 à 18 m

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU



Client: EARL BISSEY
Maître d'oeuvre: GDS SERVICES
Lieu de l'ouvrage : La fontaine
61200 COMMEAUX

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.50	Terre
0.50	2.00	Argile à silex
2.00	2.50	Argile rouge
2.50	46.00	Calcaire avec passage de marne sableuse

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	18.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
18.00	46.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
15.00	7.00
31.00	12.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	22.15	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
22.15	36.90	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes-continues	1.00	
36.90	39.85	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
39.85	42.80	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes-continues	1.00	
42.80	45.75	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		

REMPLEISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	10.00	4"7/8	125.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			
10.00	10.50	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactonite				0.03
10.50	46.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	2.00-4.00	1.15

FORAGE D'EAU

Client :

EARL BISSEY

Maitre d'oeuvre :

GDS SERVICES

Localisation de l'ouvrage :

La fontaine

61200

COMMEAUX

Travaux réalisés :

du : 20/11/2013 au : 22/11/2013

1/1

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique

Longitude (X):

0

Latitude (Y):

0


Altitude sol (Z):

+0,000 m

Echelle : 1/231

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

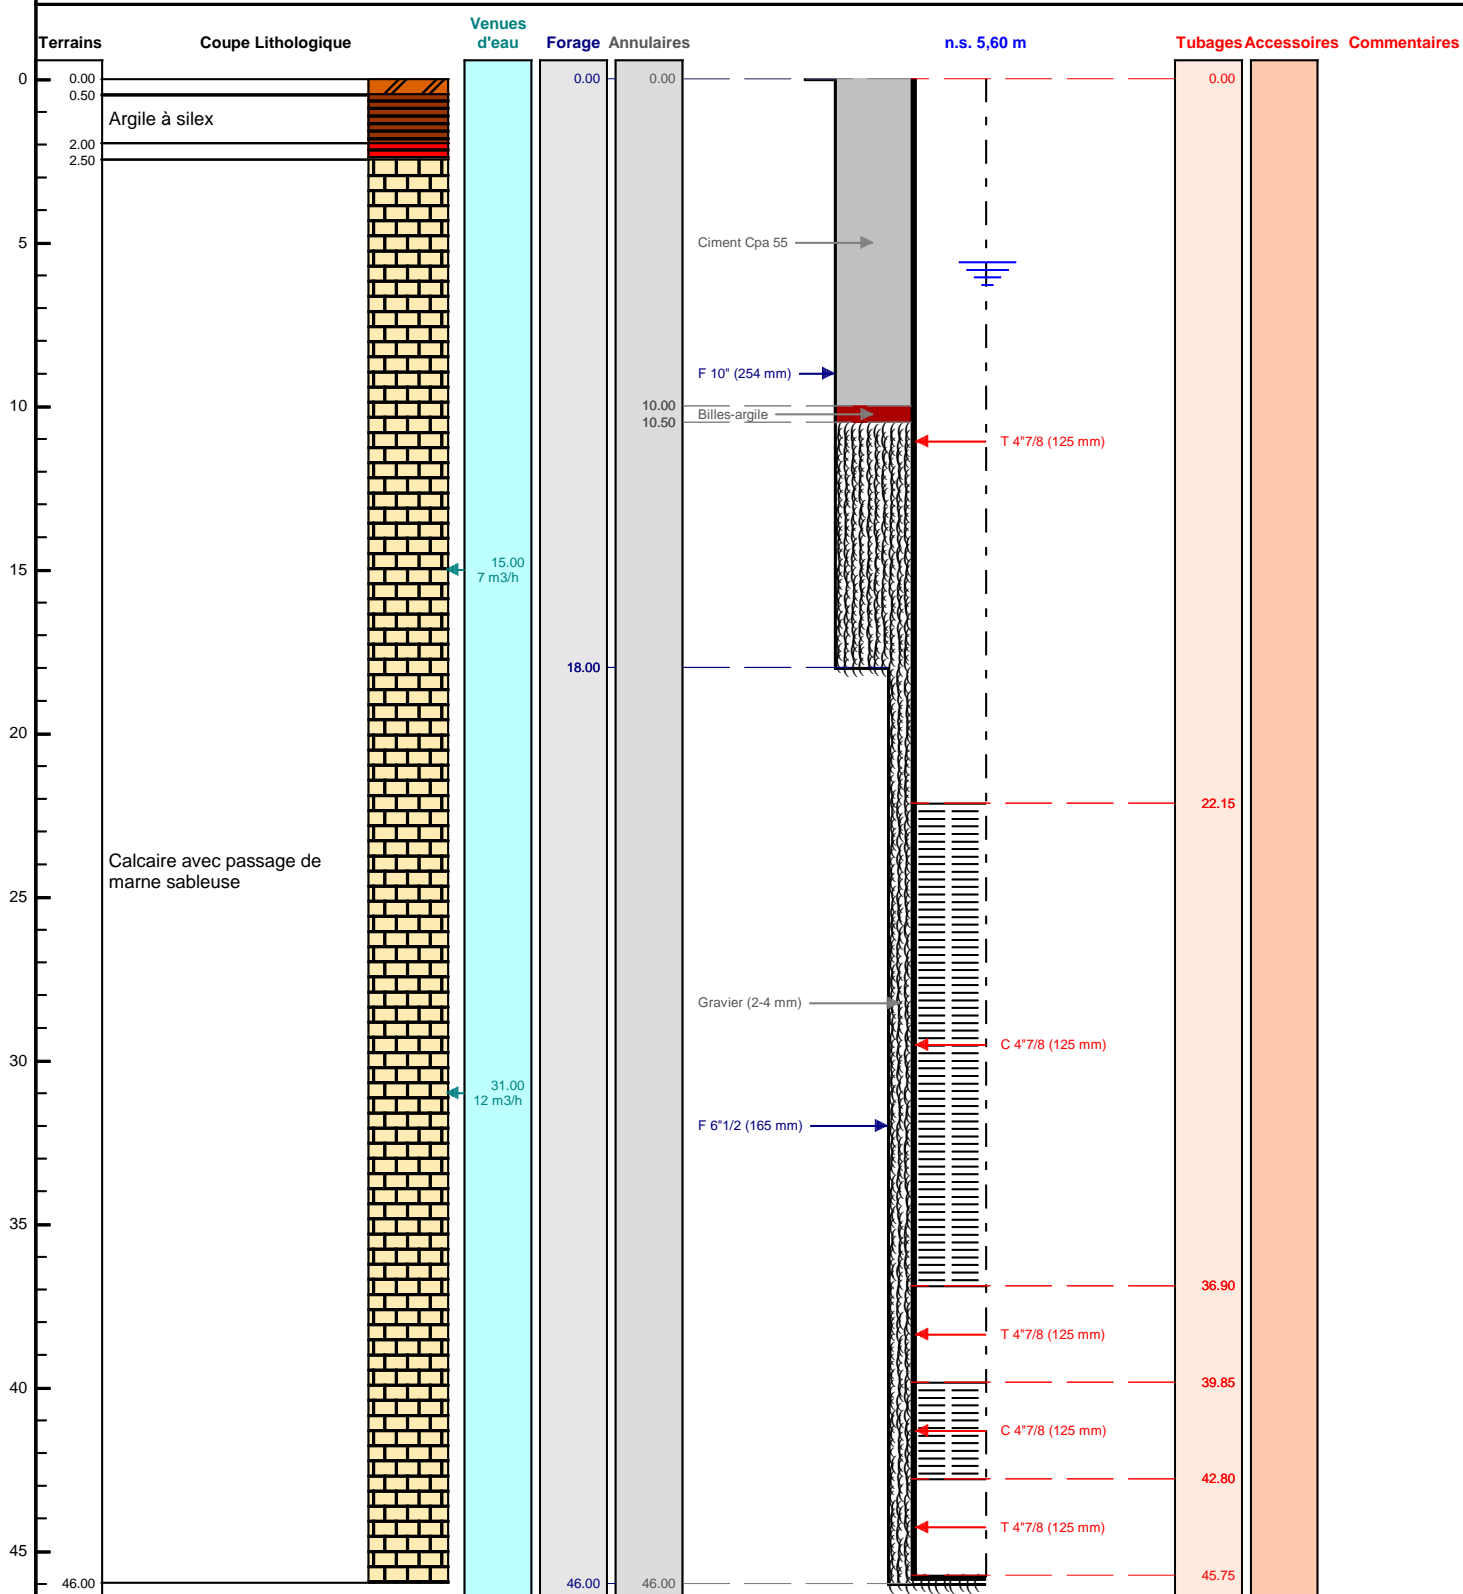

Le/...../..... à

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise

Lambert 1 carto métrique

Long.:

0

Lat.:

0

Alt.: +0,000 m

PAGE: 3
