

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU



Entreprise:	GTR FORAGES
Client:	EARL DU MOULIN DE FONTAINE
Maître d'oeuvre:	GDS SERVICE 61
Exploitant:	

Code National BSS : BSS000MQPW

N°Déclaration \*\* : 10.61.005

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** Le Moulin de Fontaine  
61160 FONTAINE LES BASSETS

**Coordonnées :** X 0 Y 0 **Altitude :** 0.00 m  
**Zone** Lambert 1 carto métrique

**Date début de l'ouvrage :** 23/02/2010

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 24/02/2010

**Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :** FRASTE

**Responsable Chantier :**

**Date début pompage :**

**Profondeur hydrostatique/sol :** 11.50 m

**Date fin de pompage :**

**Débit Maxi. d'essai :** 10.00 m3/h

**Rabattement correspondant :** 0.00 m

**Notes :**

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU



**Client:** EARL DU MOULIN DE FONTAINE  
**Maître d'oeuvre:** GDS SERVICE 61  
**Lieu de l'ouvrage :** Le Moulin de Fontaine  
**61160 FONTAINE LES BASSETS**

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.40	Terre
0.40	4.00	Craie molle
4.00	5.50	Craie molle avec passage de calcaire dur
5.50	18.00	Craie grise
18.00	19.00	Calcaire gris dur
19.00	24.00	Craie jaunâtre
24.00	50.00	Calcaire gris

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	50.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	24.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
24.00	44.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	
44.00	47.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
47.00	50.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	

## REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
1.00	10.00	4"7/8	125.00	Ciment	Clk	Gravitaire			
10.00	10.50	4"7/8	125.00	Ciment	Peltonite	Gravitaire			
10.50	50.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	2.00-4.00	

# FORAGE D'EAU

Client :

EARL DU MOULIN DE FONTAINE

Maitre d'oeuvre :

GDS SERVICE 61

Localisation de l'ouvrage :

Le Moulin de Fontaine

61160

FONTAINE LES BASSETS

Travaux réalisés :

du : 23/02/2010 au : 24/02/2010

1/1

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique


X: 0

Y: 0

Z altitude sol: +0,000 m

Echelle : 1/251

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

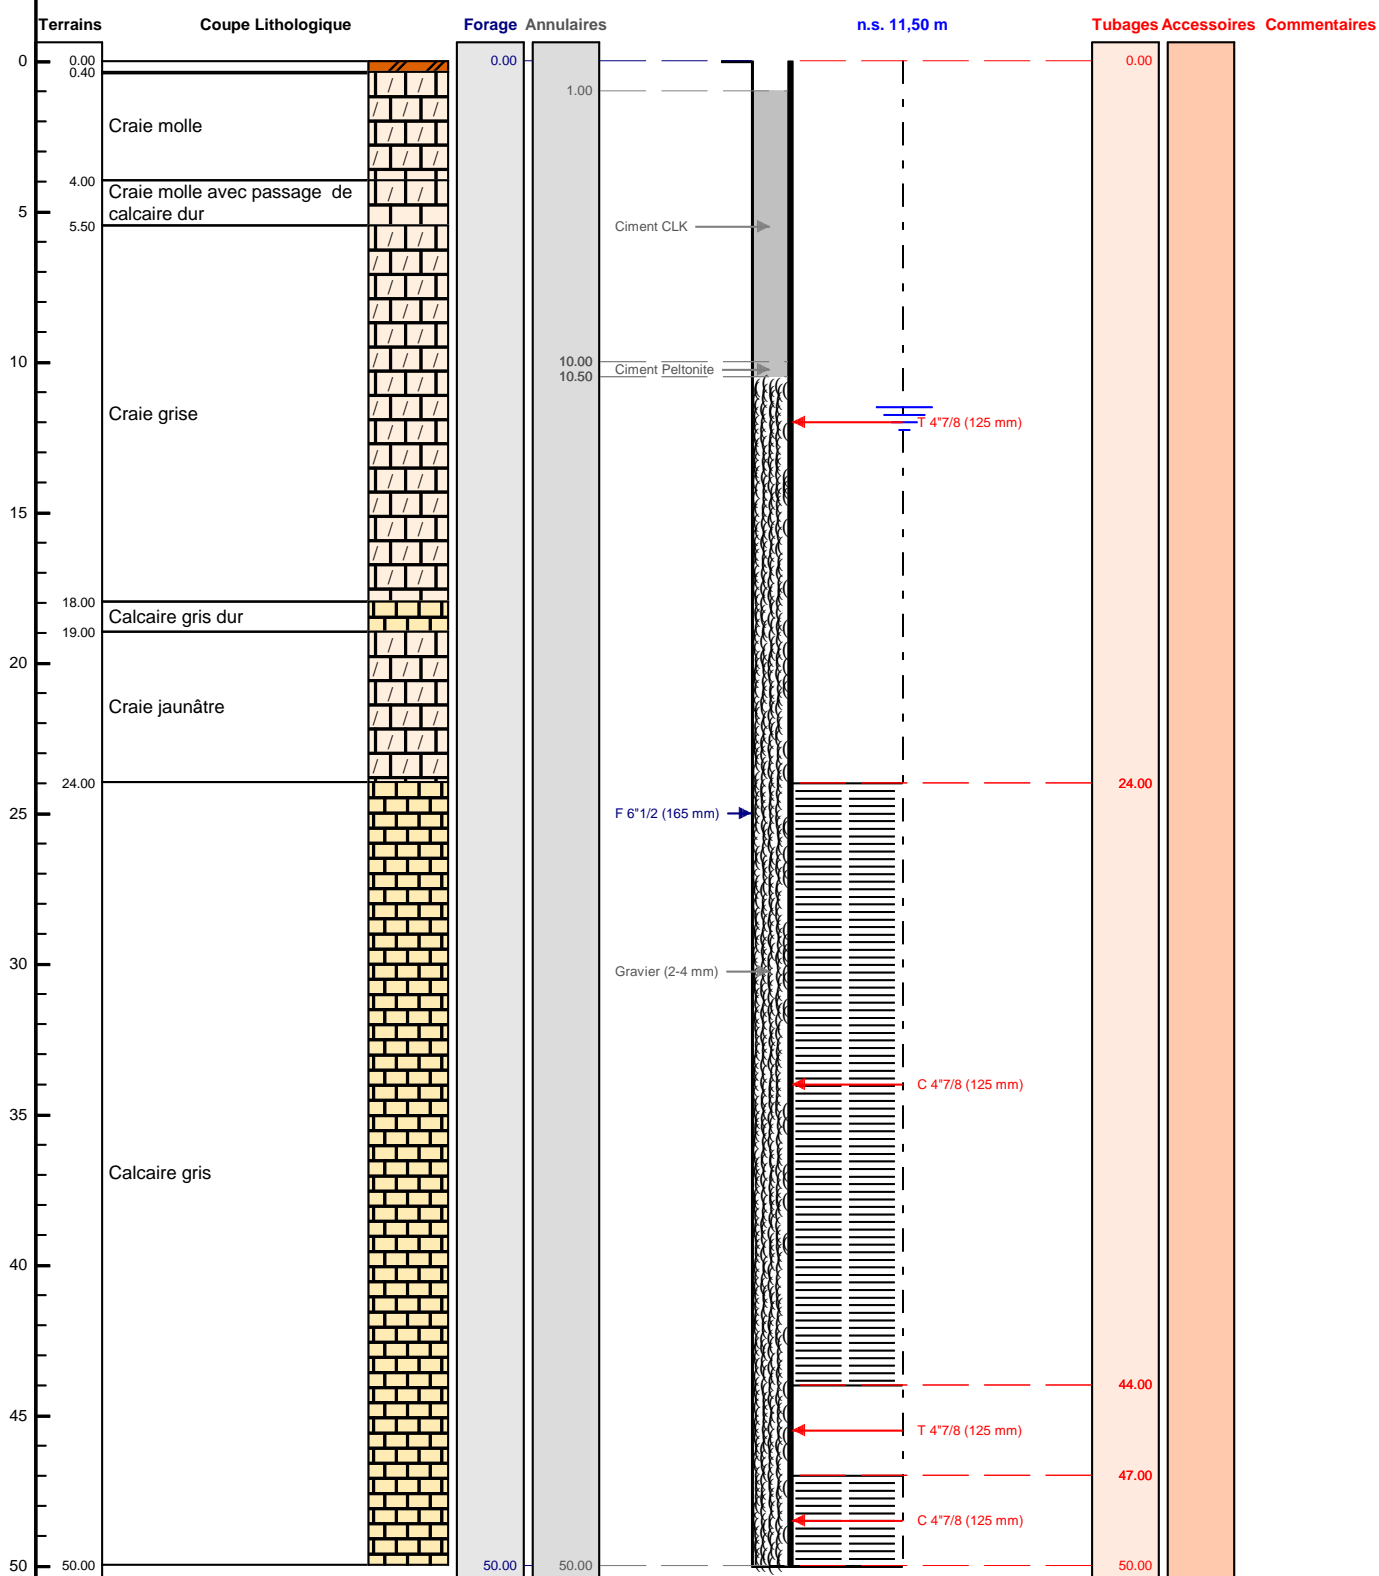

Le ...../...../..... à .....

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise

Lambert 1 carto métrique X: 0 Y: 0 Z: +0,000 m

PAGE: 3
