

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise: **GTR FORAGES**

Client: **GDS SERVICES**

Maître d'oeuvre: **GDS SERVICES**

Exploitant:

Code National BSS : BSS000MRNE

N° Déclaration ** : 11-61-032

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Le biot

61550 GAUVILLE

Coordonnées : Longitude 000°33'28,13"E Latitude 048°48'35,4"N Altitude : 268.00 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 22/08/2011

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 31/08/2011

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Hutte

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 4.09 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 40.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes : Tube acier diam 220 retirée à la fin du forage et air lift de nettoyage pendant 4 heures



TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client: GDS SERVICES
Maître d'oeuvre: GDS SERVICES
Lieu de l'ouvrage : Le biot
 61550 GAUVILLE

LITHOLOGIE

| De | à | Libellé |
|-------|-------|----------------|
| 0.00 | 8.00 | Argile à silex |
| 8.00 | 12.00 | Silex |
| 12.00 | 18.00 | Marne à silex |
| 18.00 | 60.00 | Craie à silex |

FORAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Mode de forage | Fluide de forage |
|-------|-------|-------|--------|----------------|------------------|
| 0.00 | 35.00 | 9"7/8 | 250.00 | Rotary | Boue |
| 35.00 | 60.00 | 8"1/8 | 205.00 | Rotary | Boue |

* Reconnaissance

TUBAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Epais. | Ecra. | Nature du tubage | Type | Slot | Vide % |
|-------|-------|-------|--------|--------|-------|------------------|--------------------------|------|--------|
| 0.00 | 18.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00 | | P.v.c.-lisse | Tube-plein | | |
| 0.00 | 35.00 | 8"5/8 | 220.00 | 0.00 | | Acier-api | Tube-plein | | |
| 18.00 | 51.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00 | | P.v.c.-lisse | Crepine fentes-continues | 1.00 | |
| 51.00 | 54.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00 | | P.v.c.-lisse | Tube-plein | | |
| 54.00 | 57.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00 | | P.v.c.-lisse | Crepine fentes-continues | 1.00 | |
| 57.00 | 60.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00 | | P.v.c.-lisse | Tube-plein | | |

REEMPLISSAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Matériau | Nature | Méthode de pose | Texture | Gra. (mm) | Vol. m3 |
|-------|-------|-------|--------|---------------|--------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 0.00 | 15.00 | 8"5/8 | 220.00 | Ciment | Clk | Gravitaire | | | |
| 0.00 | 15.00 | 4"7/8 | 125.00 | Ciment | Clk | Gravitaire | | | |
| 15.00 | 15.50 | 8"5/8 | 220.00 | Billes-argile | Compactonite | | | | 0.06 |
| 15.00 | 15.50 | 4"7/8 | 125.00 | Billes-argile | Compactonite | | | | 0.03 |
| 15.50 | 35.00 | 4"7/8 | 125.00 | Gravier | Autre | Gravitaire | Roule | 2.00-4.00 | 1.00 |
| 15.50 | 35.00 | 8"5/8 | 220.00 | Gravier | Autre | Gravitaire | Roule | 2.00-4.00 | 0.50 |
| 35.00 | 60.00 | 4"7/8 | 125.00 | Gravier | Autre | Gravitaire | Roule | 2.00-4.00 | 1.20 |

FORAGE D'EAU

Client : GDS SERVICES
 Maître d'oeuvre : GDS SERVICES
 Localisation de l'ouvrage : Le biot
 61550 GAUVILLE


Travaux réalisés : 1/1
 du : 22/08/2011 au : 31/08/2011

Coordonnées de l'ouvrage :
 Géographique
 Longitude (X): 000°33'28,13"E
 Latitude (Y): 048°48'35,4"N
 Altitude sol (Z): +268,000 m

Echelle : 1/302

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

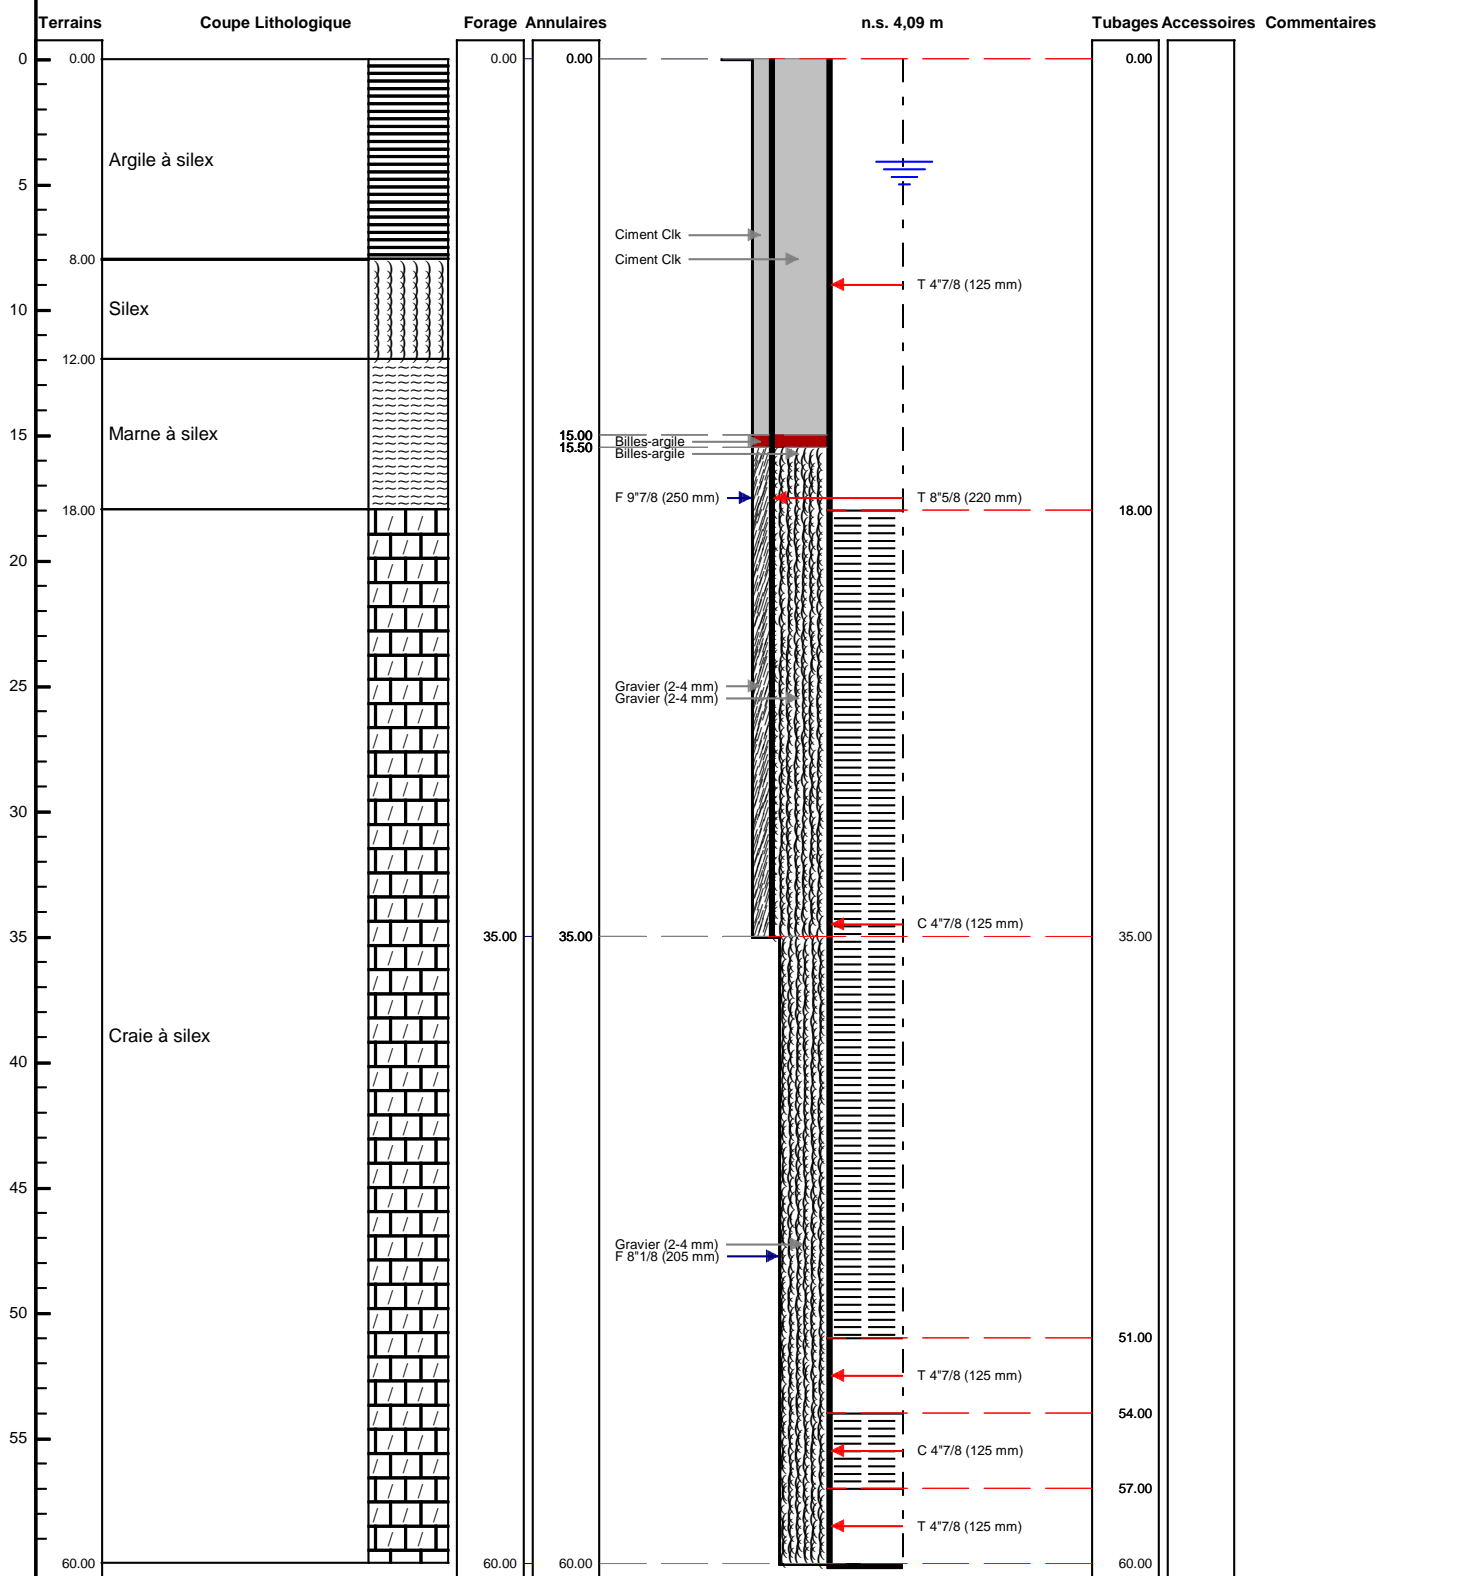

Le à
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
 Tampon et signature du chef d'entreprise
