

S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-51.com

TRAVAUX DE FORAGE POUR LES BESOINS DE L'ARROSAGE à Le Thour (08)

BSS004CPLM

Affaire suivie par :

Signature

**TRAVAUX REALISES
LES
28 et 29 Aout 2017**

RAPPORT DE CHANTIER	
----------------------------	--

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61	
Client :	24 rue de l'Allemagne - 08190 Le Thour		
Date :	28/08/2017	n° DRIRE :	380/2017
Affaire suivie par :			
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'arrosage		
Lieu du chantier :	Le Thour (08190)		

MASSIF DE GRAVIER

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de	Méthode		Entre Ø	et Ø
		ciment	Gravité	Tube		
0,00	9,30	CPJ45	x		220	200
0,00	12,00	CPJ45	x		184	140
12,00	12,50	Jupe			180	140

POMPAGE	NS (m) :	2,09	Côte / Sol (m):	-0,3	Pompe :	20 m³
----------------	-----------------	-------------	------------------------	-------------	----------------	--------------

ND (m)	Q (m3/h)	Temps
2,19	20,00	17h30
<i>(pompe à -25 m)</i>		
2,12	7,00	7h00
<i>(pompe à -11 m)</i>		
Acidification :	- tonne(s)	
ND (m)	Q (m3/h)	Temps
Arrêts / démarrages : 30 mn/30 mn		
ND (m)	Q (m3/h)	Temps
ND (m)	Q (m3/h)	Temps

ND (m)	Q (m3/h)	Temps
2,12	7,00	7h00
Débit spécifiques		
Q' =	233,33	m ³ / h / m


Observations :

La pompe devra être positionnée dans la partie pleine du tubage (à -12 m maxi).

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	24 rue de l'Allemagne - 08190 Le Thour	
Date :	28/08/2017	n° DRIRE : 380/2017
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'arrosage	
Lieu du chantier :	Le Thour (08190)	

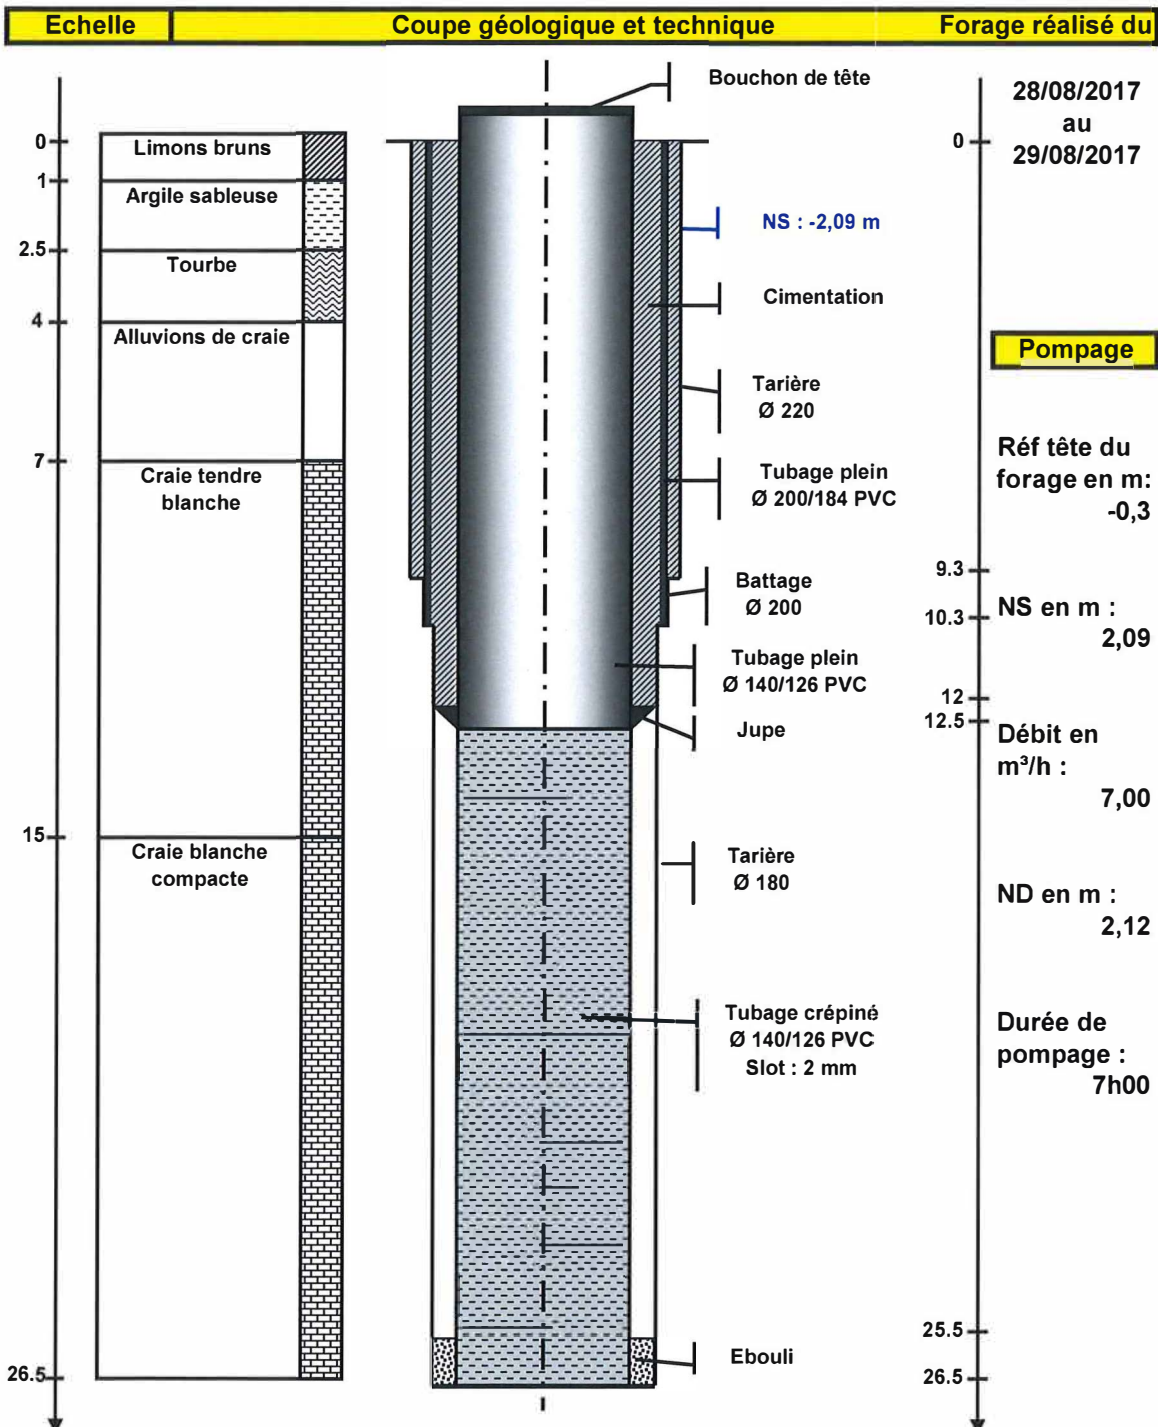

BSS004CPLM

