

S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-51.com

BSS004CPLW
BSS004CPMG
BSS004CPMH

**TRAVAUX DE FORAGE
POUR
LES BESOINS DE
L'ARROSAGE
à
REIMS, Jardin Familiaux
rue de l'Epargne**

Ets EDIVERT

Affaire suivie par :

Ville de Reims, Dir. Espaces Verts

TRAVAUX REALISES

DU

12 au 20 Juillet 2017



BSS004CPLW-BSS004CPMG-BSS004CPMH

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	EDIVERT, 18 rue des blancs fossés, 51370 Ormes	
Date :	13/07/2017	n° DREAL : En cours
Affaire suivie par :	Ville de Reims (Direction Espaces Verts)	
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'arrosage	
Lieu du chantier :	Reims, Rue de l'Epargne ; F1 : au début de la rue de l'Epargne	

TERRAIN

[illegible]

FORAGE

Profondeur finale :	15,50
---------------------	-------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	18,00	180	Tarière	à sec

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
-0,30	7,70	140	140/126	PVC		x
7,70	15,50	140	140/126	PVC	x 2 mm	

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61
Client :	EDIVERT, 18 rue des blancs fossés, 51370 Ormes	
Date :	13/07/2017	n° DRIRE : En cours
Affaire suivie par :	Ville de Reims (Direction Espaces Verts)	
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'arrosage	
Lieu du chantier :	Reims, Rue de l'Epargne ; F1 : au début de la rue de l'Epargne	

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	7,20	CPJ45	x		180	140
7,20	7,70	Jupe			180	140
0,00	-0,20	dalle béton			1000	0

POMPAGE	NS (m) :	2,02	Côte / Sol (m):	-0,3	Pompe :	SP 8/10
----------------	-----------------	-------------	------------------------	-------------	----------------	----------------

ND (m)	Q (m3/h)	Temps
2,30	12,00	2h
Acidification :		- tonne(s)
ND (m)	Q (m3/h)	Temps
ND (m)	Q (m3/h)	Temps
ND (m)	Q (m3/h)	Temps


ND (m)	Q (m3/h)	Temps
2,30	12,00	2h
Débit spécifiques		
Q' =	42,86	m ³ / h / m
Observations :		

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	EDIVERT, 18 rue des blancs fossés, 51370 Ormes	
Date :	13/07/2017	n° DRIRE : En cours
Affaire suivie par :	Ville de Reims (Direction Espaces Verts) Forage d'eau pour	
Type de chantier :	les besoins de l'arrosage	
Lieu du chantier :	Reims, Rue de l'Epargne ; F1 : au début de la rue de l'Epargne	

Echelle	Coupe géologique et technique	Forage réalisé du
---------	-------------------------------	-------------------

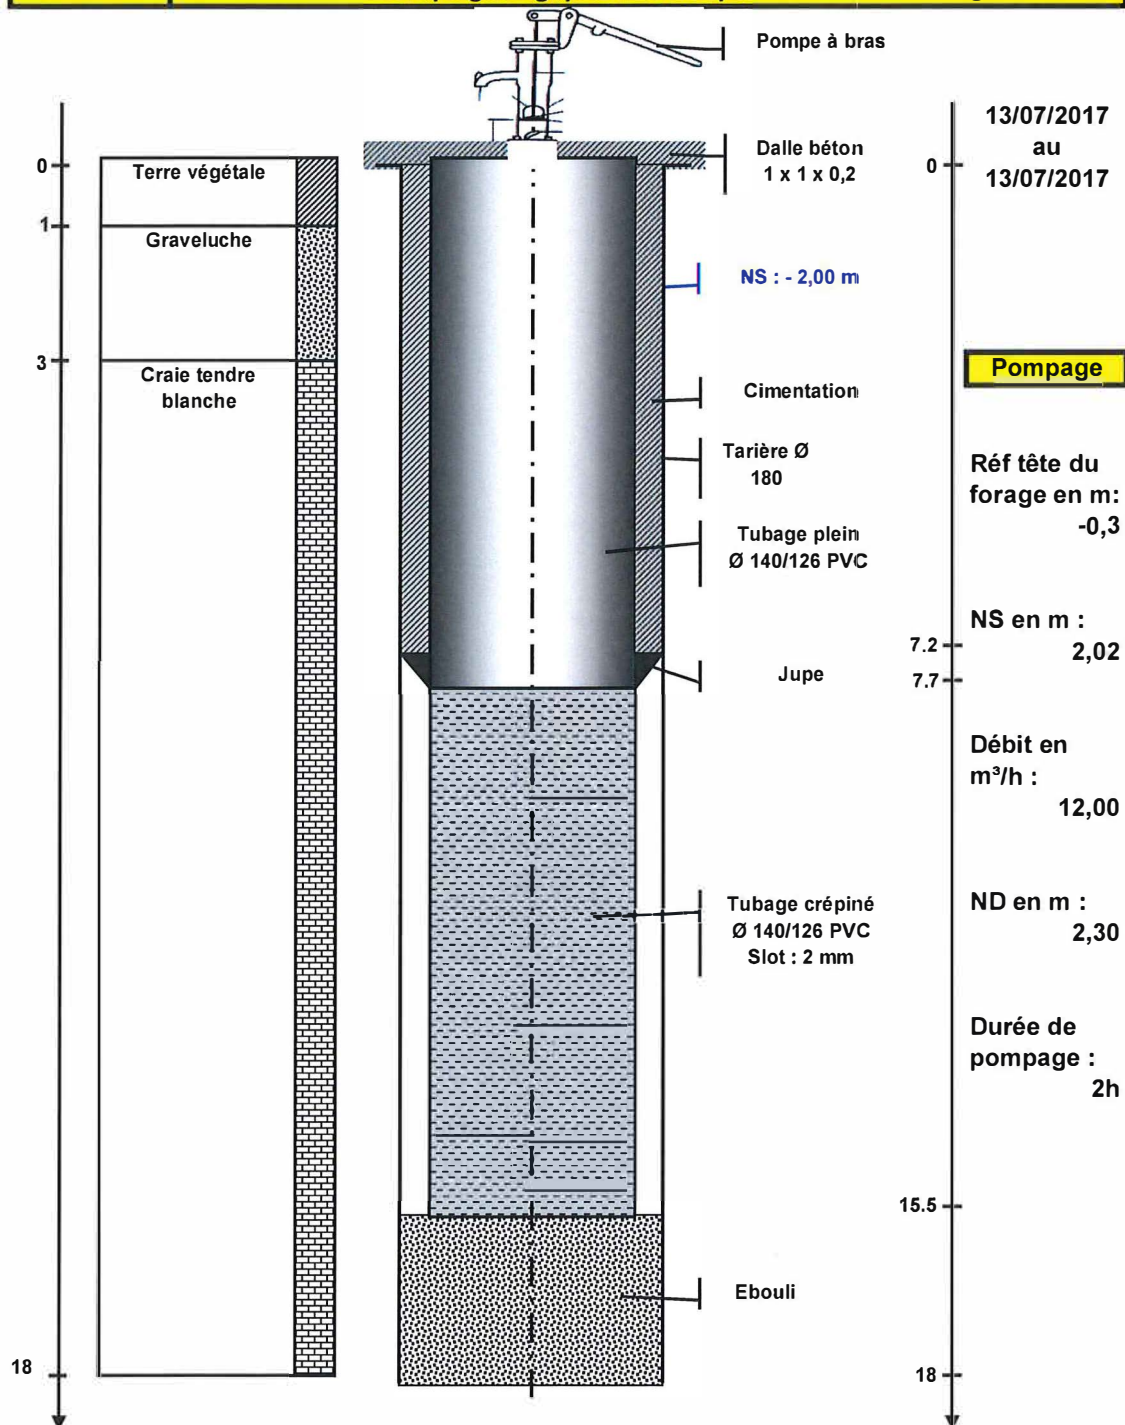

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	EDIVERT, 18 rue des blancs fossés, 51370 Ormes	
Date :	13/07/2017	n° DRIRE : En cours
Affaire suivie par :	Ville de Reims (Direction Espaces Verts)	
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'arrosage	
Lieu du chantier :	Reims, Rue de l'Epargne ; F1 : au début de la rue de l'Epargne	

Pompe à bras sur F1 :

