


DOSSIER TECHNIQUE

PR1 A

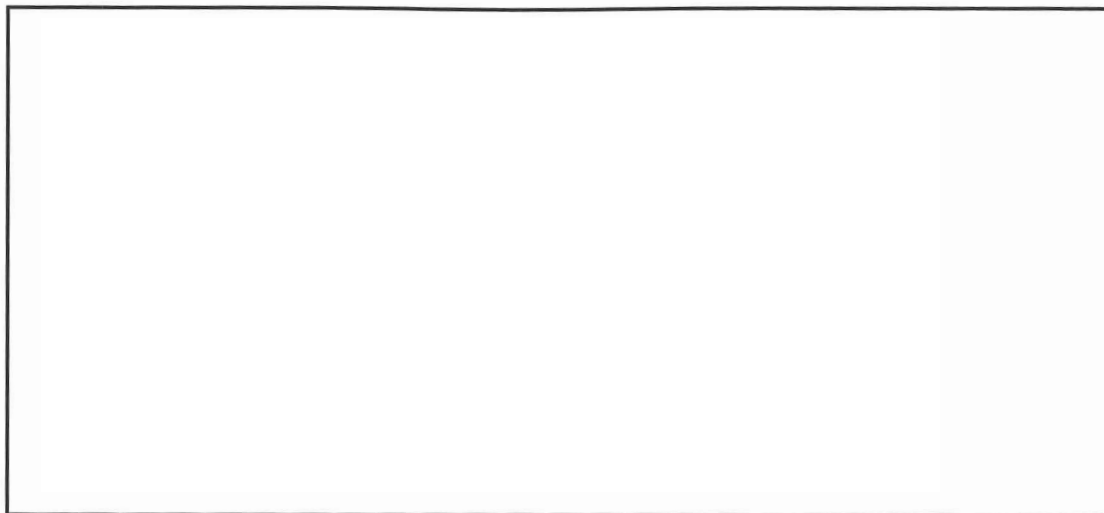

Code National BSS : **BSS004DKEN**

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Concession de DROUVILLE
54110 GELLENONCOURT

Coordonnées : Longitude 006°37'59"E Latitude 046°58'59"N Altitude : 245.03 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 16/11/2021

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 31/12/2021

Resp. M. Oeuvre :

Machine : MI 4 MASSENZA

Resp. Chantier :

Date début pompage : 10/12/2021

Niveau statique non perturbé : 4.10 m

Date fin de pompage : 10/12/2021

Débit Maxi. d'essai : 2.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : 2

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes : Une arrivée d'eau identifié au niveau des calcaires puis isolé (débit estimé: 1 m3/h)

TRONCONS de L'OUVRAGE

PR1 A

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

54110 GELLENONCOURT

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.50	Remblais
0.50	28.47	Marnes grise
28.47	42.00	CALCAIRE
42.00	52.00	ARGILE DE LEVALLOIS
52.00	71.50	RHETIEN

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	5.80	11"7/8	300.00	Rotary	Eau-claire
5.80	46.60	9"7/8	250.00	Rotary	Eau-claire
46.60	71.50	6"1/4	158.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
36.00	1.00
53.00	1.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	5.80	10"3/4	273.00	5.00		Acier-ordinaire	Tube-plein		
0.00	44.61	6"5/8	168.30	5.00		Acier-api	Tube-plein		
0.00	58.50	4"7/8	125.00	8.00		P.v.c.	Tube-plein		
58.50	70.50	4"7/8	125.00	8.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	
70.50	71.50	4"7/8	125.00	8.00		P.v.c.	Tube-decanteur		
71.50	71.55	4"7/8	125.00	8.00		P.v.c.	Fond-conique		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	5.80	10"3/4	273.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			1.05
0.00	46.60	6"5/8	168.30	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			0.69
0.00	49.00	4"7/8	125.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			

REMPLISSAGE (suite)

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
49.00	50.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactionite				0.02
50.00	71.50	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers du vercors	Gravitaire	Roule	1.50-4.60	0.18

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
0.00	0.00	Capot
0.00	71.50	Centreur

PR1 A

Travaux réalisés :
du : 16/11/2021 au : 31/12/2021

111

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage :

54110 GELLENONCOURT

Coordonnées de l'ouvrage :

Géographique
Longitude (X): 006°37'59"E
Latitude (Y): 046°58'59"N
Altitude sol (Z): +245,030 m

Nombre de forages : 1

Echelle : 1/360

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

