



TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

LA NOUE

77515

FAREMOUTIERS

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	7.00	ARGILE BRUNE
7.00	10.00	SABLE
10.00	13.00	ARGILE SABLEUSE
13.00	17.50	ARGILE
17.50	24.00	CALCAIRE MARNEUX AVEC DES MORCEAUX
24.00	27.00	ARGILE
27.00	29.00	ARGILE
29.00	49.00	CALCAIRE DUR

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	29.00	11"7/8	300.00	Rotary	Boue
29.00	49.00	6"5/8	168.00	Rotary	Boue

\* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	29.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
0.00	29.00	7"5/8	193.00	0.00		Acier-ordinaire	Tube-plein		
29.00	49.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	29.00	7"5/8	193.00	Ciment	Cpa 55	Sous pression			
0.00	49.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers roulés	Gravitaire	Roule		

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage : LA NOUE

77515 FAREMOUTIERS

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert-93 métrique

Longitude (X): 699 111


Latitude (Y): 6 854 344

Altitude sol (Z): +129,000 m

Echelle : 1/246

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

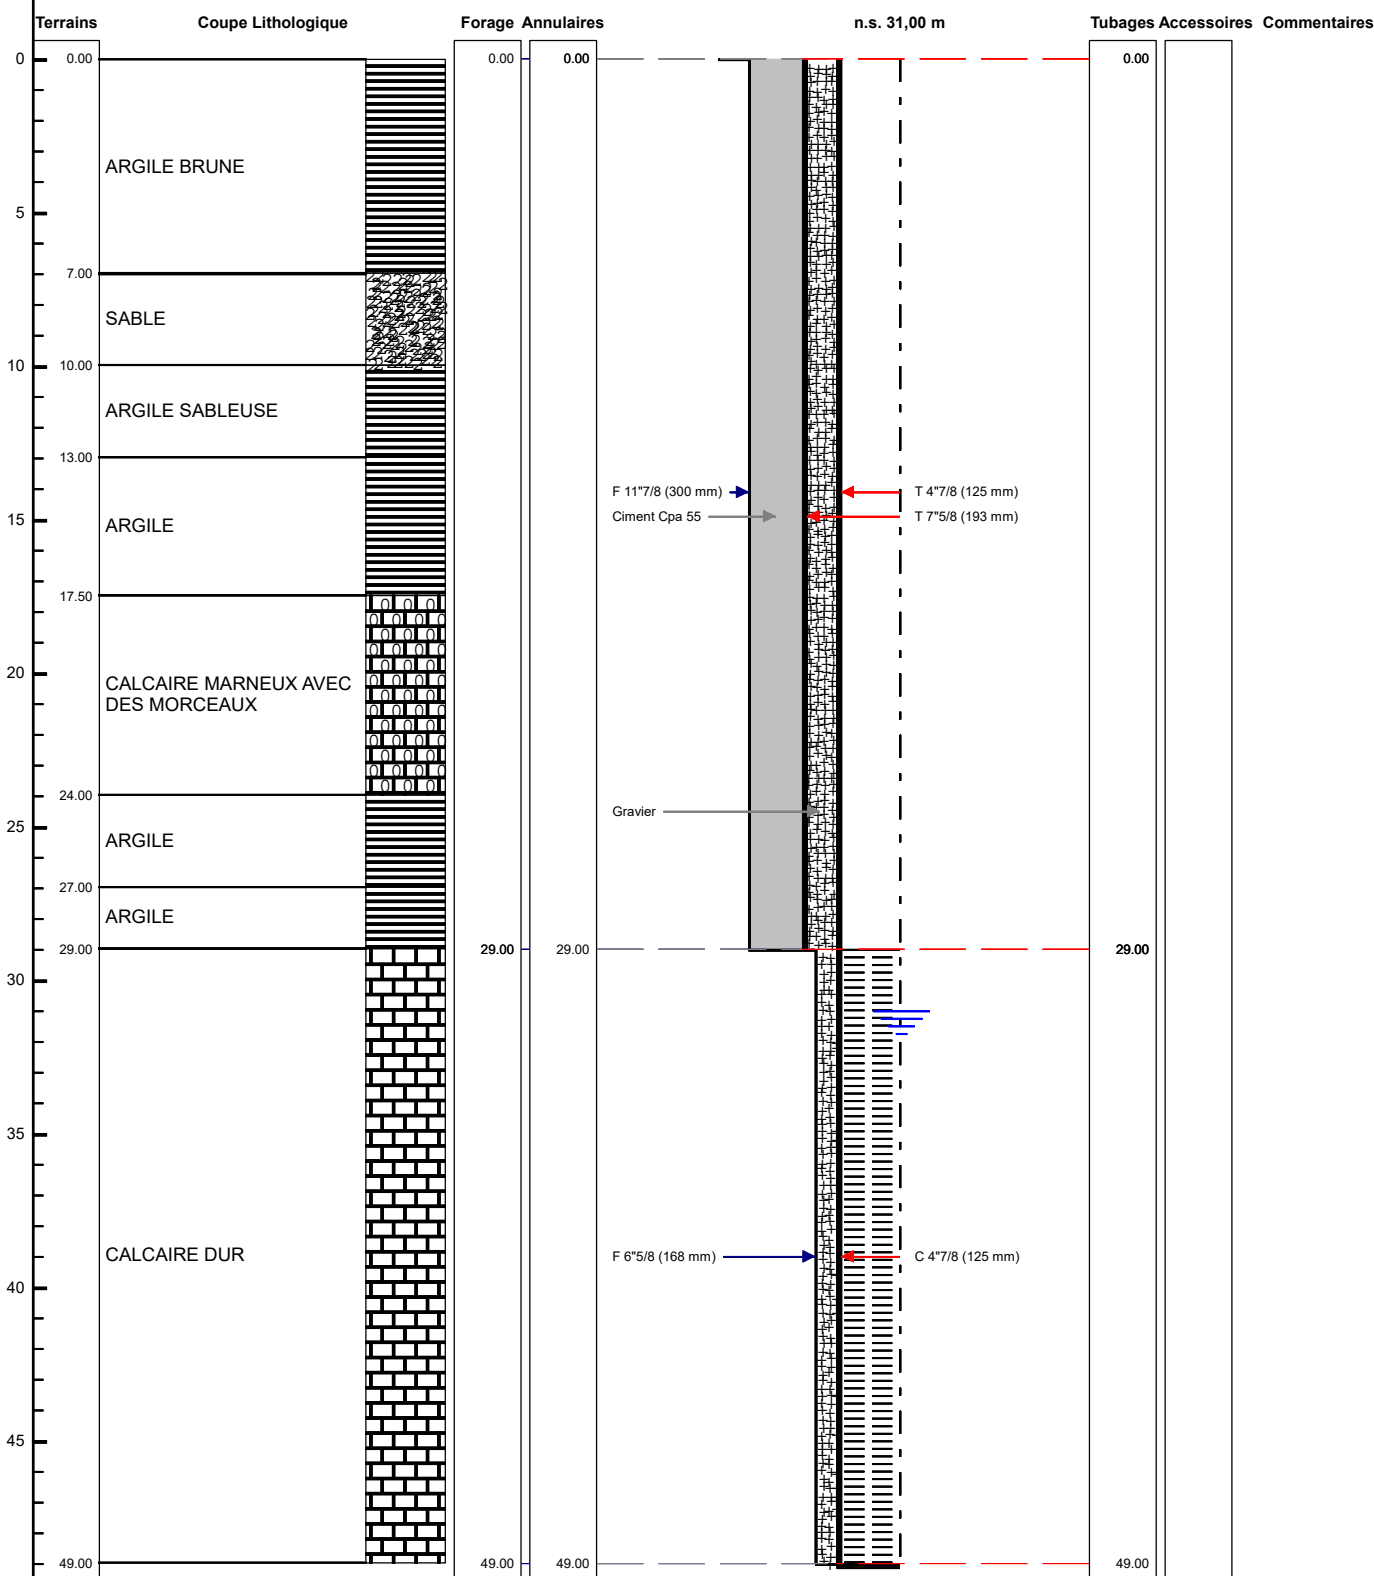

Le ...../...../..... à .....

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise
