

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU N°1 POMPAGE

Entreprise: **SARL BREBANT FORAGE**

Client:

Maître d'oeuvre: **BREBANT FORAGE**
ZA 8 RUE DU COURTIL
50510 CERENCES

Exploitant:

Code National BSS : BSS004CWJG

N° Déclaration ** : GMI 10738

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : LE PETIT PIED DU BOIS
14260 AUNAY SUR ODON

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 **Altitude :** 0.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 31/03/2022

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 31/03/2022

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Stenuick

Resp. Chantier :

Date début pompage : 06/04/2022

Niveau statique non perturbé : 3.13 m

Date fin de pompage : 08/04/2022

Débit Maxi. d'essai : 2.50 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 7.02 m

Notes : NIVEAU STATIQUE 3.13 METRES
NIVEAU DYNAMIQUE 10.15 METRES A UN DEBIT DE 2.5 M3/HEURE
DUREE DES ESSAI 48 HEURES

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU N°1 POMPAGE

Client:			
Maître d'oeuvre:	BREBANT FORAGE		
Lieu de l'ouvrage :	LE PETIT PIED DU BOIS		
	14260	AUNAY SUR ODON	

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	11.00	SCHISTE FRACTURE
11.00	46.00	SCHISTE GRIS

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	12.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
12.00	46.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
30.00	3.00
40.00	5.00
46.00	5.40

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	22.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
22.00	26.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes		
26.00	30.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
30.00	38.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes		
38.00	42.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
42.00	46.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	11.00	4"7/8	125.00	Ciment	Ciment-bentonite	Sous pression			
11.00	12.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactionite				

FORAGE D'EAU N°1 POMPAGE

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage : LE PETIT PIED DU BOIS

14260 AUNAY SUR ODON

Travaux réalisés :
du : 31/03/2022 au : 31/03/2022

1/1

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique

Longitude (X):

0

Latitude (Y):

0


Altitude sol (Z):

+0,000 m

Echelle : 1/231

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

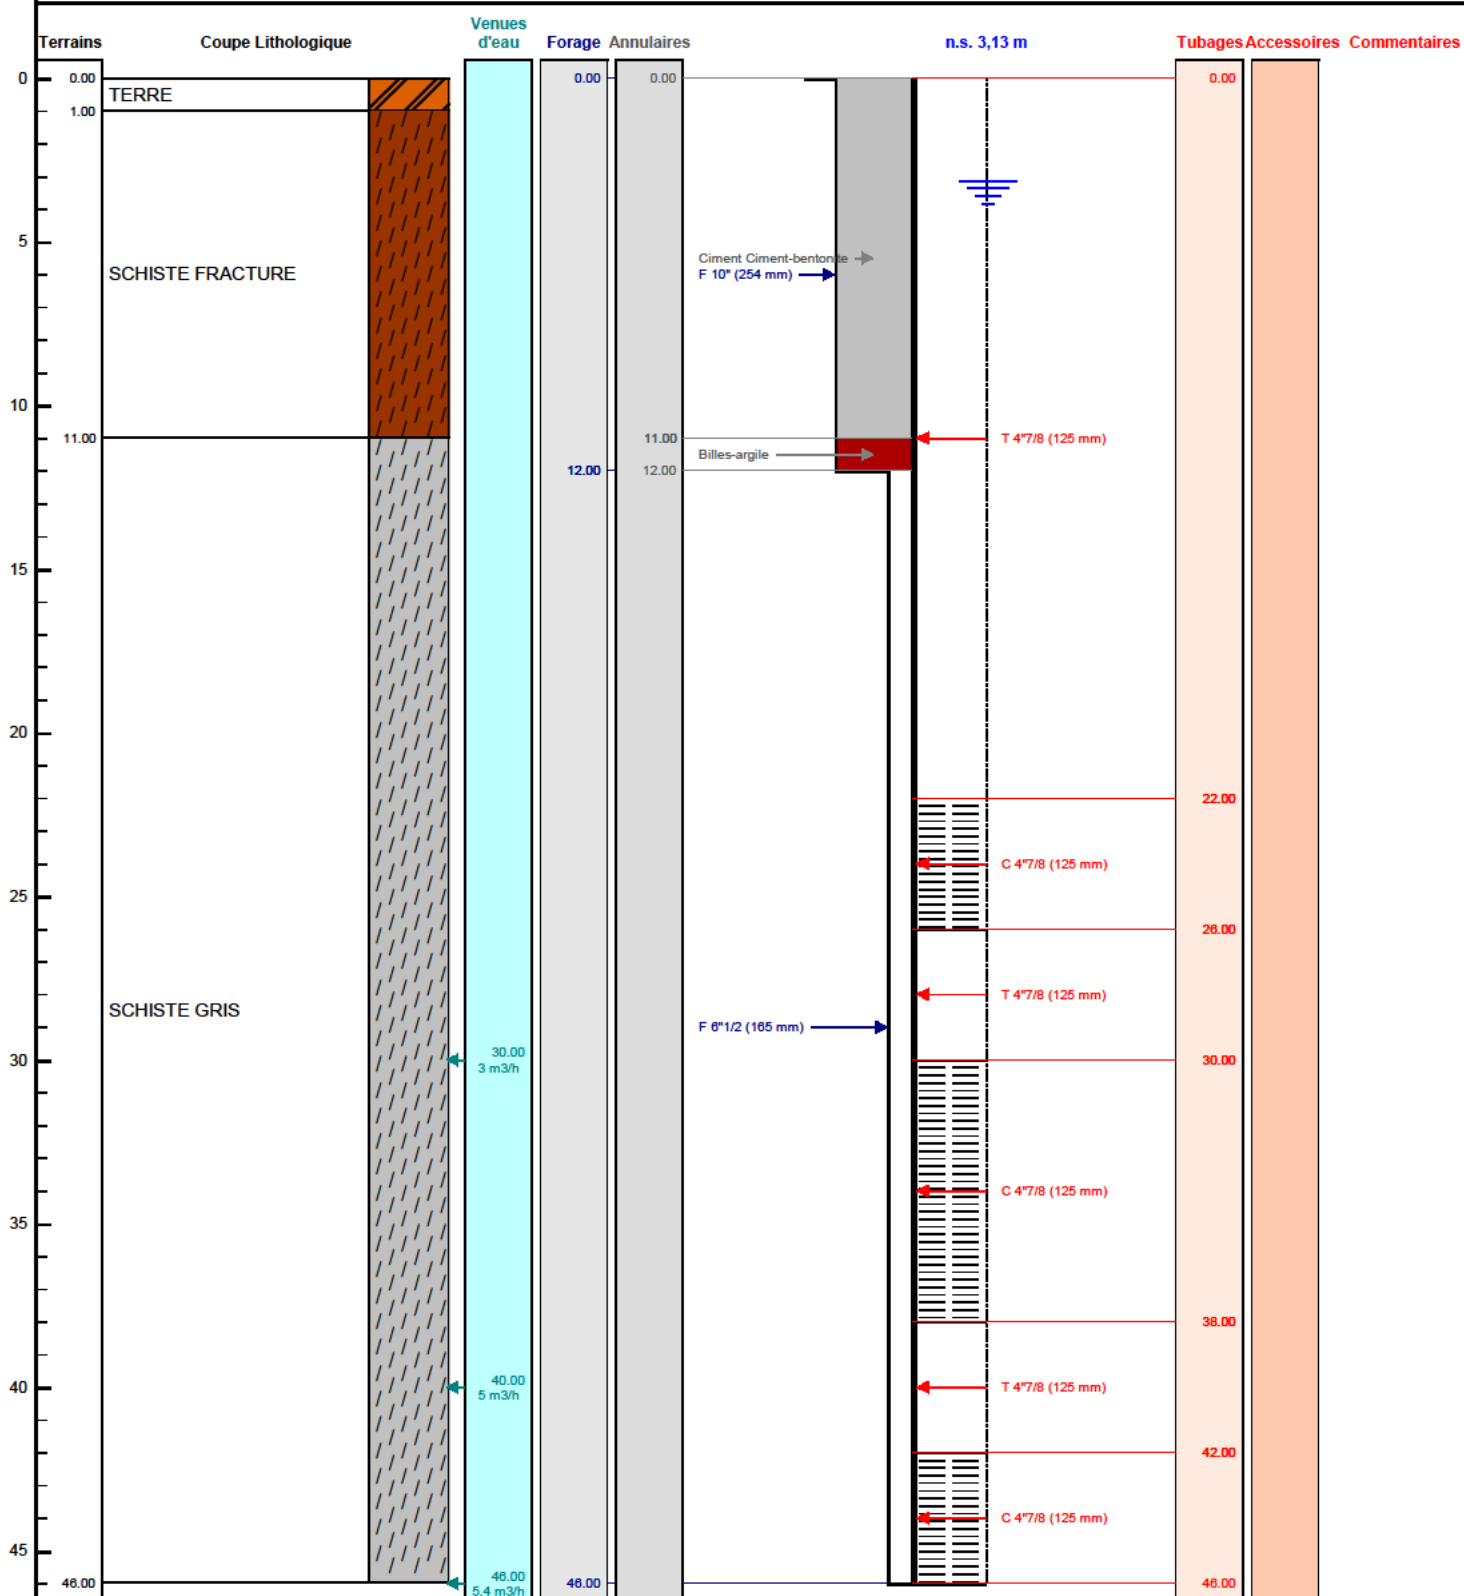

Le/...../..... à
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise
