



## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Client:</b>             | PIGEON GRANULATS CIDF                                  |
| <b>Maître d'oeuvre:</b>    | PIGEON GRANULATS CIDF                                  |
| <b>Lieu de l'ouvrage :</b> | LA CAMPAGNE DU PETIT BUISSON<br>28310 FRESNAY L EVEQUE |

## LITHOLOGIE

| De   | à     | Libellé        |
|------|-------|----------------|
| 0.00 | 1.00  | TERRE VEGETALE |
| 1.00 | 28.00 | CALCAIRE       |

## FORAGE

| De   | à     | Ø"    | Ømm    | Mode de forage | Fluide de forage |
|------|-------|-------|--------|----------------|------------------|
| 0.00 | 28.00 | 8"1/2 | 215.00 | M.f.t.         | Air              |

\* Reconnaissance

## TUBAGE

| De    | à     | Ø"    | Ømm    | Epais. | Ecra. | Nature du tubage | Type           | Slot | Vide % |
|-------|-------|-------|--------|--------|-------|------------------|----------------|------|--------|
| 0.00  | 20.51 | 4"7/8 | 125.00 | 6.50   | 10    | P.v.c.           | Tube-plein     |      |        |
| 20.51 | 26.37 | 4"7/8 | 125.00 | 6.50   | 10    | P.v.c.           | Crepine fentes |      |        |

## REPLISSAGE

| De    | à     | Ø"    | Ømm    | Matériau      | Nature            | Méthode de pose | Texture | Gra. (mm) | Vol. m3 |
|-------|-------|-------|--------|---------------|-------------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 0.00  | 15.00 | 4"7/8 | 125.00 | Ciment        | Cpa 55            | Gravitaire      |         |           |         |
| 15.00 | 15.50 | 4"7/8 | 125.00 | Billes-argile | Compactonite      |                 |         |           |         |
| 15.50 | 28.00 | 4"7/8 | 125.00 | Gravier       | Graviers de loire | Gravitaire      | Roule   |           |         |

# FORAGE D'EAU

Travaux réalisés : 111  
du : 01/04/2022 au : 08/04/2022


Client : PIGEON GRANULATS CIDF  
Maitre d'oeuvre : PIGEON GRANULATS CIDF  
Localisation de l'ouvrage : LA CAMPAGNE DU PETIT BUISSON  
28310 FRESNAY L EVEQUE

Coordonnées de l'ouvrage :  
Lambert-93 métrique  
Longitude (X): 609 132  
Latitude (Y): 6 793 471  
Altitude sol (Z): +0,000 m

Echelle : 1/141

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

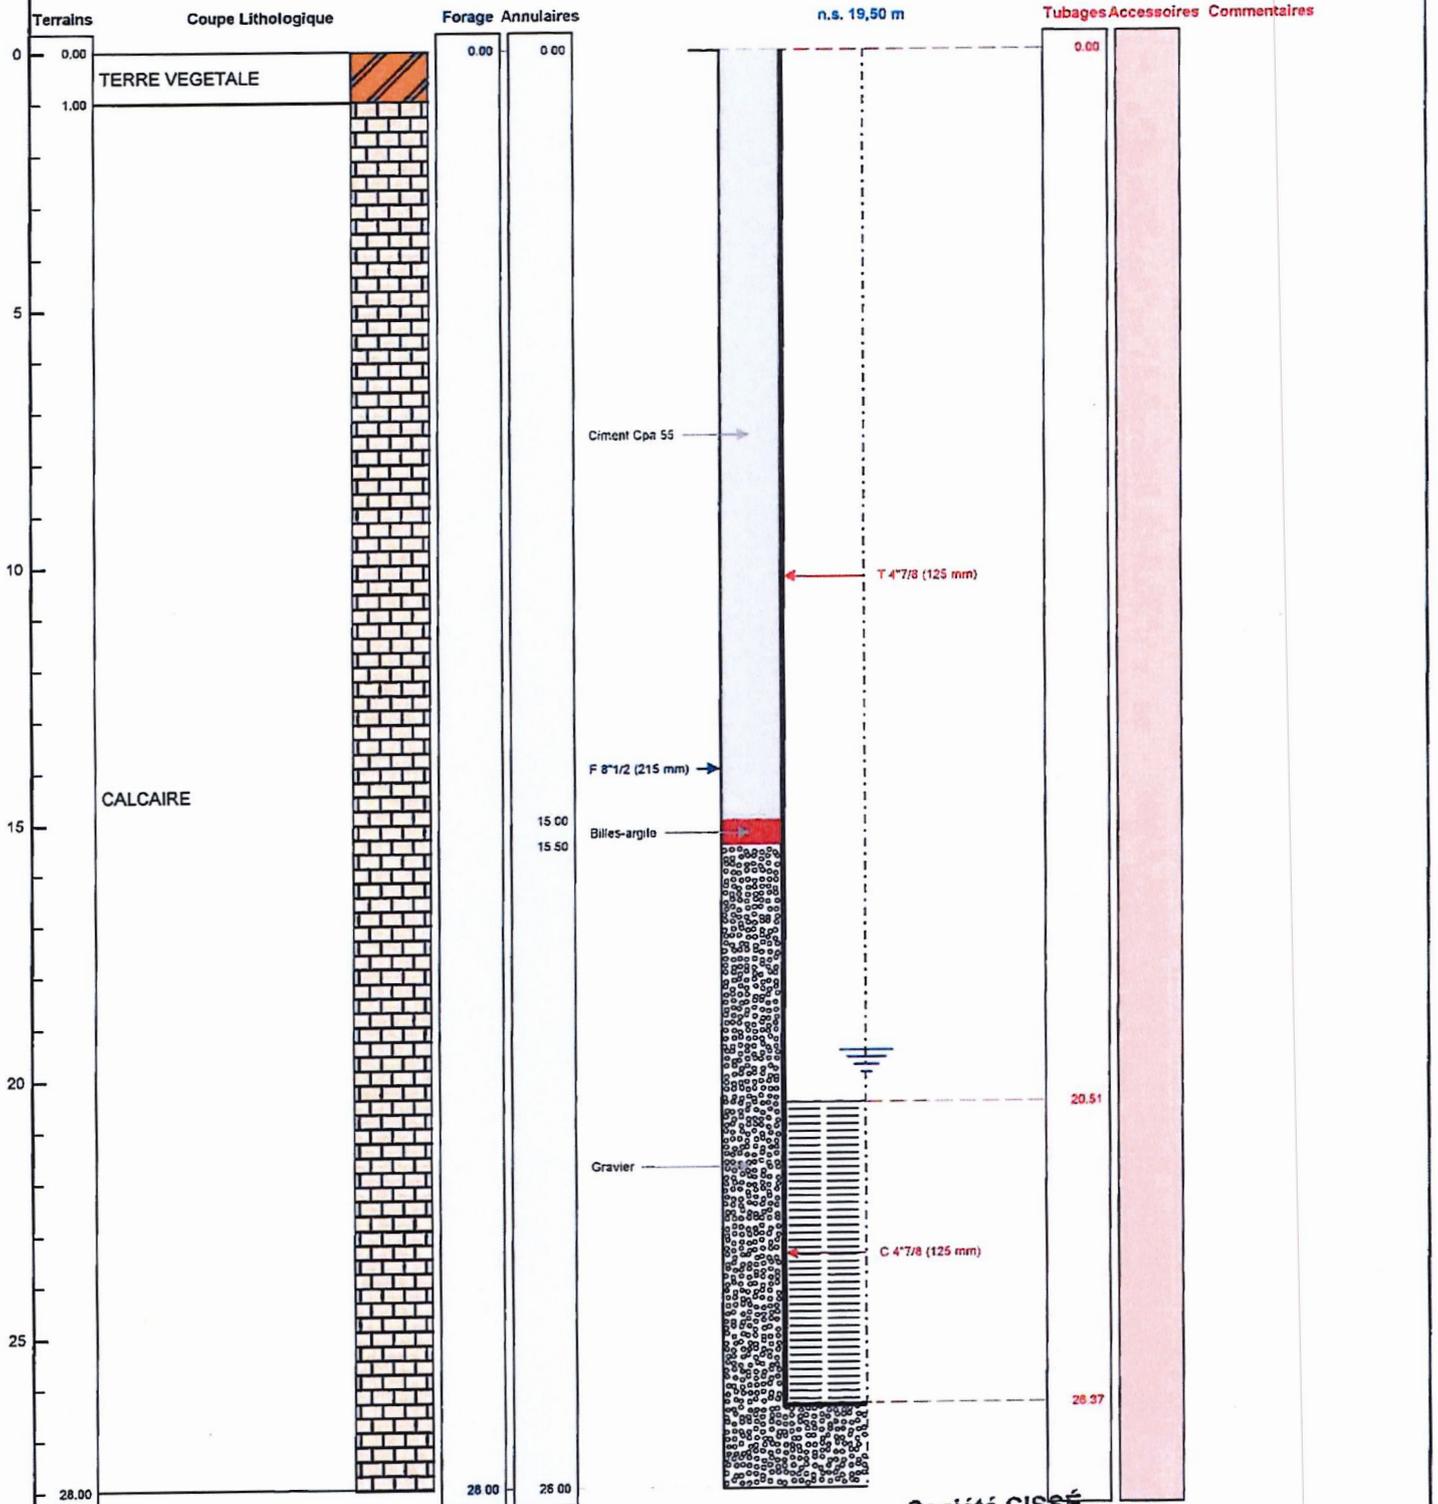

Société Cissé

BP 7 - ZA de la Votterie  
72440 BOULOIRE

Le 20.10.2022 à *Boulon*  
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE  
Tampon et signature du chef d'entreprise

Tél. 02 43 35 13 09 - Fax 02 43 35 04 79  
RCS 407 773 894 00040 - Capital de 300 000 €  
N° TVA Intracomm. FR 85 407 773 894 - APE 4224Z
