

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise:	
Client:	
Maître d'oeuvre:	
Exploitant:	

Code National BSS : **B55004 B5ZE**

N° Déclaration ** : 67281

Police de l'eau * : 27-2021-00144

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 2 RUE DE L'EGLISE

27110 CRIQUEBEUF LA CAMPAGNE

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 151.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 04/10/2021

Resp. M. Ouvrage : DUBUISSON

Date fin de l'ouvrage : 06/10/2021

Resp. M. Oeuvre : GAUTIER

Machine : ECOFORE

Resp. Chantier : GODEY

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 65.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 1.50 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

27110

CRIQUEBEUF LA CAMPAGNE

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	12.00	ARGILE A SILEX MARRON CLAIR
12.00	15.00	ARGILE A SILEX MARRON FONCE NOIR
15.00	80.00	CRAIE BLANCHE A SILEX

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	20.00	8" 7/8	225.00	M.f.t.	Air
20.00	80.00	6" 1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
72.00	1.50

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	60.00	4" 7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
60.00	76.00	4" 7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		50
76.00	80.00	4" 7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	20.00	4" 7/8	125.00	Ciment	Autre	Gravitaire			
20.00	80.00	4" 7/8	125.00	Gravier	Graviers de Loire	Gravitaire	Roule		

FORAGE D'EAU

Travaux réalisés : 11
du : 04/10/2021 au : 06/10/2021 1

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage : 2 RUE DE L'EGLISE

27110 CRIQUEBEUF LA CAMPAGNE

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique

Longitude (X): 0


Latitude (Y): 0

Altitude sol (Z): +151.000 m

Echelle : 1/402

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

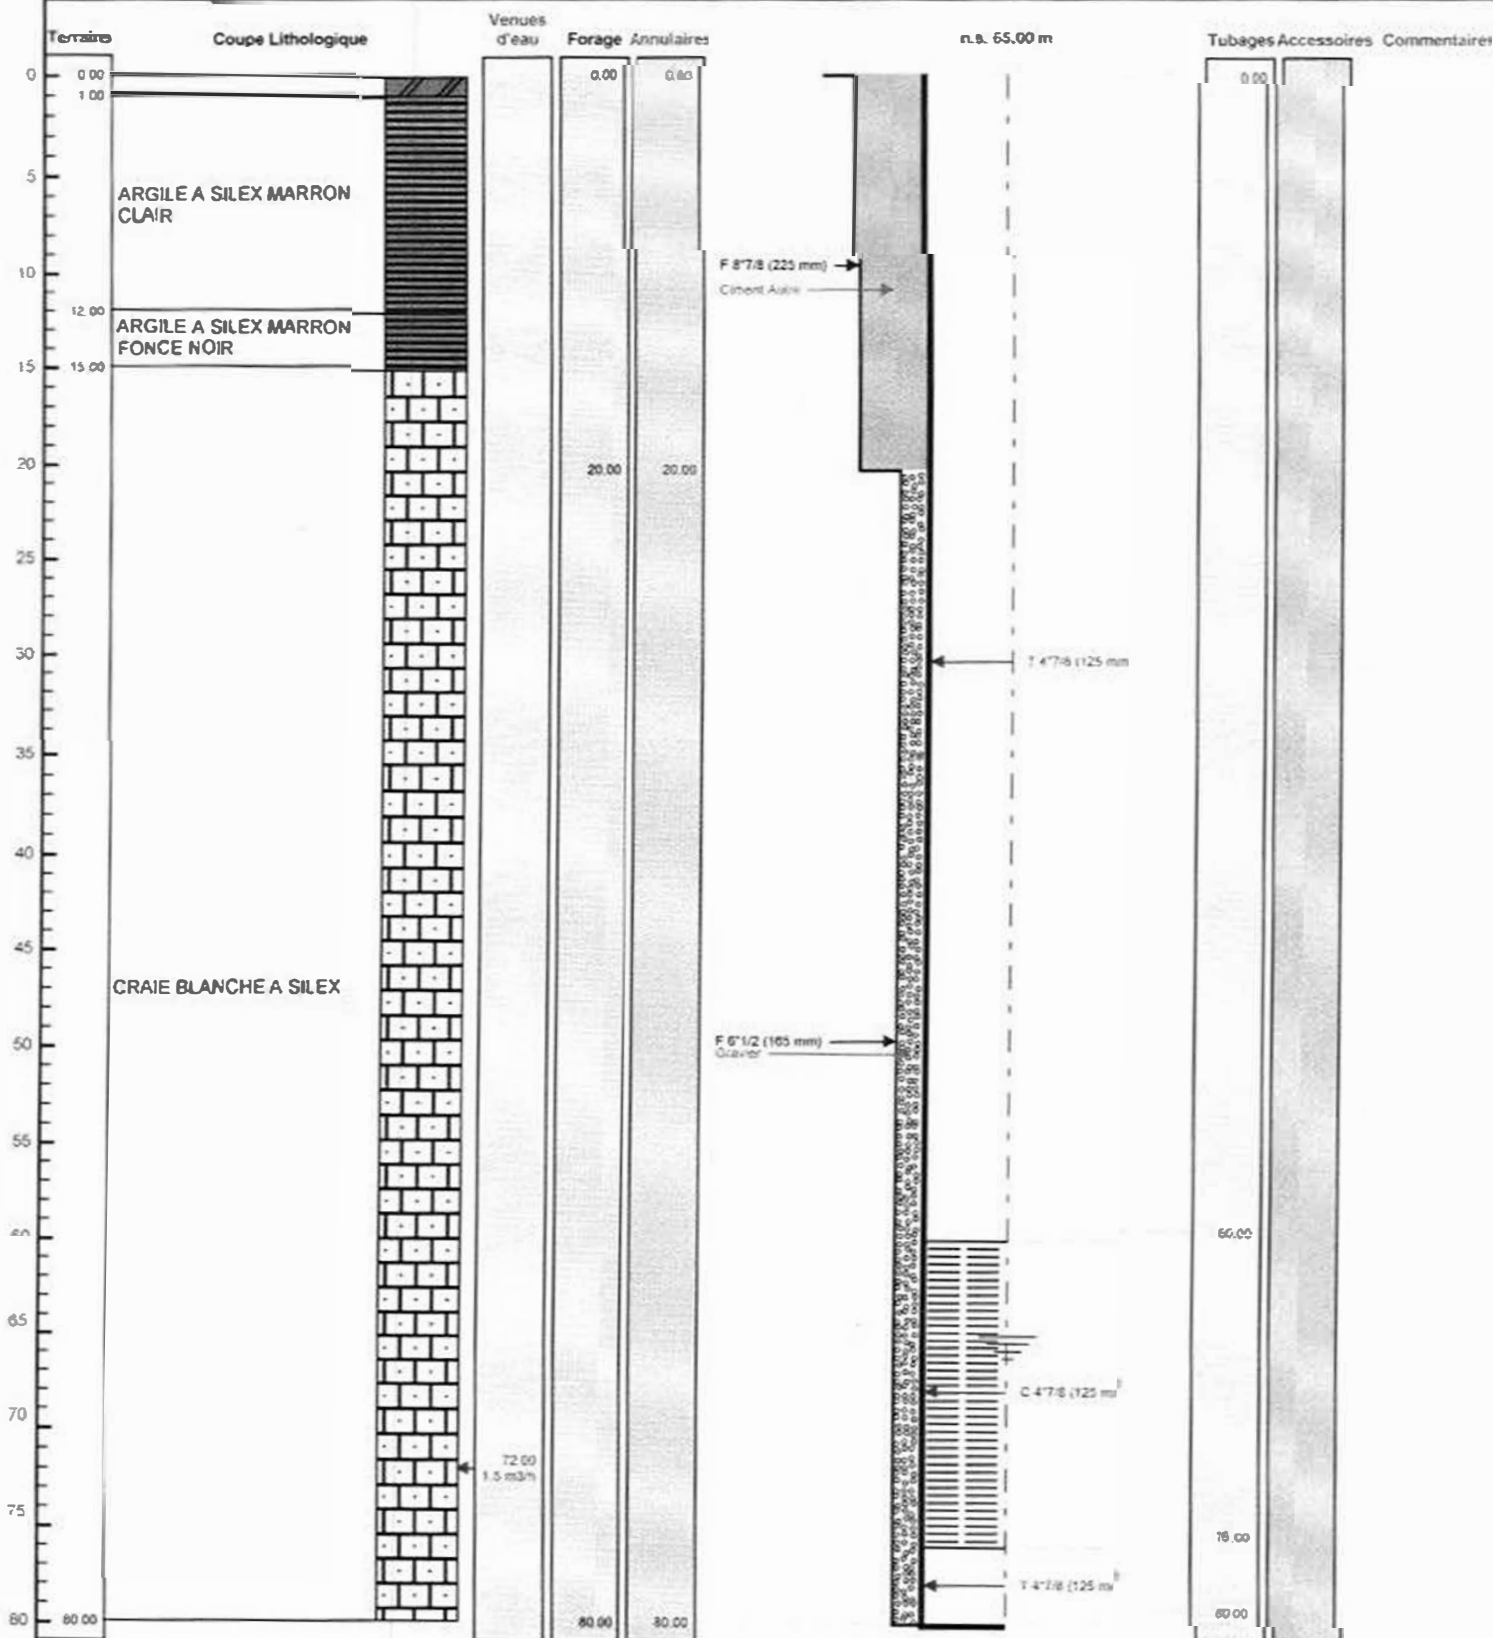

Le 05/10/2021 à 10h00
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise
NORMANDIE FORAGE
251 rue de l'Odéon - 14790 VERNON
Tel : 02 31 06 15 21 Port : 06 15 05 68 74
normandieforage@wanadoo.fr

Lambert 1 carto métrique

N° Siren 420 697 708 00022 +151.000 m

PAGE: 3
