

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise: BRETAGNE FORAGE

Client:

Maître d'oeuvre: IGEFOR ENVIRONNEMENT
26 le Tertre
35580 GUIGNEN

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage :

Coordonnées : **Longitude** 270 417 **Latitude** 6 745 349 **Altitude :** 20.00 m

Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 30/06/2022

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 30/06/2022

Resp. M. Oeuvre :

Machine :

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 0.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabatement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	3.00	Produits d'altération
3.00	15.00	Granite
15.00	42.00	Granites gris
42.00	100.00	Granites gris clair avec quartz à 60, 70 et 88 m

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
10.00	100.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
21.00	0.50
43.00	1.00
70.00	1.00
88.00	2.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	24.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
24.00	28.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes		
28.00	32.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
32.00	36.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes		
36.00	40.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
40.00	44.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes		
44.00	48.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
48.00	52.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes		
52.00	56.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
56.00	60.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes		
60.00	64.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
64.00	96.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes		
96.00	100.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		

REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	10.00	4"7/8	125.00	Ciment	Clk	Sous pression			

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
10.00	11.00	Packer

FORAGE D'EAU

Client :
Maitre d'oeuvre :
Localisation de l'ouvrage


Travaux réalisés : 1/1
du : 30/06/2022 au : 30/06/2022

Coordonnées de l'ouvrage :
Lambert-93 métrique
Longitude (X): 270 417
Latitude (Y): 6 745 349
Altitude sol (Z): +20,000 m

Echelle : 1/503

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

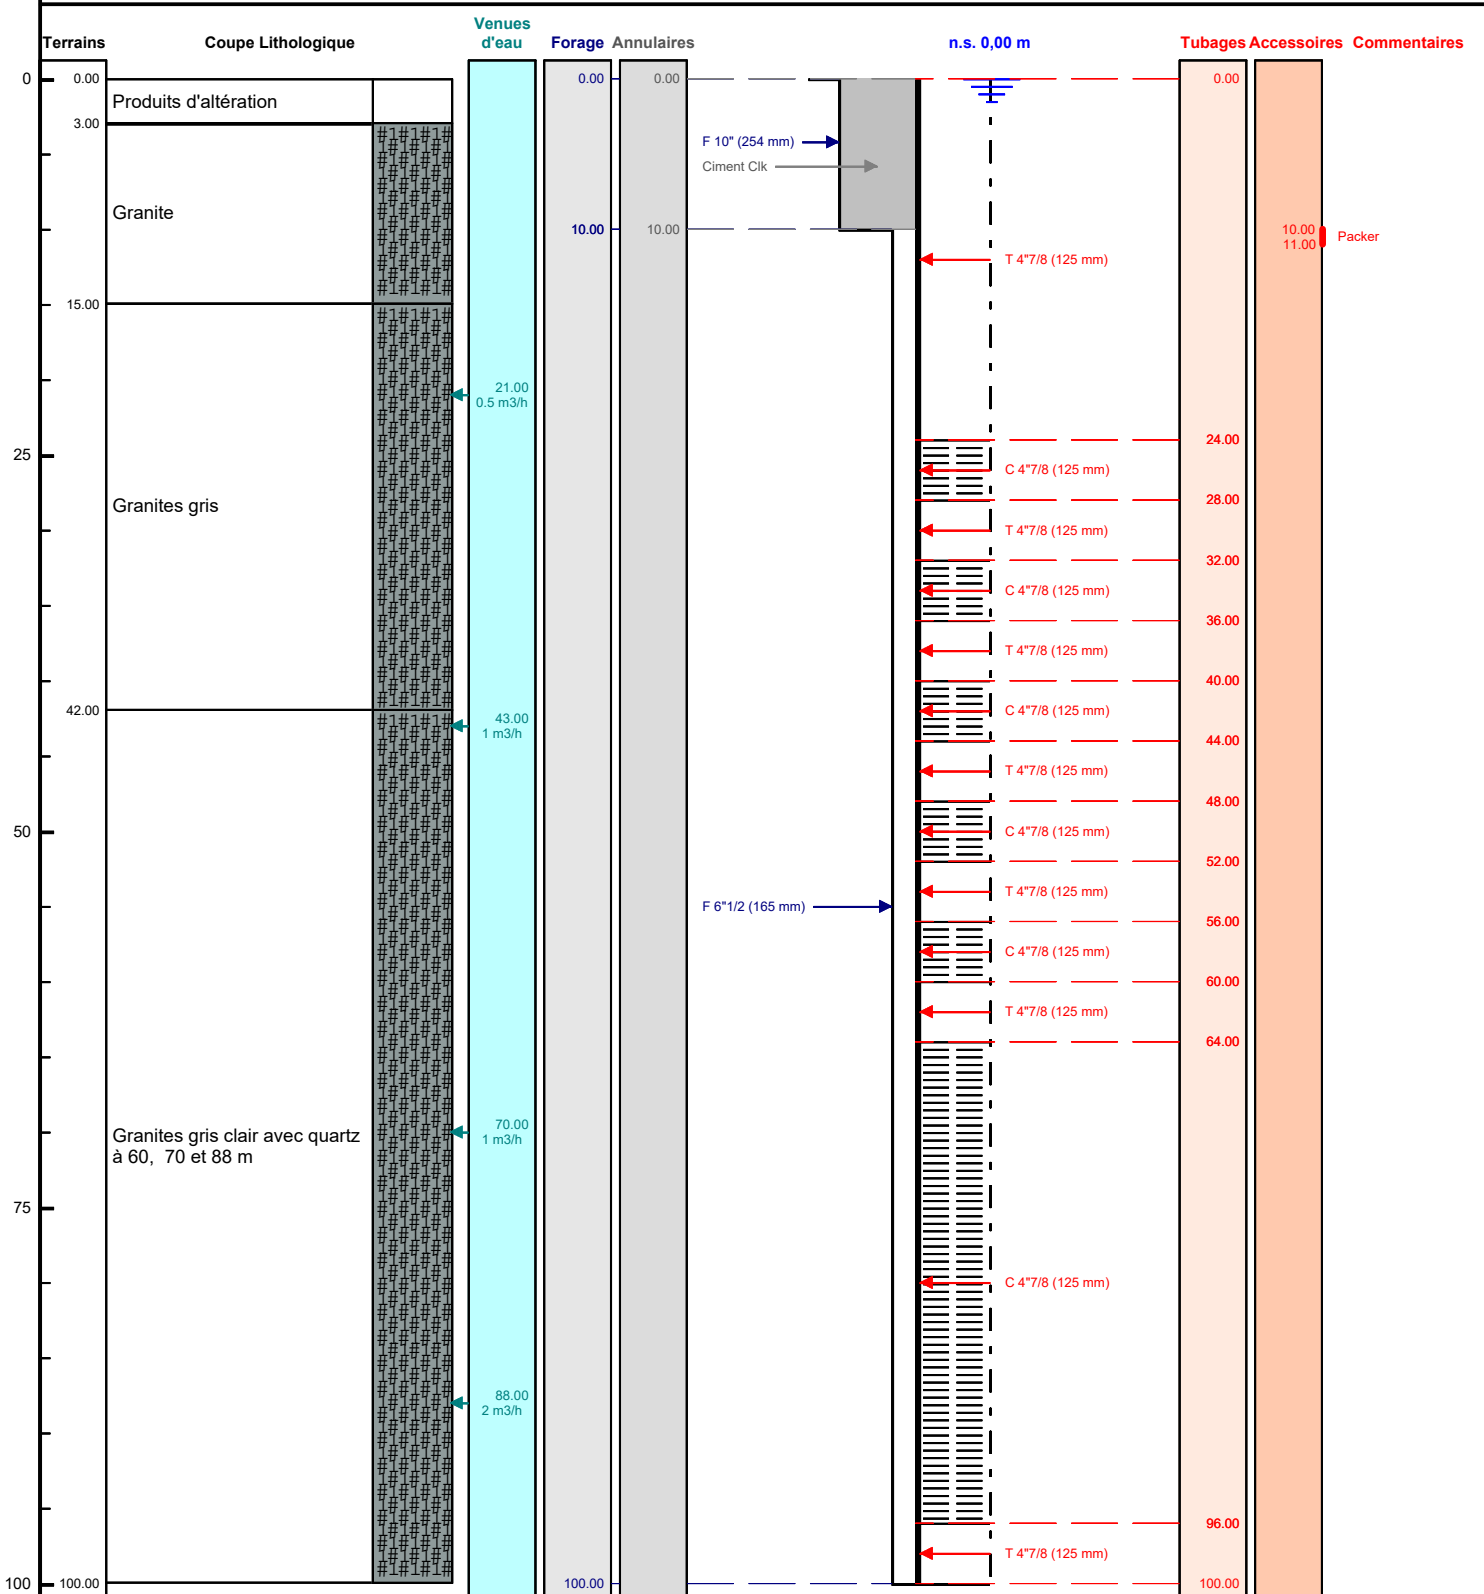

Le/...../..... à
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise
