

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU N°3 POMPAGE N°2

Entreprise: **SARL BREBANT YANN FORAGE**

Client:

Maître d'oeuvre: **BREBANT FORAGE**
ZA 8 RUE DU COURTIL
50510 CERENCES

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration * :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : LE CHATEAU
14710 ASNIERES EN BESSIN

Coordonnées : Longitude 000°56'22 14"W Latitude 049°21'51,48"N **Altitude :** 0.00 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 19/10/2016

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 19/10/2016

Resp. M. Oeuvre : BREBANT

Machine : STENUICK

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 0.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE
FORAGE D'EAU N°3 POMPAGE N°2

Client:

Maître d'oeuvre:

BREBANT FORAGE

Lieu de l'ouvrage :

LE CHATEAU

14710

ASNIERES EN BESSIN

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	6.00	CALCAIRE ARGILE
6.00	30.00	ARGILE NOIRE
30.00	40.00	CALCAIRE

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	18.00	9"	229.00	M.f.t.	Air
18.00	40.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
30.00	30.00
40.00	35.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	20.00	4"7/8	25.00	5.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
20.00	24.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes	1.00	
24.00	28.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
28.00	32.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes	1.00	
32.00	36.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
36.00	40.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	17.00	4"7/8	125.00	Ciment	Ciment-bentonite	Sous pression			
17.00	18.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactonite				

FORAGE D'EAU N°3 POMPAGE N°2

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage :

BREBANT FORAGE

LE CHATEAU

14710 ASNIERES EN BESSIN

Travaux réalisés :

du : 19/10/2016 au : 19/10/2016

1/1

Coordonnées de l'ouvrage :

Géographique

Longitude (X): 000°56'22,14"W


Latitude (Y): 049°21'51,48"N

Altitude sol (Z): +0,000 m

Echelle : 1/201

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

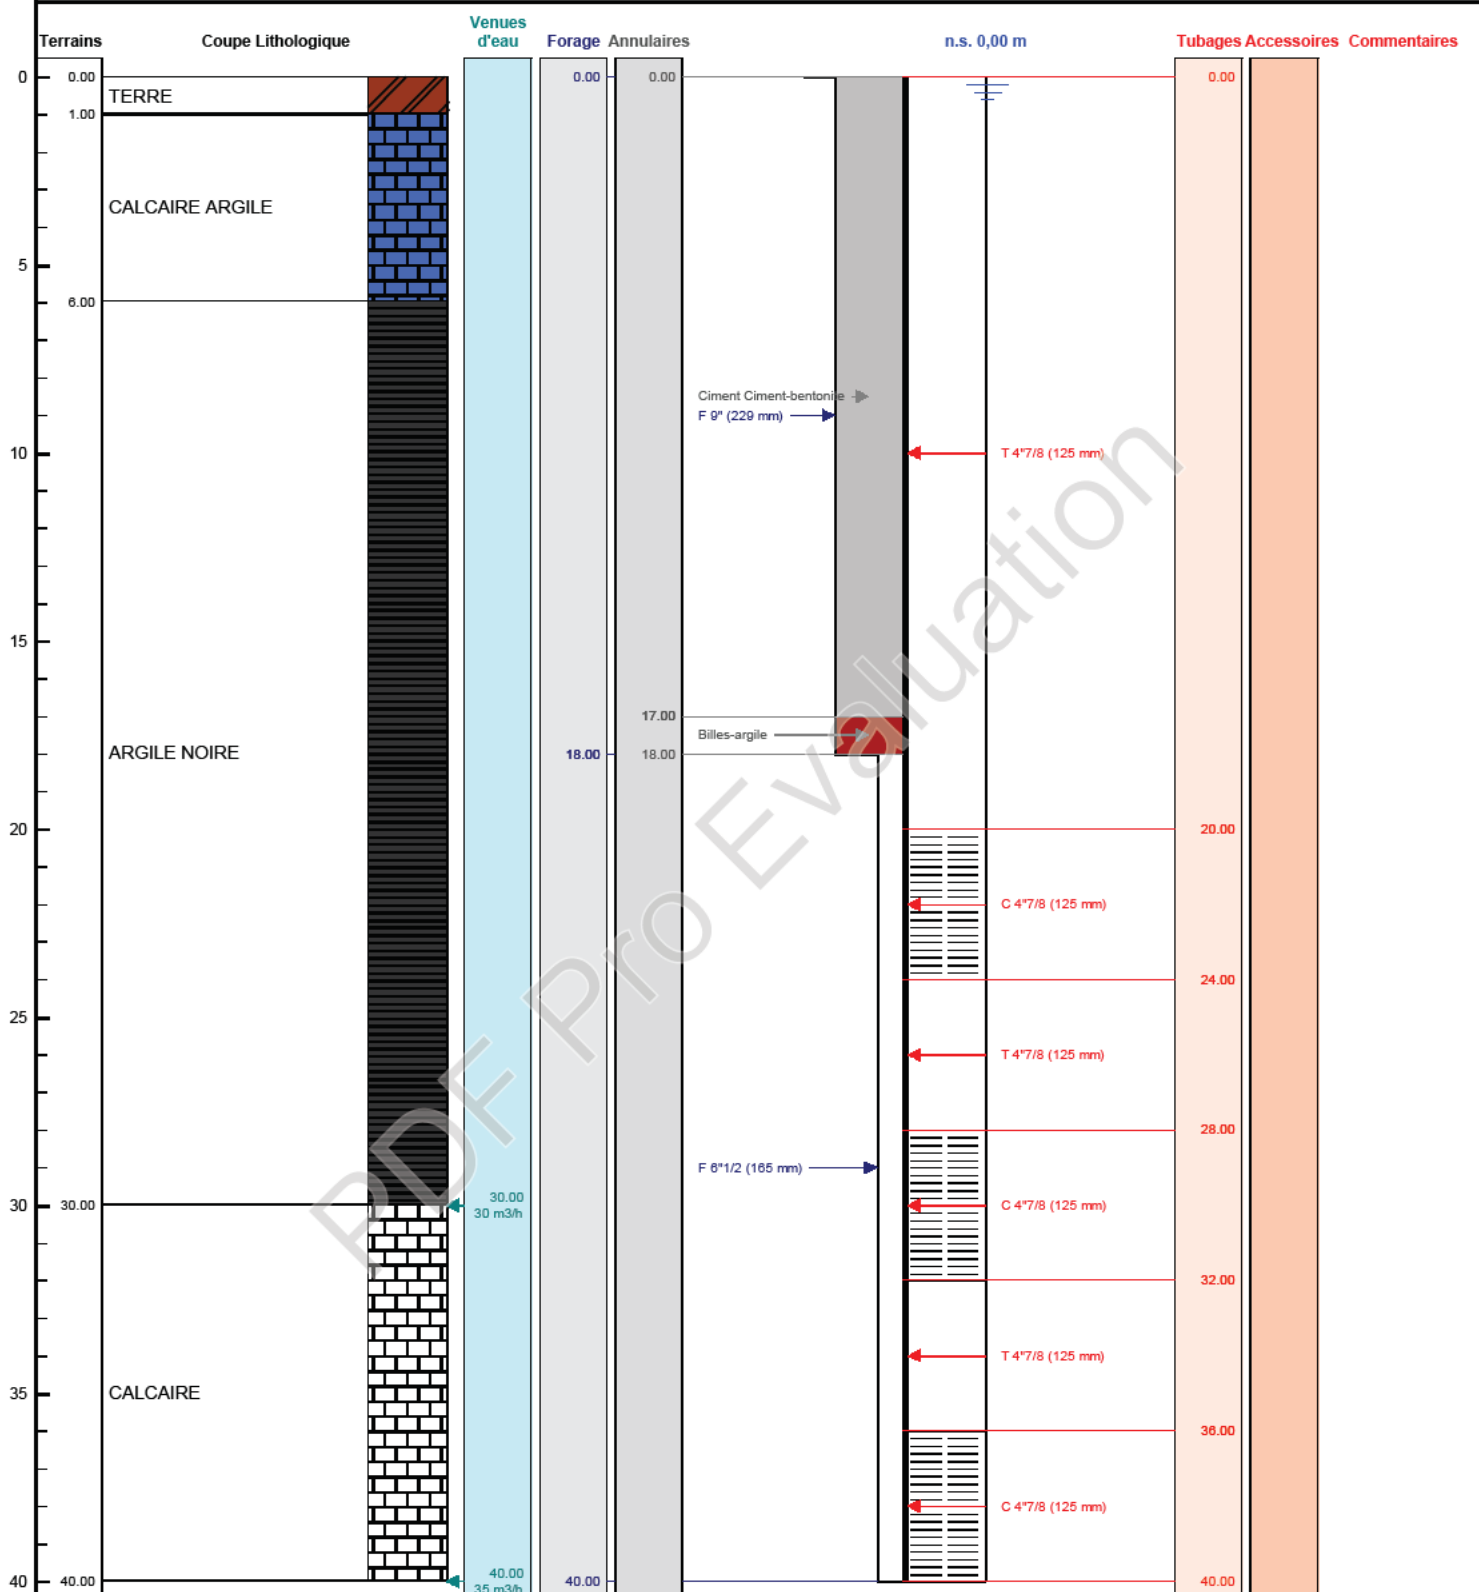

Le/...../..... à
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise
