

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU N°4 POMPAGE N°1

Entreprise: **SARL BREBANT YANN FORAGE**

Client:

Maître d'oeuvre: **BREBANT FORAGE**  
ZA 8 RUE DU COURTIL  
50510 CERENCES

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration \* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** LE CHATEAU  
14710 ASNIERES EN BESSIN

**Coordonnées :** Longitude 000°56'22.5 W Latitude 049°21'51,48"N **Altitude :** 0.00 m

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :** 19/10/2016

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 19/10/2016

**Resp. M. Oeuvre :** BREBANT

**Machine :** STENUICK

**Resp. Chantier :**

**Date début pompage :**

**Niveau statique non perturbé :** 0.00 m

**Date fin de pompage :**

**Débit Maxi. d'essai :** 0.00 m3/h

**Nombre de nappes identifiées :**

**Rabattement correspondant :** 0.00 m

**Notes :**

TRONCONS de L'OUVRAGE  
FORAGE D'EAU N°4 POMPAGE N°1

Client:

Maître d'oeuvre:

BREBANT FORAGE

Lieu de l'ouvrage :

LE CHATEAU

14710

ASNIERES EN BESSIN

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	8.00	CALCAIRE ARGILE
8.00	32.00	ARGILE NOIRE
32.00	40.00	CALCAIRE

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	18.00	9"	229.00	M.f.t.	Air
18.00	40.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
30.00	30.00
40.00	35.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	20.00	4"7/8	25.00	5.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
20.00	24.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes	1.00	
24.00	28.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
28.00	32.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes	1.00	
32.00	36.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
36.00	40.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	17.00	4"7/8	125.00	Ciment	Ciment-bentonite	Sous pression			
17.00	18.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactonite				

# FORAGE D'EAU N°4 POMPAGE N°1

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage :

14710 ASNIERES EN BESSIN

Travaux réalisés :  
du : 19/10/2016 au : 19/10/2016

1/1

Coordonnées de l'ouvrage :

Géographique

Longitude (X): 000°56'22,5"W


Latitude (Y): 049°21'51,48"N

Altitude sol (Z): +0,000 m

Echelle : 1/201

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

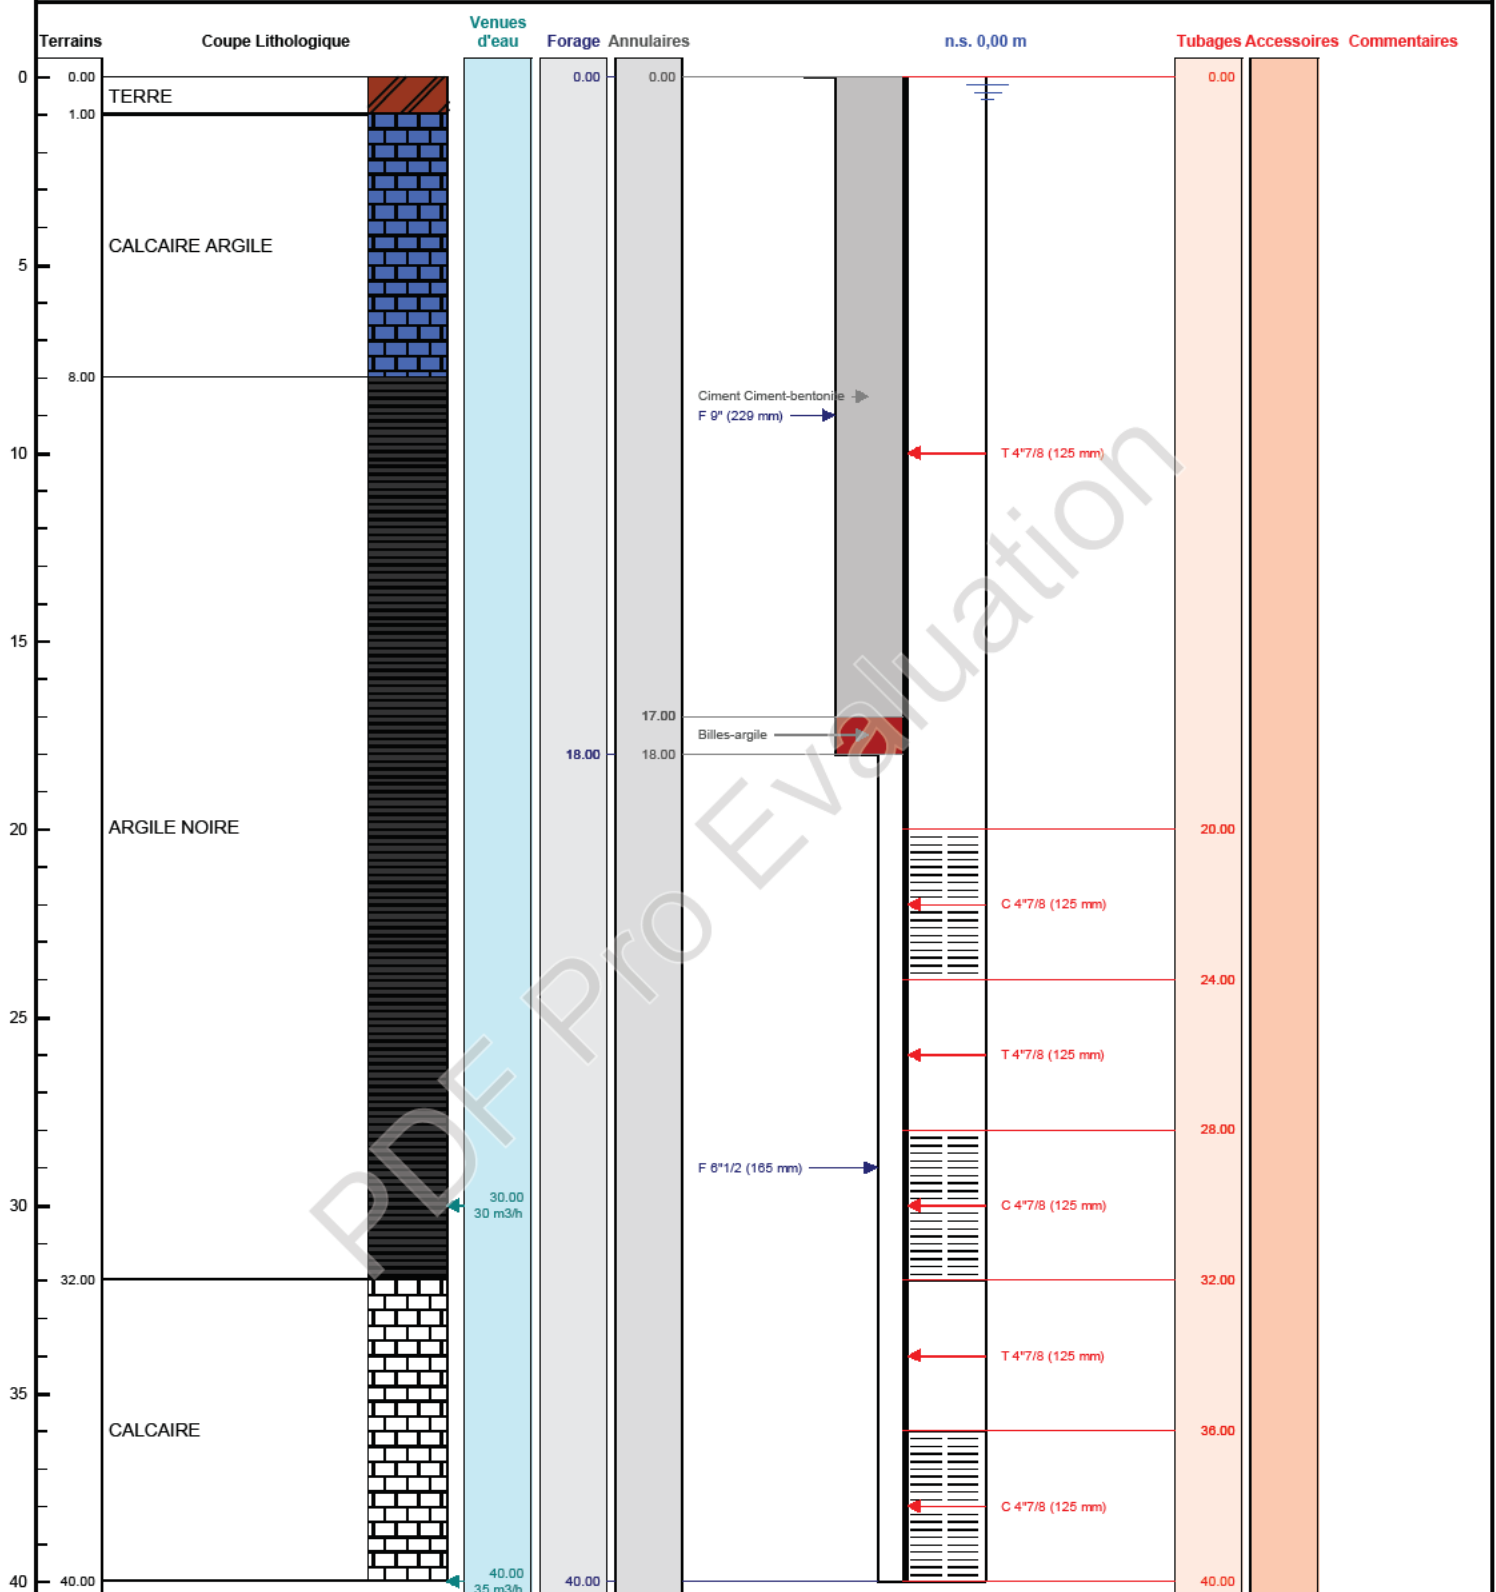

Le ..... à .....  
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE  
Tampon et signature du chef d'entreprise
