

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU

Entreprise:

Client:

Maître d'oeuvre: **HYDRO GEOLOGUES CONSEIL**

37260 MONTS

Exploitant:

37260 MONTS

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

---

**Lieu de l'ouvrage :**

91720 GIRONVILLE SUR ESSONNE

**Coordonnées :**      **Longitude**      0      **Latitude**      0      **Altitude :**      0.00    m  
**Zone**    Lambert 1 carto métrique

**Nombre de forages :**    1

---

**Date début de l'ouvrage :**      01/01/2020

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :**      01/01/2020

**Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :**

**Resp. Chantier :**

---

**Date début pompage :**      **Niveau statique non perturbé :**      72.00    m

**Date fin de pompage :**      **Débit Maxi. d'essai :**      0.00    m3/h

**Nombre de nappes identifiées :**      **Rabattement correspondant :**      0.00    m

---

**Notes :**

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	25.00	Calcaire Blanc
25.00	50.50	Calcaire blanc compact
50.50	52.00	Grès
52.00	95.00	Sable
95.00	97.00	Argile jaunatre
97.00	99.00	Grès
99.00	109.00	Calcaire blanc fissuré

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
97.00	109.00	10"	254.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	52.00	20"	508.00	0.00		Acier-api	Tube-plein		
0.00	81.00	15"3/4	400.00	0.00		Acier-api	Tube-plein		
70.00	88.00	14"	355.00	0.00		Acier-api	Tube-plein		
80.40	97.00	12"3/4	323.00	0.00		Acier-api	Tube-plein		
95.00	109.00	6"1/4	160.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	52.00	15"3/4	400.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			
95.50	109.00	6"1/4	160.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Concasse		

# FORAGE D'EAU

Client :  
Maitre d'oeuvre :  
Localisation de l'ouvrag


Travaux réalisés : 1\1  
du : 01/01/2020 au : 01/01/2020

Coordonnées de l'ouvrage :  
Lambert 1 carto métrique  
Longitude (X): 0  
Latitude (Y): 0  
Altitude sol (Z): +0.000 m

Echelle : 1/548

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

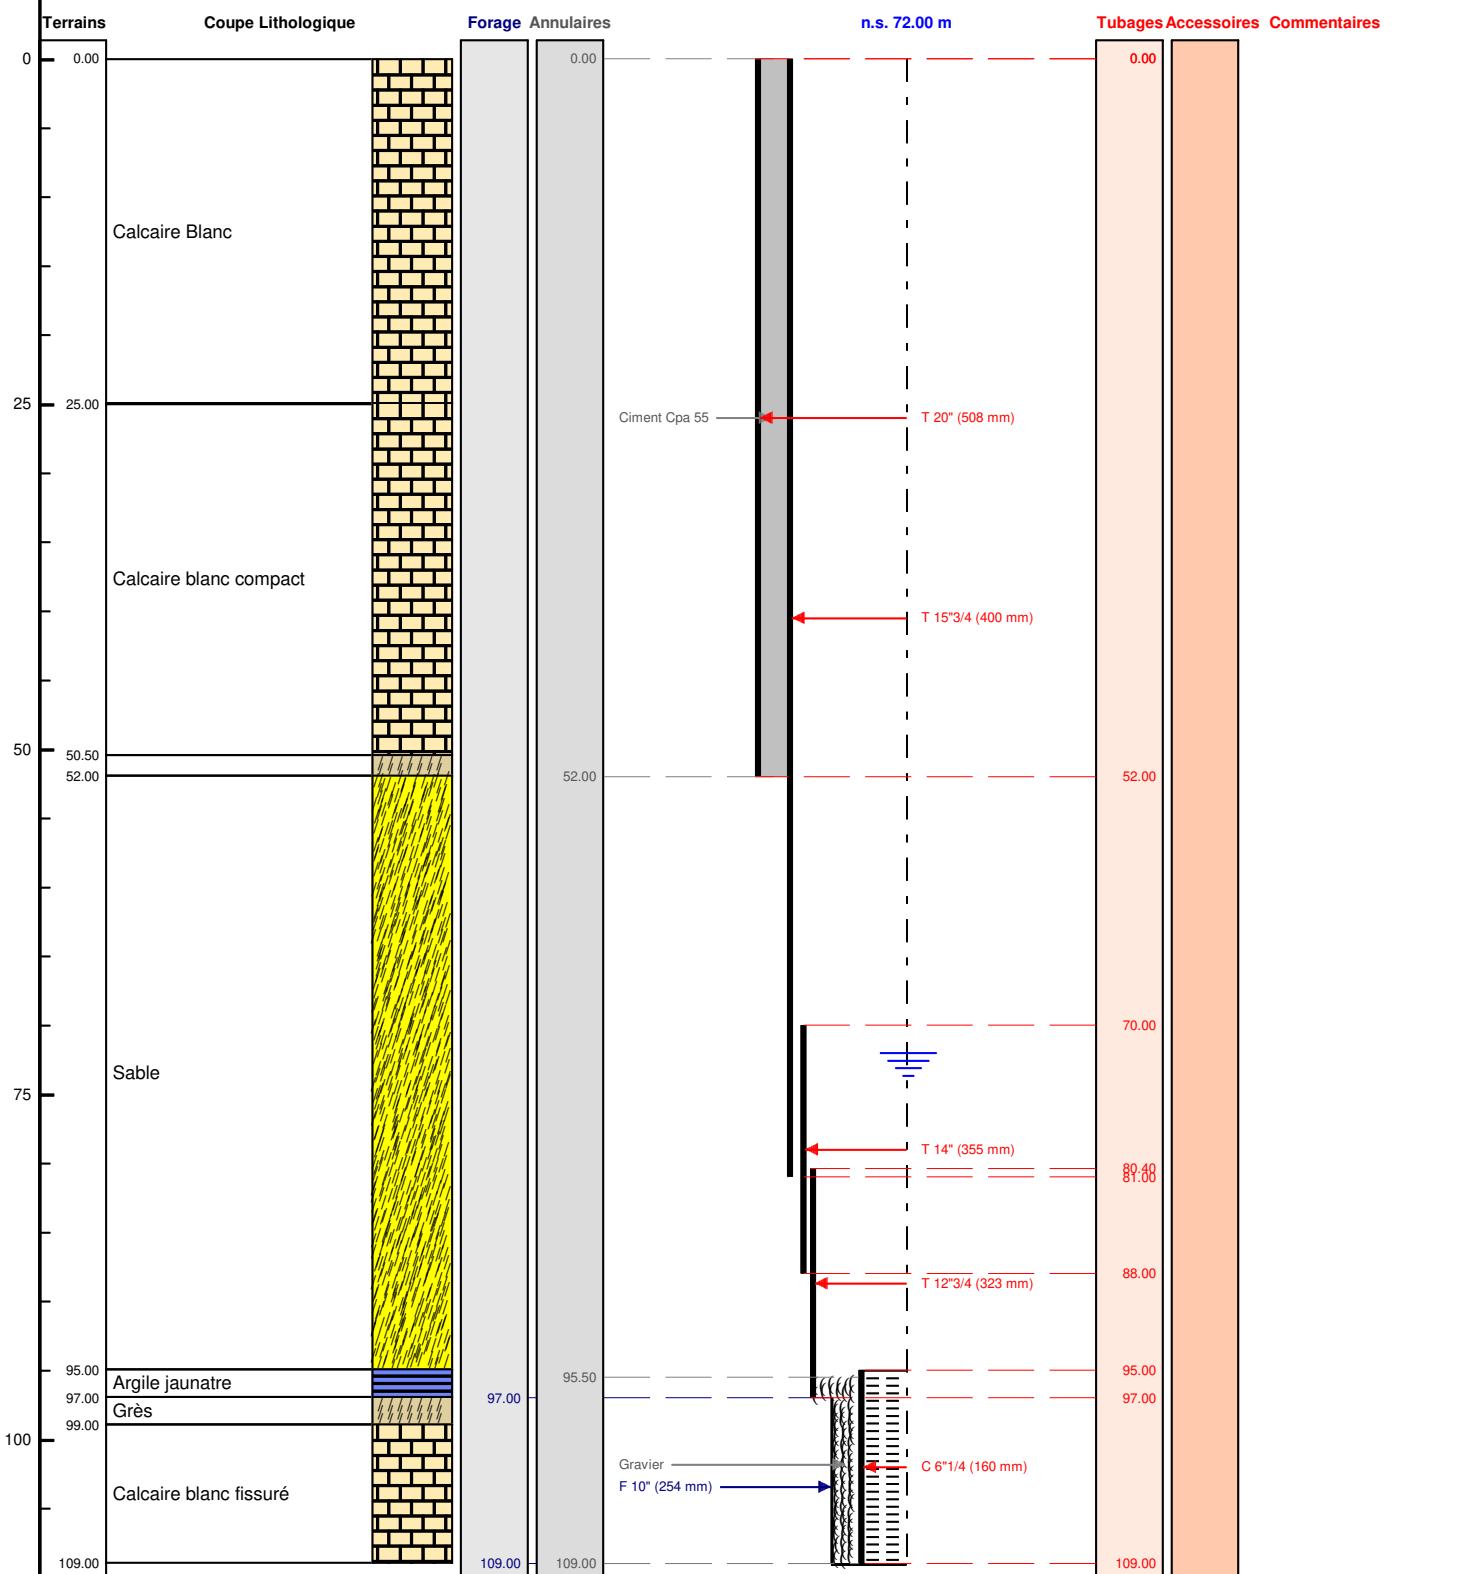

Le ...../...../..... à .....  
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE  
Tampon et signature du chef d'entreprise
