

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

| | |
|------------------|--------------------|
| Entreprise: | NORMANDIE FORAGE . |
| Client: | |
| Maître d'oeuvre: | |
| Exploitant: | |

Code National BSS : BSS006E11Wk1X

N° Déclaration ** : 11764

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : LA BOSCHERIE

61430 STE HONORINE LA CHARDONNE

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 0.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 14/09/2022

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 15/09/2022

Resp. M. Oeuvre :

Machine : ECOFORE

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 1.50 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 4.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes : FORAGE DE REJET

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : LA BOSCHERIE

61430 STE HONORINE LA CHARDONNE

LITHOLOGIE

| De | à | Libellé |
|-------|-------|-------------------------------|
| 0.00 | 1.00 | TERRE + CAILLOUX |
| 1.00 | 21.00 | ARGILE MARRON, JAUNE |
| 21.00 | 27.00 | GRANITE JAUNE - MARRON - GRIS |

FORAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Mode de forage | Fluide de forage |
|-------|-------|-------|--------|----------------|------------------|
| 0.00 | 10.00 | 8"7/8 | 225.00 | M.f.t. | Air |
| 10.00 | 27.00 | 6"1/2 | 165.00 | M.f.t. | Air |

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

| Profondeur (m) | Débit (m3/heure) |
|----------------|------------------|
| 15.00 | 1.00 |

TUBAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Epais. | Ecra. | Nature du tubage | Type | Slot | Vide % |
|-------|-------|-------|--------|--------|-------|------------------|----------------|------|--------|
| 0.00 | 11.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00 | | P.v.c. | Tube-plein | | 50 |
| 11.00 | 23.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00 | | P.v.c. | Crepine fentes | | |
| 23.00 | 27.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00 | | P.v.c. | Tube-plein | | |

REMPLISSAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Matériau | Nature | Méthode de pose | Texture | Gra. (mm) | Vol. m3 |
|------|-------|-------|--------|----------|--------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 0.00 | 10.00 | 4"7/8 | 125.00 | Ciment | Clk | Sous pression | | | |

FORAGE D'EAU

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage : LA BOSCHERIE

61430 STE HONORINE LA CHARDONNE

Travaux réalisés :

du : 14/09/2022 au : 15/09/2022

11

1

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique

Longitude (X):

0

Latitude (Y):

0

Altitude sol (Z):


+0,000 m

Echelle : 1/136

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages :

1

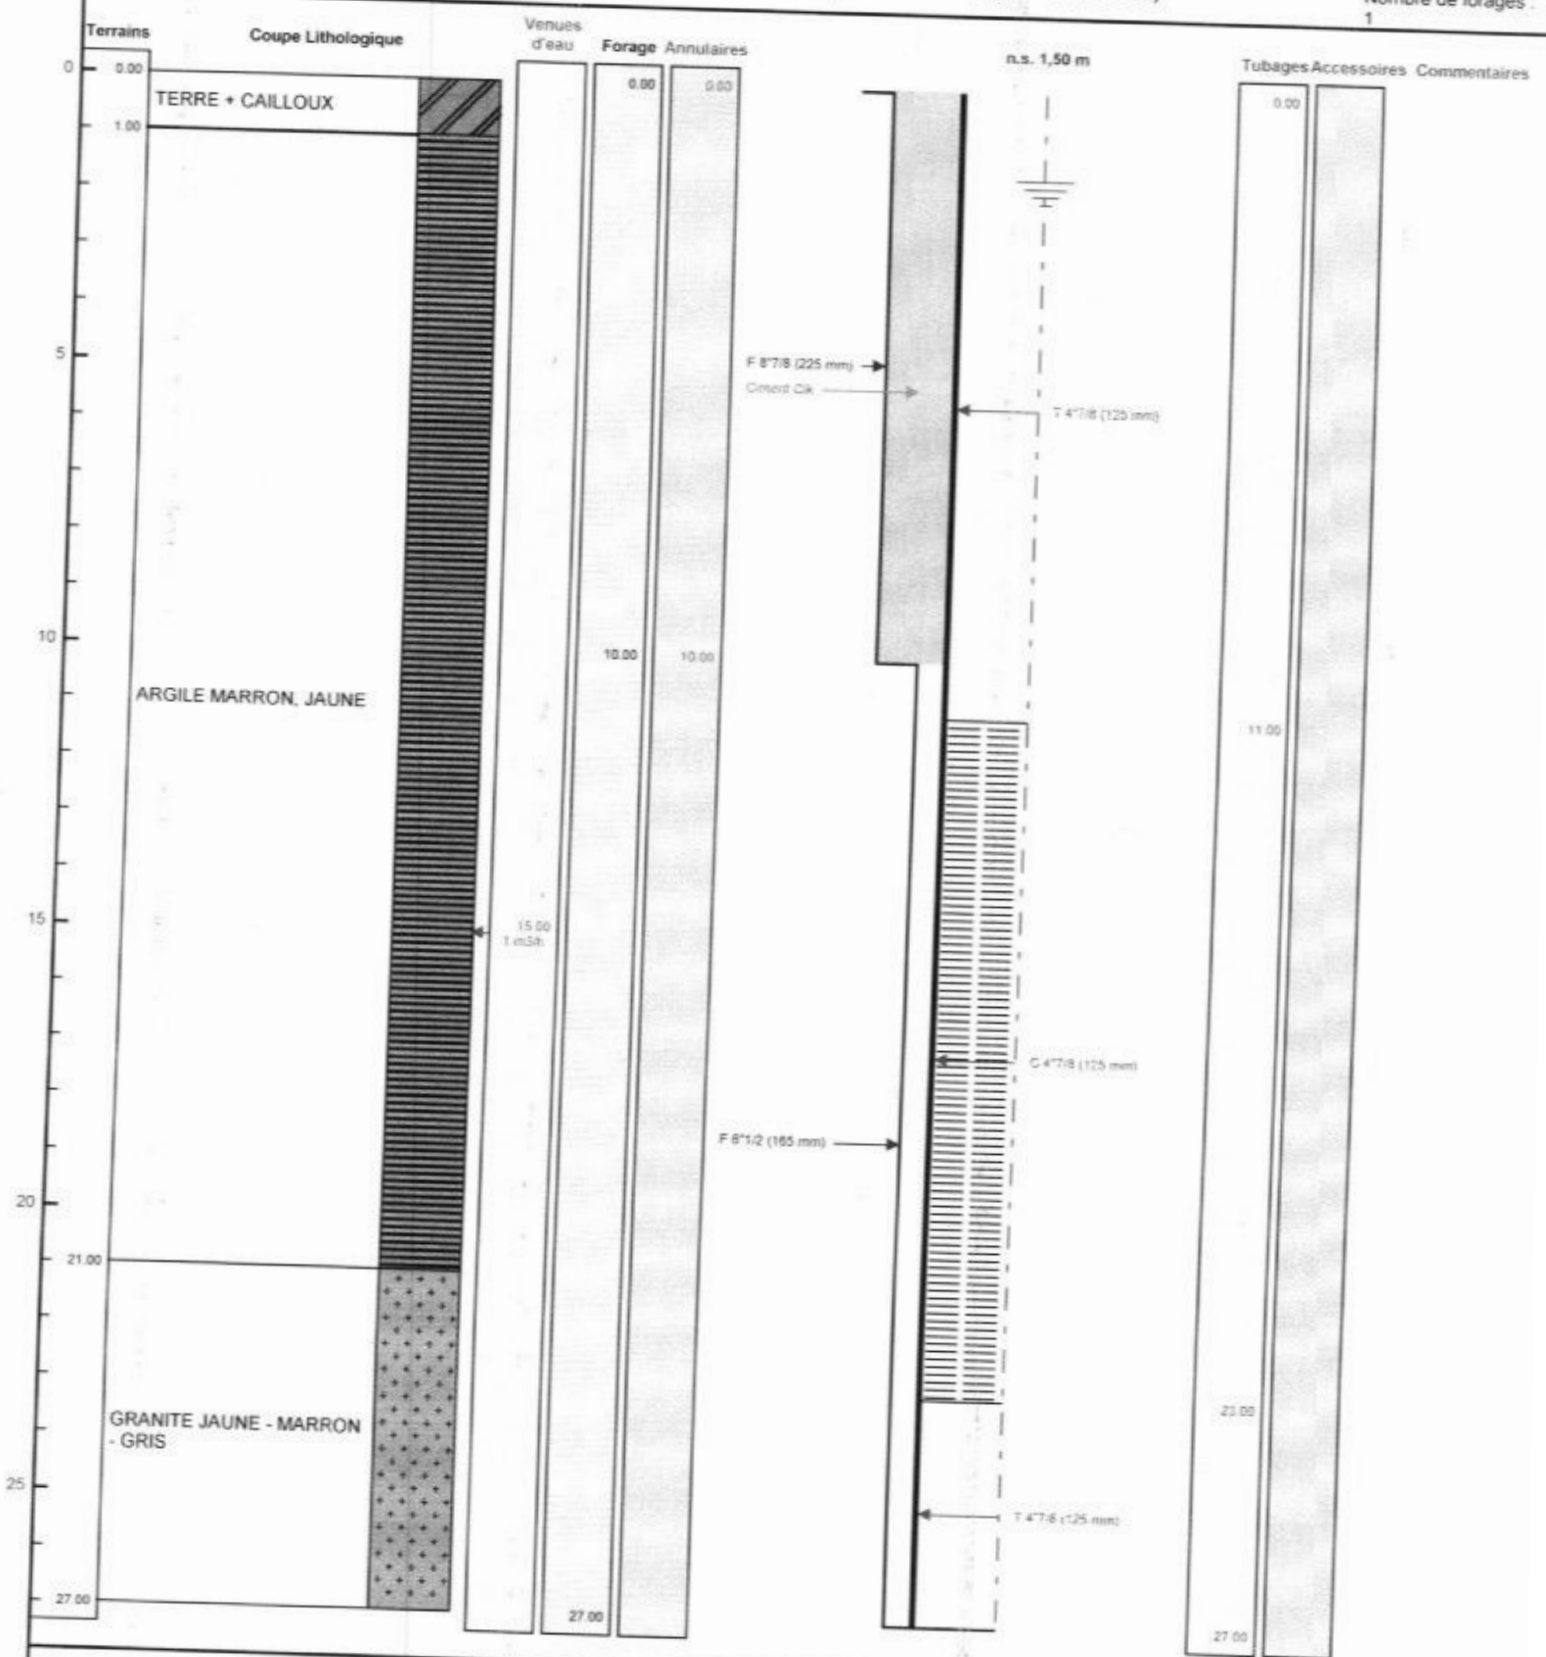

Le 03/10/2022 à Versen

CERTIFIE CONFORME

Tampon et signature du

Lambert 1 carto m

Normaliser@wanadoo.fr

N° Siren 420 697 708 00022

Alt.: +0,000 m

PAGE: 3
