

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise: **BOURGEOIS FORAGE**

Client: **MAIRIE DE MARSON**
4 RUE DE LA MAIRIE1
51240 MARSON

Maître d'oeuvre: **MAIRIE DE MARSON**
4 RUE DE LA MAIRIE1
51240 MARSON

Exploitant: **MAIRIE DE MARSON**
4 RUE DE LA MAIRIE1
51240 MARSON

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 14 RUE D ELA MAIRIE
51240 MARSON

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 0.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 08/09/2022

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 08/09/2022

Resp. M. Oeuvre :

Machine : STENUICK 440

Resp. Chantier :

Date début pompage : Niveau statique non perturbé : 14.45 m

Date fin de pompage : Débit Maxi. d'essai : 5.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : Rabattement correspondant : 0.33 m

Notes : REALISATION D'UN FORAGE DE POMPAGE DE 31 METRES

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client: MAIRIE DE MARSON
 Maître d'oeuvre: MAIRIE DE MARSON
 Lieu de l'ouvrage : 14 RUE D ELA MAIRIE
 51240 MARSON

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.20	TERRE VEGETALE
0.20	31.00	CRAIE BLANCHE

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	31.00	8"	203.00	Rotary	Eau-claire

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	16.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
16.00	31.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes	1.00	

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.70	6.00	4"7/8	125.00	Ciment	Coulis	Injection par canne			0.10
6.00	7.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Oregonite				0.02
7.00	31.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	4.00-8.00	0.48

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
0.00	0.00	Capot
31.00	31.00	Bouchon

FORAGE D'EAU

Client : MAIRIE DE MARSON
Maitre d'oeuvre : MAIRIE DE MARSON
Localisation de l'ouvrage : 14 RUE D ELA MAIRIE
51240 MARSON


Travaux réalisés : 1/1
du : 08/09/2022 au : 08/09/2022

Coordonnées de l'ouvrage :
Lambert 1 carto métrique
Longitude (X): 0
Latitude (Y): 0
Altitude sol (Z): +0,000 m

Echelle : 1/156

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

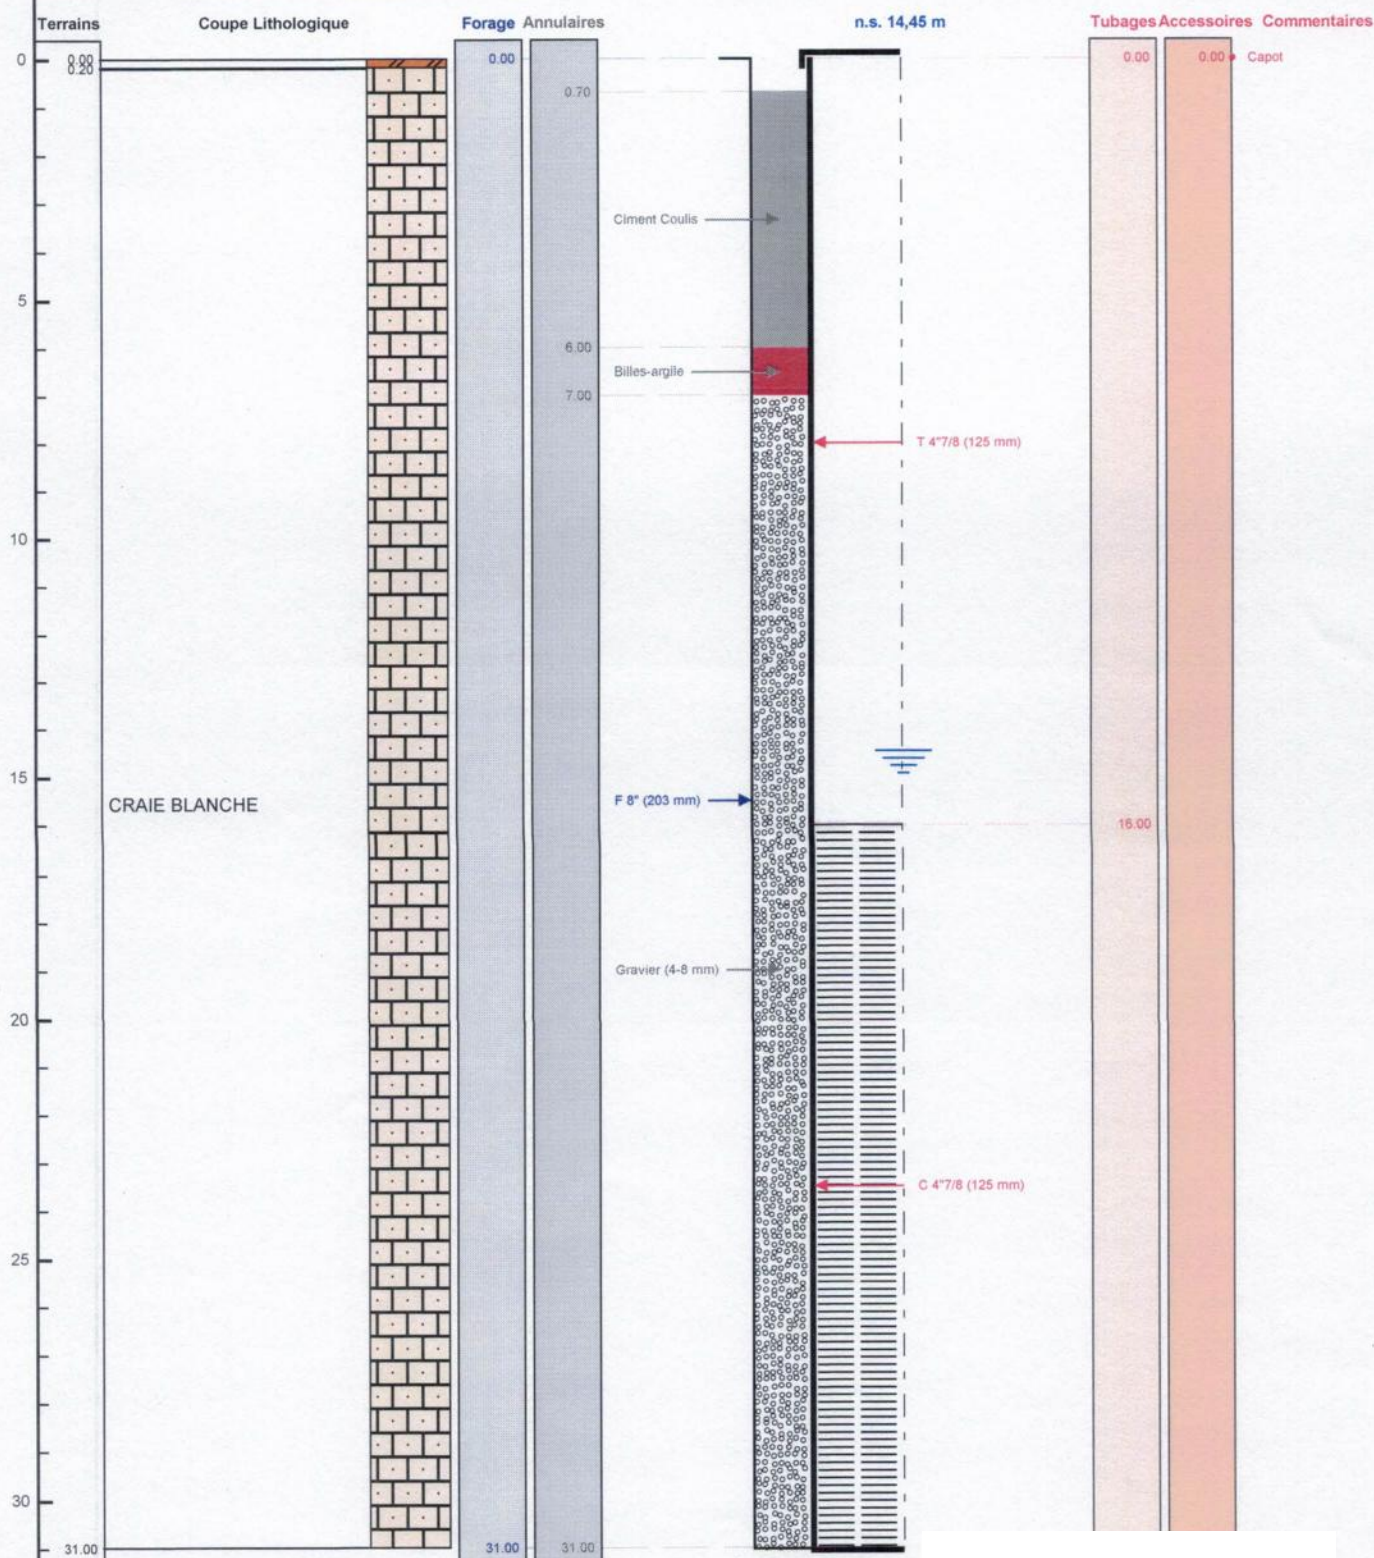

Le 15.09.2022 à ...
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise

Lambert 1 carto métrique Long.: 0 Lat.: 0

GE: 3
