

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU N°1 REJET

Entreprise: **SARL BREBANT FORAGE**

Client:

Maître d'oeuvre: **BREBANT FORAGE**
ZA 8 RUE DU COURTIL
50510 CERENCES

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Chemin de Bois
50000 ST LO

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 **Altitude :** 0.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 11/04/2022

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 11/04/2022

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Stenuick

Resp. Chantier :

Date début pompage : **Niveau statique non perturbé :** 2.32 m

Date fin de pompage : **Débit Maxi. d'essai :** 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : **Rabattement correspondant :** 0.00 m

Notes : NIVEAU STATIQUE DE REJET 2.32 METRE
NIVEAU D EAU A L INJECTION 1.39 METRE

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU N°1 REJET

Client:			
Maître d'oeuvre:	BREBANT FORAGE		
Lieu de l'ouvrage :	Chemin de Bois		
	50000	ST LO	

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	10.00	SCHISTE MARRON
10.00	31.00	SCHISTE BLEU

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
10.00	31.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
22.00	1.00
25.00	18.00
31.00	20.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	15.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
15.00	23.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes		
23.00	27.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
27.00	31.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes		


REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	9.00	4"7/8	125.00	Ciment	Ciment-bentonite	Sous pression			
9.00	10.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactonite				

Client : Maitre d'oeuvre : Localisation de l'ouvrage :	FORAGE D'EAU N°1 REJET		Travaux réalisés : du : 11/04/2022 au : 11/04/2022		111
			Coordonnées de l'ouvrage :		
			Lambert 1 carto métrique		
			Longitude (X):		0
			Latitude (Y):		0
	50000	ST LO	Altitude sol (Z):		+0,000 m

+0,000 m

Nombre de forages : 1

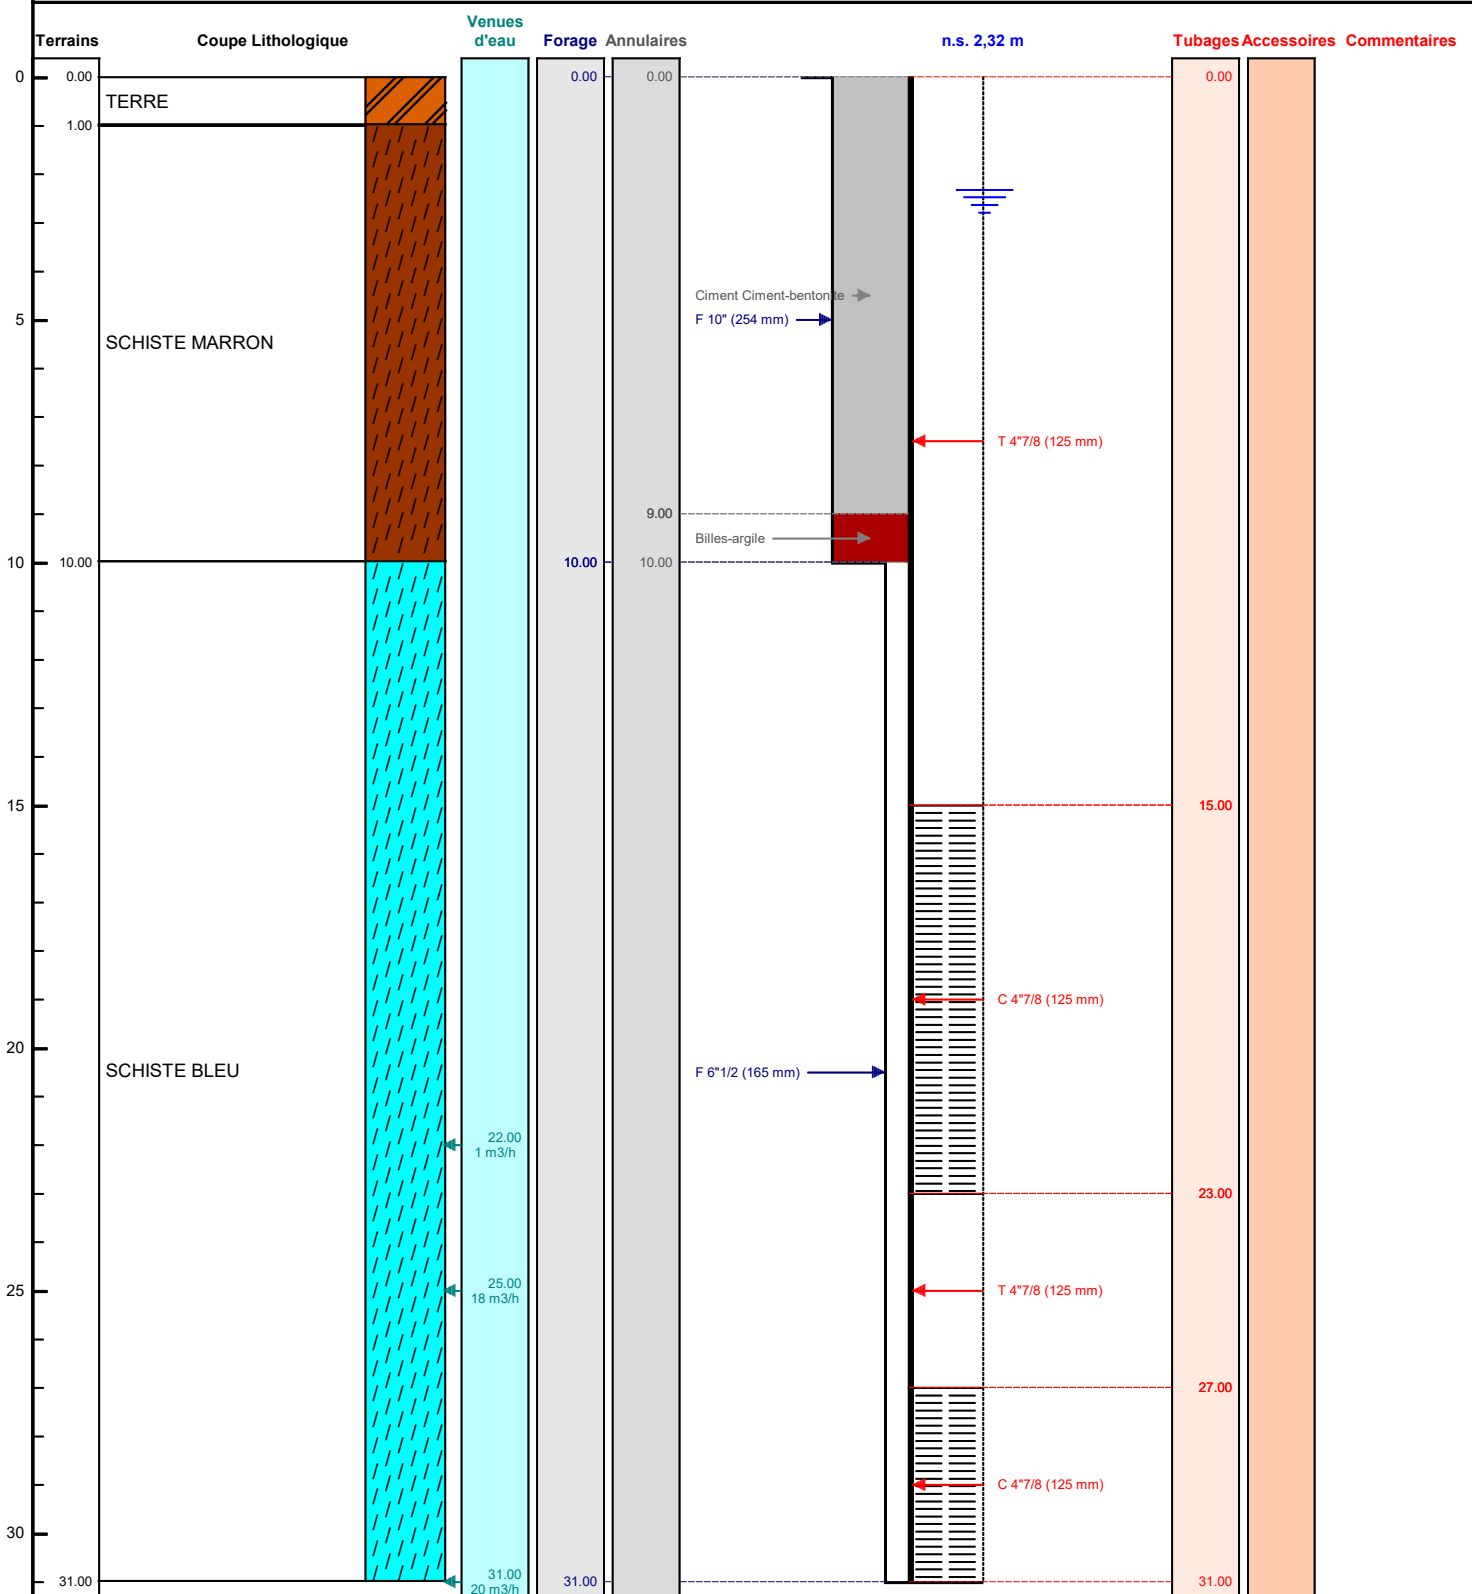

Tampon et signature du chef d'entreprise
