


# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU REJET



Code National BSS :

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** 25 Rue la trainerie  
14500 VIRE

**Coordonnées :**      **Longitude**      0      **Latitude**      0      **Altitude :**      0.00    m  
**Zone**    Lambert 1 carto métrique

**Nombre de forages :** 1

<b><u>Date début de l'ouvrage :</u></b>	02/03/2021	<b><u>Resp. M. Ouvrage :</u></b>	WALEFFE
<b><u>Date fin de l'ouvrage :</u></b>	02/03/2021	<b><u>Resp. M. Oeuvre :</u></b>	CHRISTOPHE PRUDENCE
<b><u>Machine :</u></b>	Stenuick	<b><u>Resp. Chantier :</u></b>	PRUDENCE

<b><u>Date début pompage :</u></b>		<b><u>Niveau statique non perturbé :</u></b>	2.00    m
<b><u>Date fin de pompage :</u></b>		<b><u>Débit Maxi. d'essai :</u></b>	0.00    m3/h
<b><u>Nombre de nappes identifiées :</u></b>		<b><u>Rabattement correspondant :</u></b>	0.00    m

**Notes :**

<div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div>	<div> <div></div> <div></div> </div>
<div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> </div>
<div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> </div>
<div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> </div>

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	3.00	GRANITE ALTERE
3.00	8.00	SCHISTE BLEU MARRON
8.00	30.00	SCHISTE BLEU
30.00	49.00	GRANITE BLEU

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
10.00	49.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
17.00	5.00
34.00	16.00
49.00	5.50

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	13.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
13.00	17.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes		
17.00	25.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
25.00	29.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes		
29.00	37.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
37.00	41.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes		
41.00	45.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
45.00	49.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes		

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	9.00	4"7/8	125.00	Ciment	Ciment-bentonite	Sous pression			

REPLISSAGE (suite)


De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
9.00	10.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactonite				

FORAGE D'EAU REJET		Travaux réalisés : 1/1 du : 02/03/2021 au : 02/03/2021
		<b>Coordonnées de l'ouvrage :</b> Lambert 1 carto métrique Longitude (X): 0 Latitude (Y): 0 Altitude sol (Z): +0,000 m

1\1

+0,000 m

Nombre de forages : 1

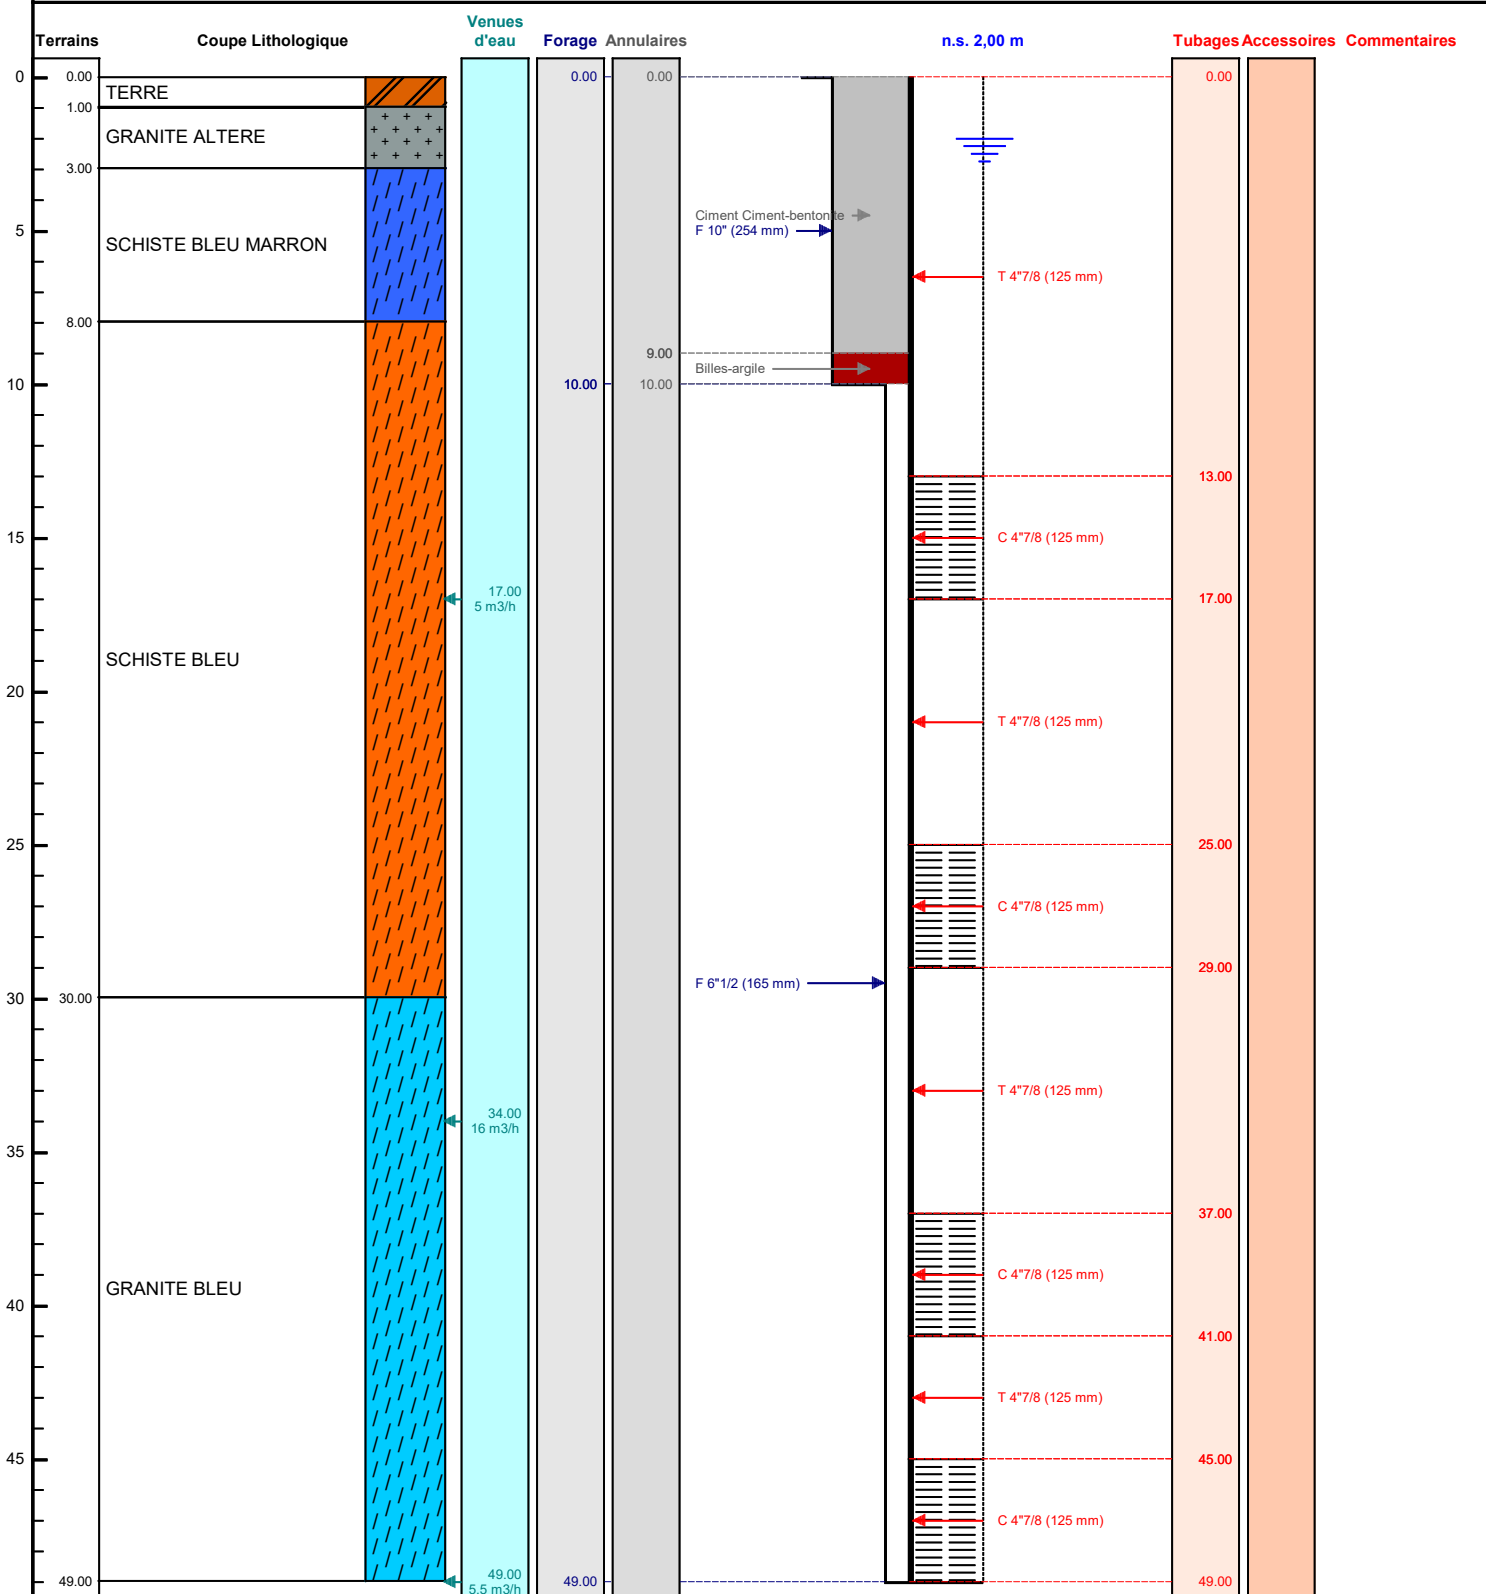

PAGE: 4
