


DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

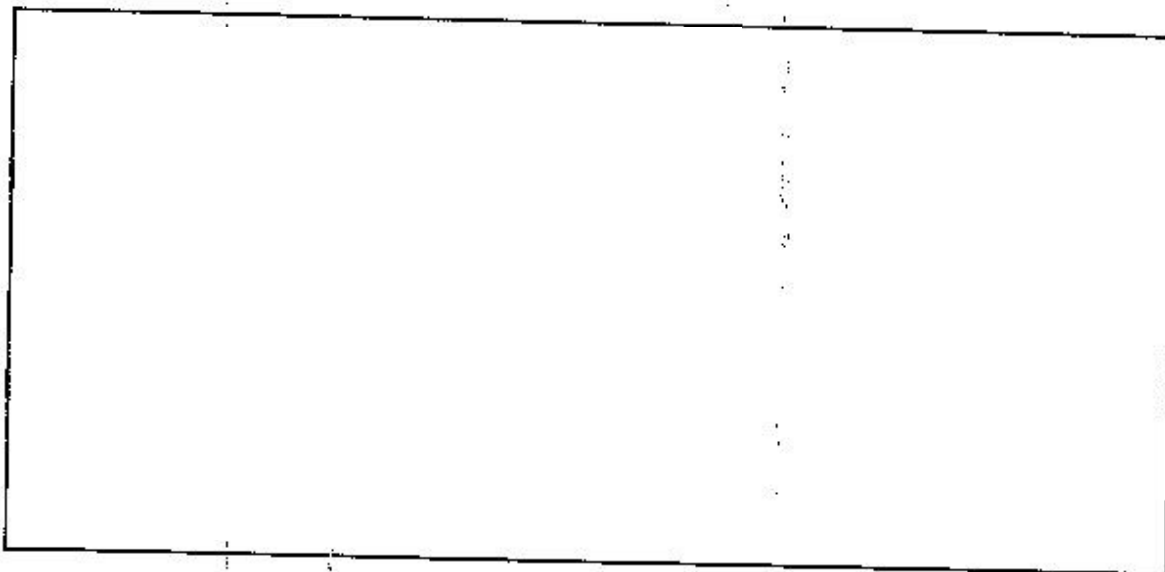

Code National BSS : BSS004EYYS/X

N° Déclaration ** : 11946

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 2155 RUE DU MOULIN
27450 ST GEORGES DU VIEVRE

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 0.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 30/11/2022

Resp. M. Ouvrage : PAUQUET

Date fin de l'ouvrage : 01/12/2022

Resp. M. Oeuvre : GAUTIER

Machine : ECOFORE

Resp. Chantier : GODEY

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 31.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 5.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes : FORAGE DE PRELEVEMENT (identification 61302)

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRÉ
1.00	3.00	ARGILE MARRON CLAIRE
3.00	9.00	ARGILE PLASTIQUE BLANCHE + SABLE
9.00	30.00	CALCAIRE BLANC GRIS + SILEX + SABLE VERT
30.00	39.00	CALCAIRE GRIS + SABLE NOIR

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	8"7/8	225.00	M.f.t.	Air
10.00	39.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
32.00	4.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	27.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
27.00	35.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
35.00	39.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		50

REPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	10.00	4"7/8	125.00	Ciment	Clk	Sous pression			
20.00	39.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de Loire	Gravitaire	Roule		

FORAGE D'EAU


Travaux réalisés :
du : 30/11/2022 à : 01/12/2022

Coordonnées de l'ouvrage
Lambert 1 carte métrique
Longitude (X): 0
Latitude (Y): 0
Altitude sol (Z): +0.000 m

L'Espresso : 1/196

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages :

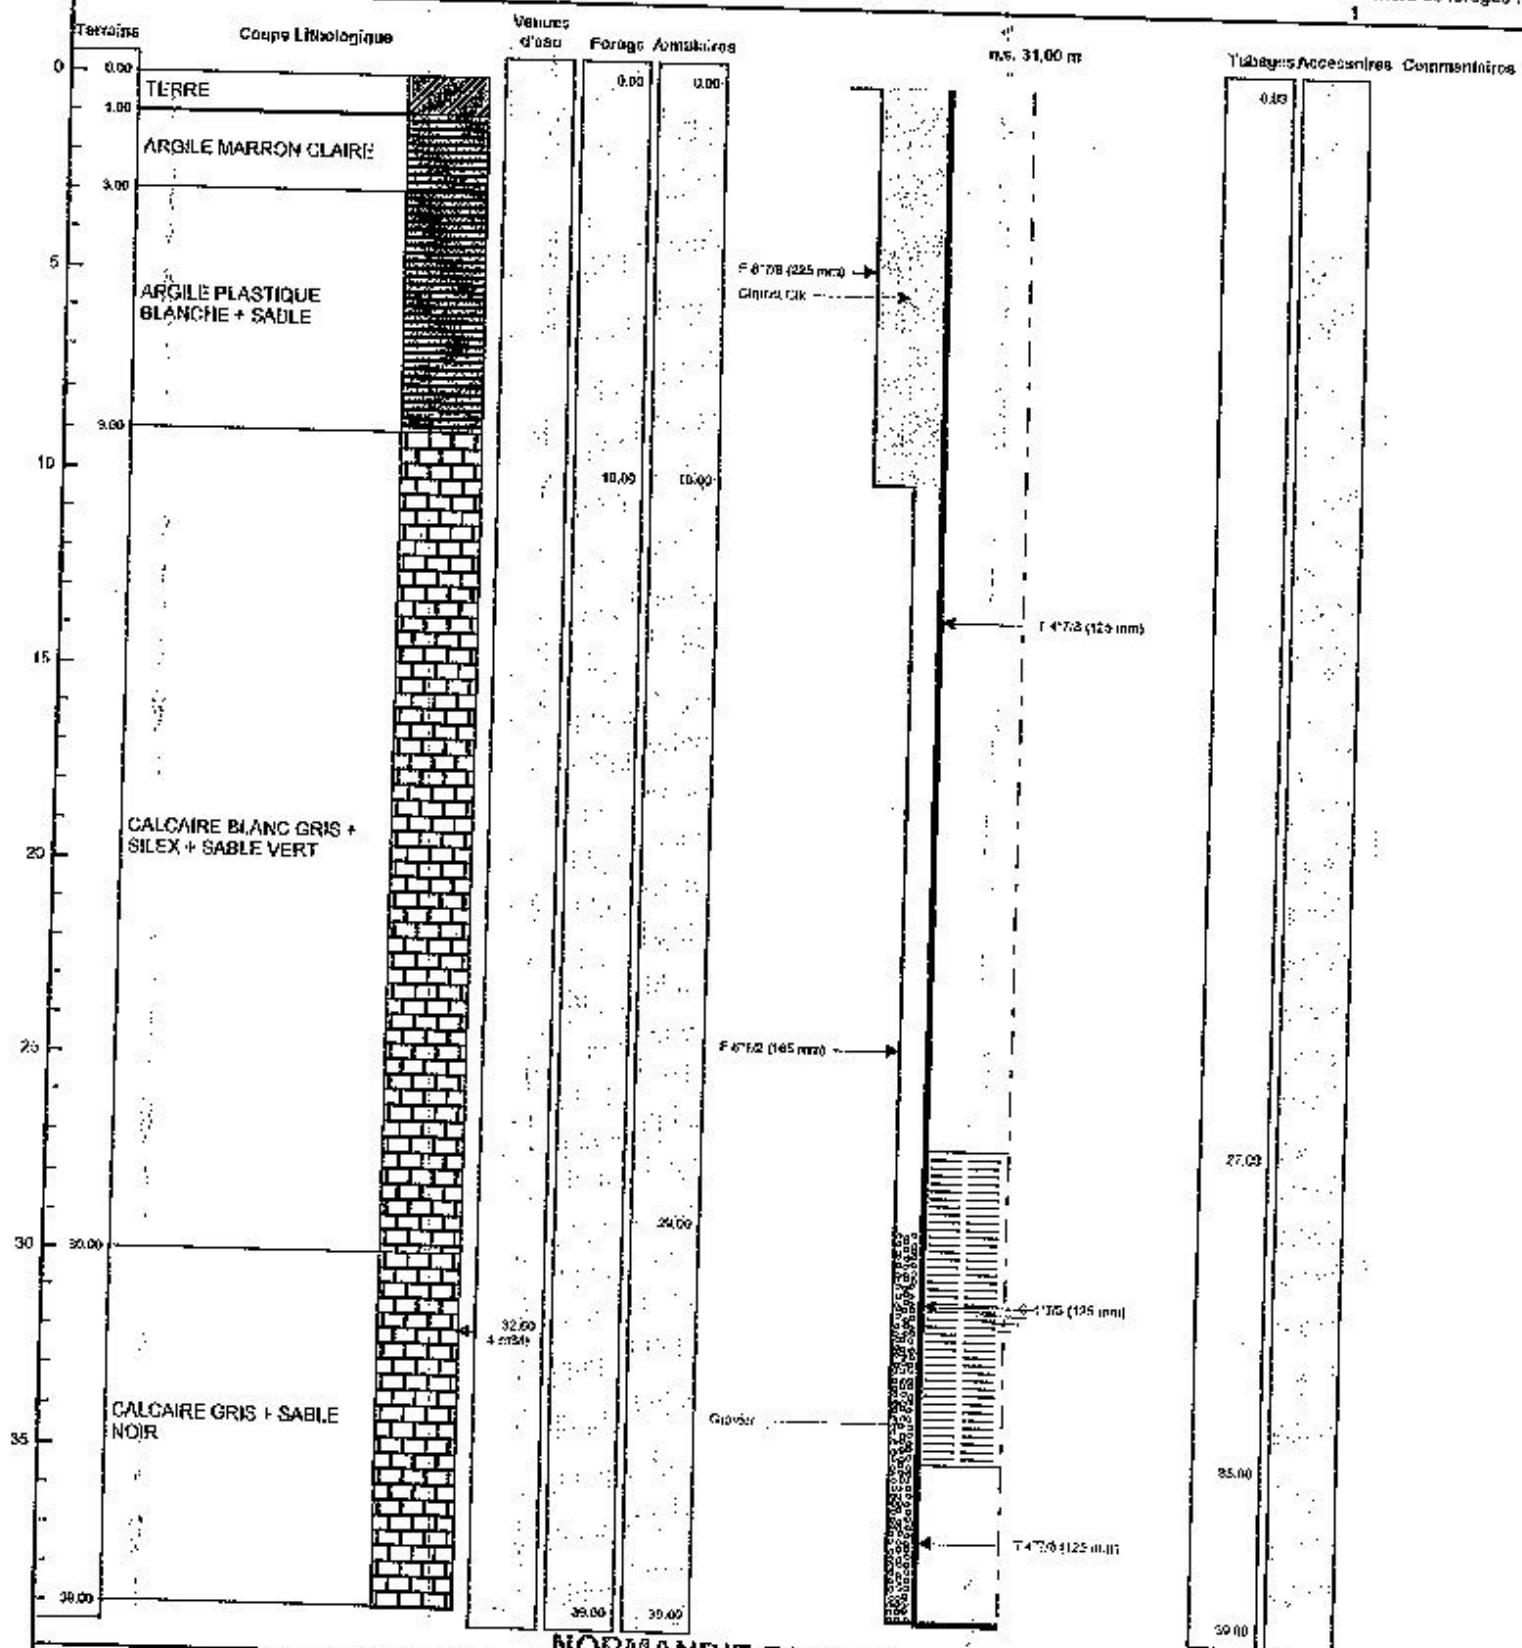

NORMANDIE STORAGE

Le 06.12.2022 25/05/2023
CERTIFIE CONFORME A L'ORDRE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise 06.15.05.68.74
normal (le) gonges (wan) doo (i)

Lambert 1 carto métrique
