

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise: HYDRO GEO SERVICES

Client:

Maître d'oeuvre: SUD FORAGES

Code National BSS :

N° Déclaration :

Lieu de l'ouvrage : Haut Bridau

34120 CASTELNAU DE GUERS

Coordonnées : X 694 758 Y 1 827 211 Altitude : 79.00 m

Zone Lambert 2 étendu métrique

Date début de l'ouvrage : 07/06/1998

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 10/06/1998

Resp. M. Oeuvre :

Machine :

Responsable Chantier :

Date début pompage : 27/12/2020

Profondeur hydrostatique/sol : 62.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 3.00 m3/h

Rabattement correspondant : 2.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

SUD FORAGES

Lieu de l'ouvrage :

Haut Bridau

34120

CASTELNAU DE GUERS

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	35.00	Alternance marno-calcaire blanc
35.00	40.00	Marne rougeâtre
40.00	70.00	Alternance marno calcaire et grés
70.00	83.00	Alternance marno calcaire à grés fracturé aquifère

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	1.50	10"	254.00	M.F.T.	AIR
1.50	83.00	6"3/4	170.00	M.F.T.	AIR

TUBAGE


De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature matériau	Type	Slot	Vide %
-0.80	1.50	8"5/8	219.10	0.00		ACIER-API	TUBE-PLEIN		
0.50	70.00	4"7/8	125.00	6.00		P.V.C.	TUBE-PLEIN		
70.00	82.00	4"7/8	125.00	6.00		P.V.C.	ANNEAUX-PLASTIQUES	1.00	

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	1.50	8"5/8	219.10	CIMENT	Autre	Gravitaire	Roule		
0.50	83.00	4"7/8	125.00	GRAVIER	Graviers de Silacq	Gravitaire	Roule		

		FORAGE D'EAU		Travaux réalisés : du : 07/06/1998 au : 10/06/1998	
Client :				Coordonnées de l'ouvrage :	
Maitre d'oeuvre :		SUD FORAGES		Lambert 2 étendu métrique	
Localisation de l'ouvrage :		Haut Bridau		X: 694 758	
34120		CASTELNAU DE GUERS		Y: 1 827 211	
				Z altitude sol: +79,000 m	

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

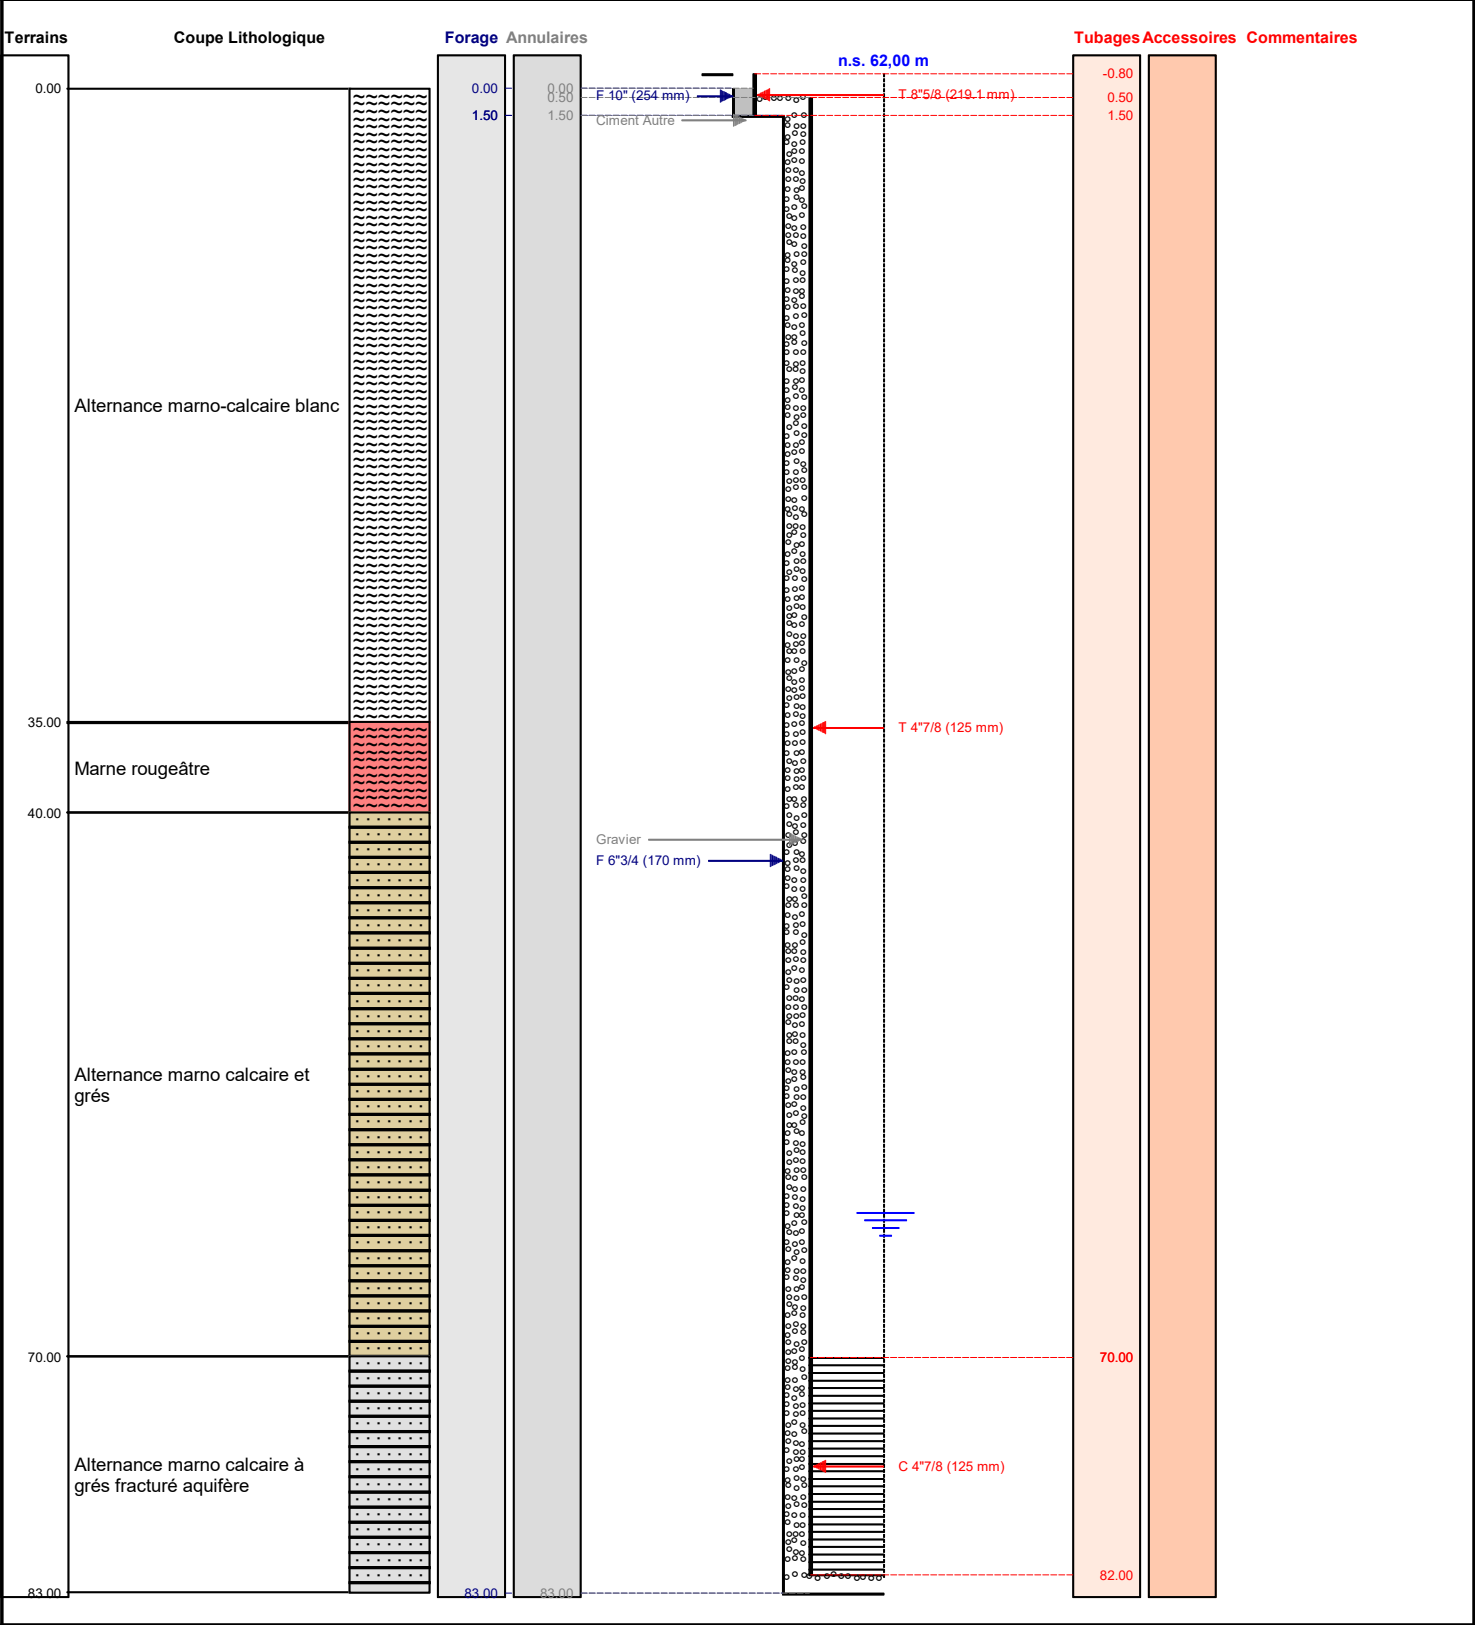

Le/...../..... à
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise
