



S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-51.com

BSS004GCCW

TRAVAUX DE FORAGE POUR RECHERCHE D'EAU EN VUE D'UN PROJET D'IRRIGATION

à

Lachy (51)

SCEA DES CHARPENTIER

Forage certifié conforme
aux documents du rapport :

S.A.R.L. BONIFACE
Forages d'Eau
5, rue Pierre Boileau
51420 WITRY LES REIMS
Tél. 03 26 97 11 61 - Fax. 03 26 97 21 75
SIRET: 330 588 278 00029 - APE: 4399 D

**TRAVAUX REALISES
DU
7 au 10 Décembre 2022**

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	SCEA Des Charpentiers, 51120 Lachy	
Date :	07/12/2022	n° DREAL : 297635 - BSS004GCCW
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage de reconnaissance	
Lieu du chantier :	Lachy Lieu dit "Le Sauvageon" / "Les Olivats"	

TERRAIN

[illegible]**FORAGE**

Profondeur finale :	19,00
----------------------------	--------------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	7,60	380	Tarière	à sec
7,60	21,00	254	MFT	Air

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
-0,30	7,60	273	273/265	Acier E24.2		x
-0,50	8,00	180	180/163	pvc		x
8,00	19,00	180	Provisoire	pvc	x 1 mm	

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	SCEA Des Charpentiers, 51120 Lachy	
Date :	07/12/2022	n° DREAL : 55 - BSS004GCCW
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage de reconnaissance	
Lieu du chantier :	Lachy Lieu dit "Le Sauvageon" / "Les Olivats"	

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	7,60	CPJ45	x		380	273

POMPAGE	NS (m) :	9,6	Côte / Sol (m) :	-0,5	Pompe :	SP60-8
----------------	----------	-----	------------------	------	---------	--------

ND (m)	Q (m3)	Temps
16,50	9,10	0h20
Acidification :		tonne(s)
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps


ND (m)	Q (m3)	Temps
16,50	9,10	0h20
Débit spécifiques		
Q' =	1,32	m ³ / h / m
Coordonnées :		
- X : 48° 46' 06.36" N		
- Y : 03° 41' 35.99" E		
- Z : 196 m		
Observations :		
Étant très éloigné des objectifs recherchés pour l'irrigation, ce site sera abandonné. Le forage sera rebouché dans les règles de l'art.		

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	SCEA Des Charpentiers, 51120 Lachy	
Date :	07/12/2022	n° DREAL : 297635 - BSS004GCCW
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage de reconnaissance	
Lieu du chantier :	Lachy Lieu dit "Le Sauvageon" / "Les Olivats"	

Echelle	Coupe géologique et technique	Forage réalisé du
---------	-------------------------------	-------------------

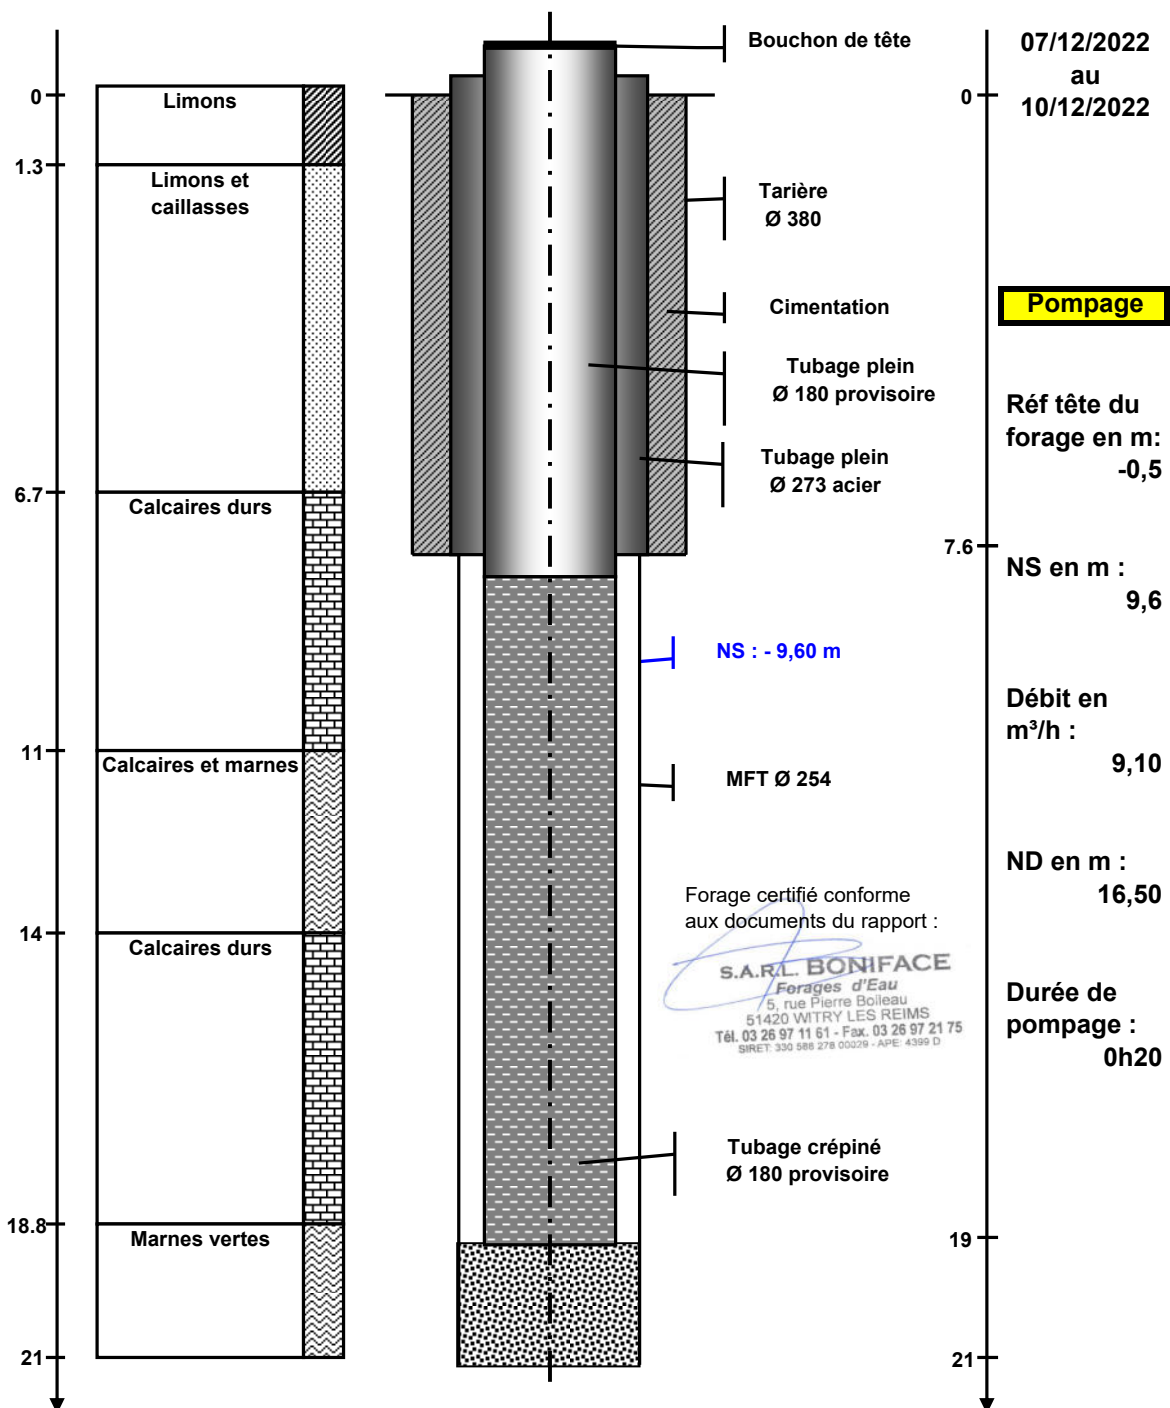

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	SCEA Des Charpentiers, 51120 Lachy	
Date :	14/12/2022	n° DREAL : 297635 - BSS004GCCW
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Abandon forage de reconnaissance	COMBLEMENT
Lieu du chantier :	Lachy Lieu dit "Le Sauvageon" / "Les Olivats"	

Echelle	Coupe géologique et technique	Comblement réalisé du
---------	-------------------------------	-----------------------

