


DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

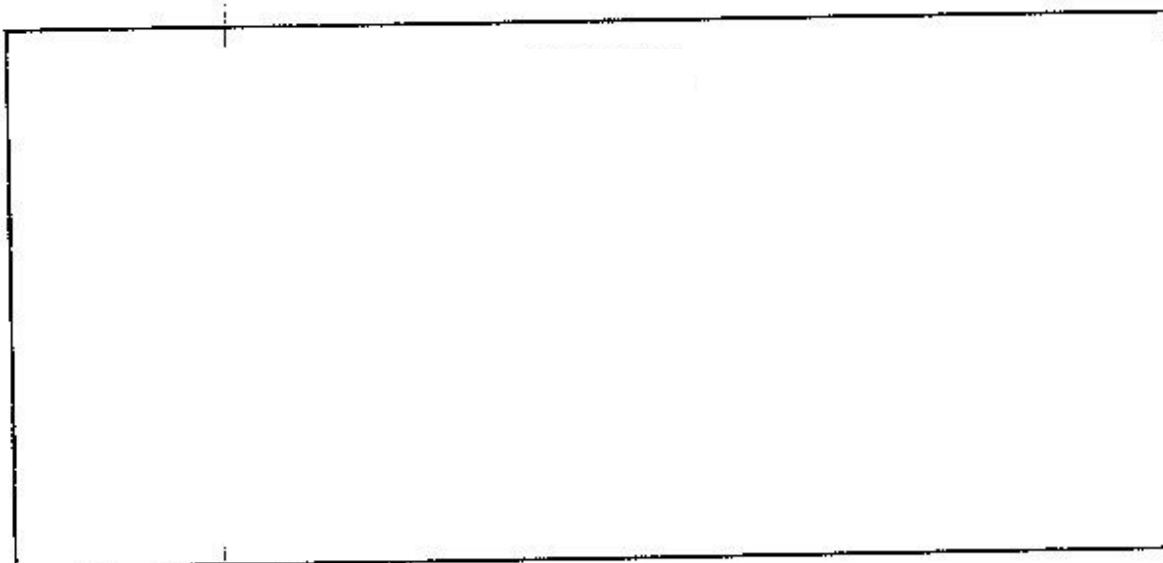

Code National BSS :

N° Déclaration ** : 46830

Police de l'eau * : 14-2020-00180

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : CHEMIN DU CHATEAU

14340 FORMENTIN

Coordonnées :

Longitude 0

Latitude 0

Altitude : 141.00 m

Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 27/04/2021

Resp. M. Ouvrage : BOURG

Date fin de l'ouvrage : 27/04/2021

Resp. M. Oeuvre : GAUTIER

Machine : ECOFORE

Resp. Chantier : GODEY

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 30.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 4.00 m³/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 45.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

--

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE + ARGILE ORANGE
1.00	3.00	ARGILE ORANGEE MARRON
3.00	7.00	ARGILE NOIR BLANCHE
7.00	9.00	ARGILE BLANCHE + CRAIE
9.00	12.00	ARGILE MARRON
12.00	30.00	CALCAIRE BLANC + SABLE VERT
30.00	42.00	CALCAIRE BLANC CAILLOUX
42.00	49.00	CALCAIRE GRIS + SABLE GRIS

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	20.00	8"7/8	225.00	M.f.t.	Air
20.00	49.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
45.00	4.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	25.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
25.00	29.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		50
29.00	33.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
33.00	37.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		50
37.00	41.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
41.00	45.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		50
45.00	49.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	20.00	4"7/8	125.00	Ciment	Autre	Gravitaire			

REPLISSAGE (suite)

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
20.00	49.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de Loire	Gravillaire	Roule		


FORAGE D'EAU

Travaux réalisés du: 27/04/2021	à: 27/04/2021	11
Coordonnées de l'ouvrage		
Lambert 1 carto métrique		
Longitude (X)		0
Latitude (Y)		0
Altitude sol (Z)		+141 000 m

Echelle : 1/240

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

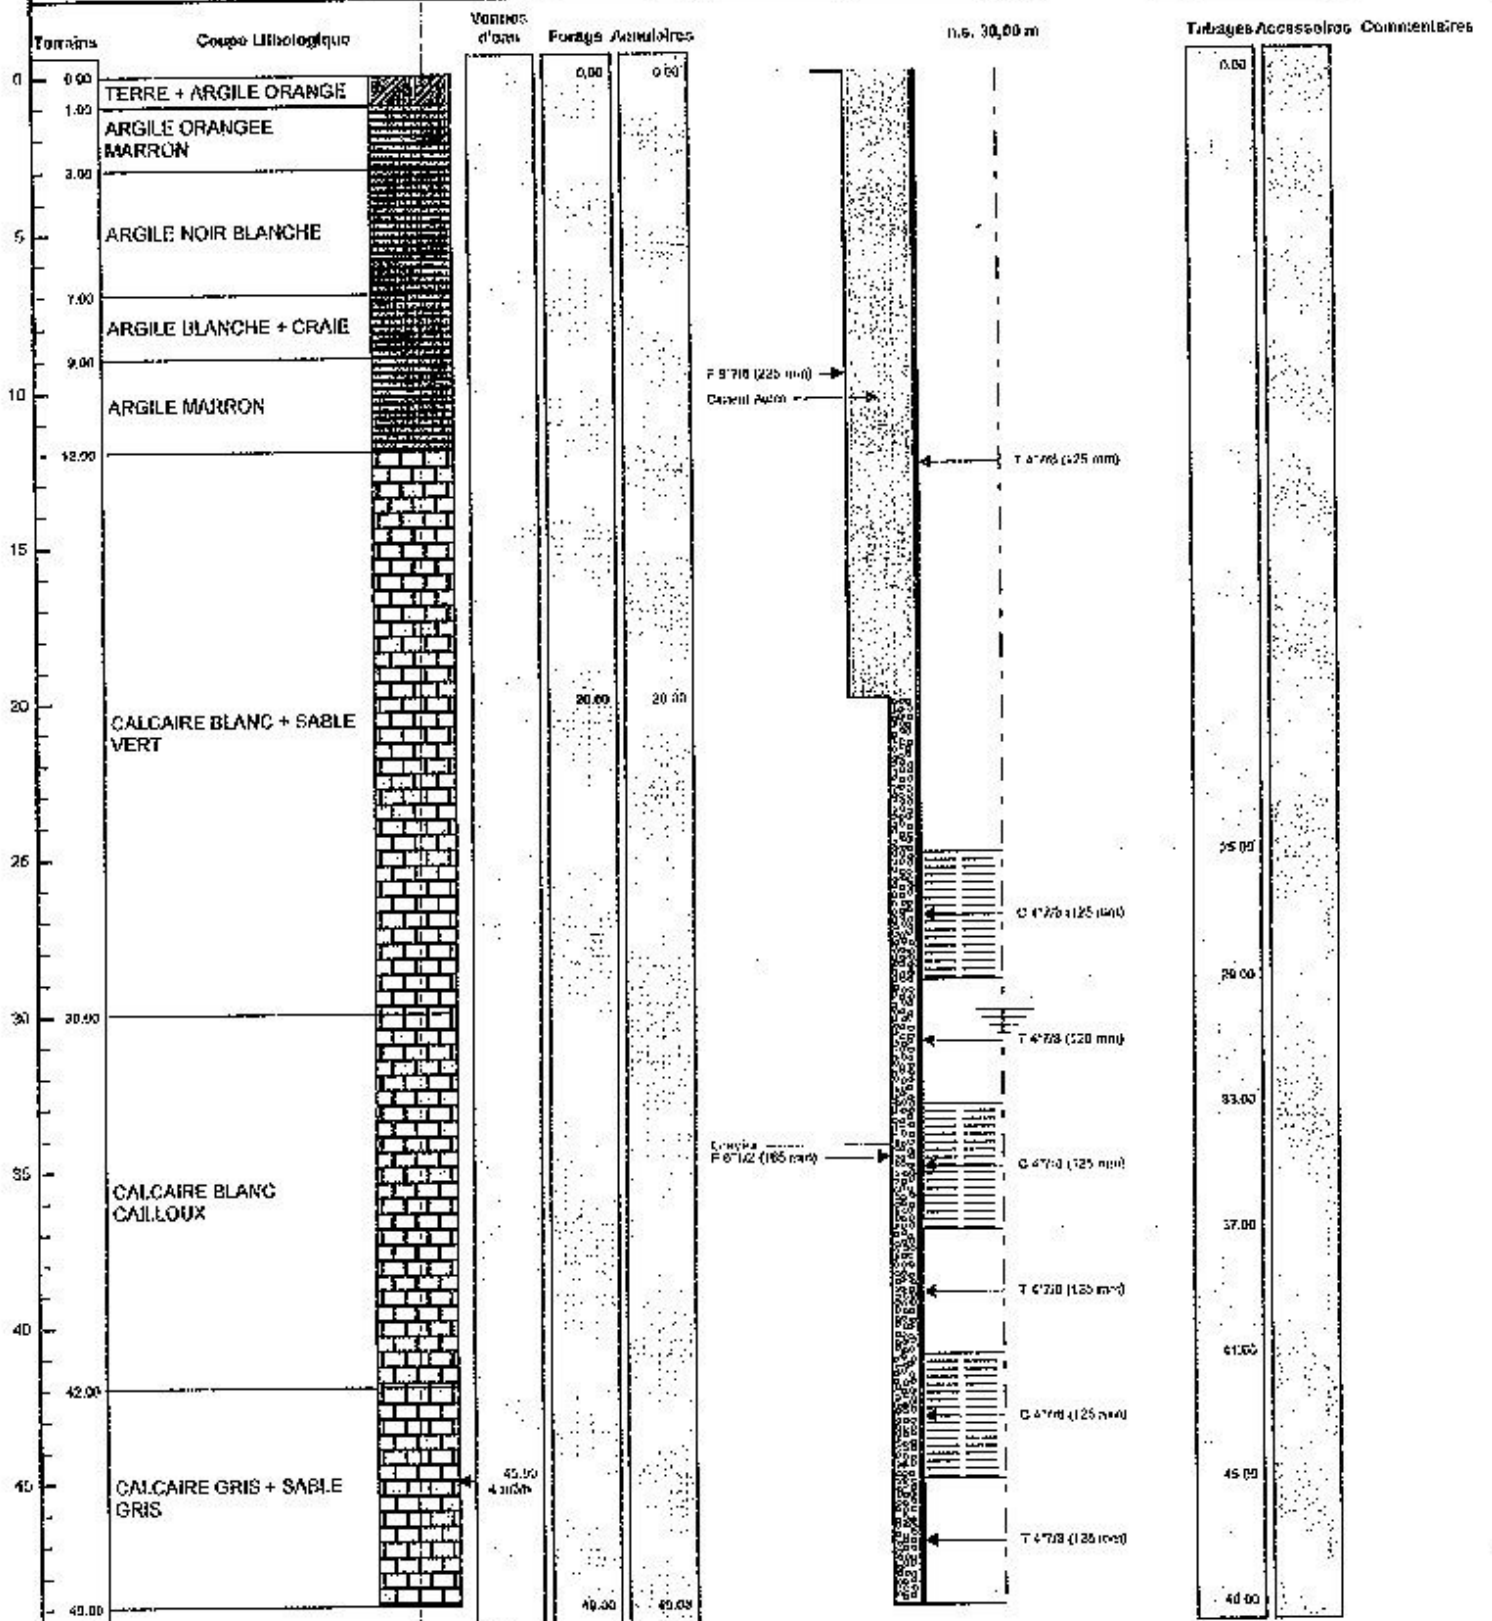

Le 28/04/2021 à Verson NORMANDIE FORAGE
CERTIFIÉ CONFORME À L'OUVRAGE DE Verson - 14790 Verson
Tampon et signature du chef d'entreprise

Lambert 1 carto métrique Long.: 0 Lat.: +141 000 m
N° Siren 420 697 708 00022

PAGE: 4
