

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU



Code National BSS :

N° Déclaration ** : 49758

Police de l'eau * : 76-2021-00078/CA

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 9 ROUTE DU BEL EVENT
76560 HERICOURT EN CAUX

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 119.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 10/05/2021 Resp. M. Ouvrage : GRANCHER

Date fin de l'ouvrage : 11/05/2021 Resp. M. Oeuvre : GAUTIER

Machine : ECOFORE Resp. Chantier : GODEY

Date début pompage : Niveau statique non perturbé : 47.00 m

Date fin de pompage : Débit Maxi. d'essai : 2.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : Rabattement correspondant : 100.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE LIMON
1.00	11.00	ARGILE A SILEX ORANGEE
11.00	13.00	ARGILE A SILEX MARRON
13.00	21.00	ARGILE A SILEX NOIR
21.00	31.00	ARGILE A SILEX MARRON CLAIR
31.00	100.00	CRAIE BLANCHE A SILEX
100.00	127.00	CRAIE GRISE BLANCHE A SILEX

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	20.00	8"7/8	225.00	M.f.t.	Air
20.00	127.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
100.00	2.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	100.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
100.00	104.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		50
104.00	108.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
108.00	112.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		50
112.00	116.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
116.00	120.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		50
120.00	127.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	20.00	4"7/8	125.00	Ciment	Autre	Gravitaire			

FORAGE D'EAU


Travaux réalisés : 11
du : 10/05/2021 au : 11/05/2021 1

Coordonnées de l'ouvrage :
Lambert 1 carto métrique
Longitude (X): 0
Latitude (Y): 0
Altitude sol (Z): +119,000 m

Echelle : 1/538

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

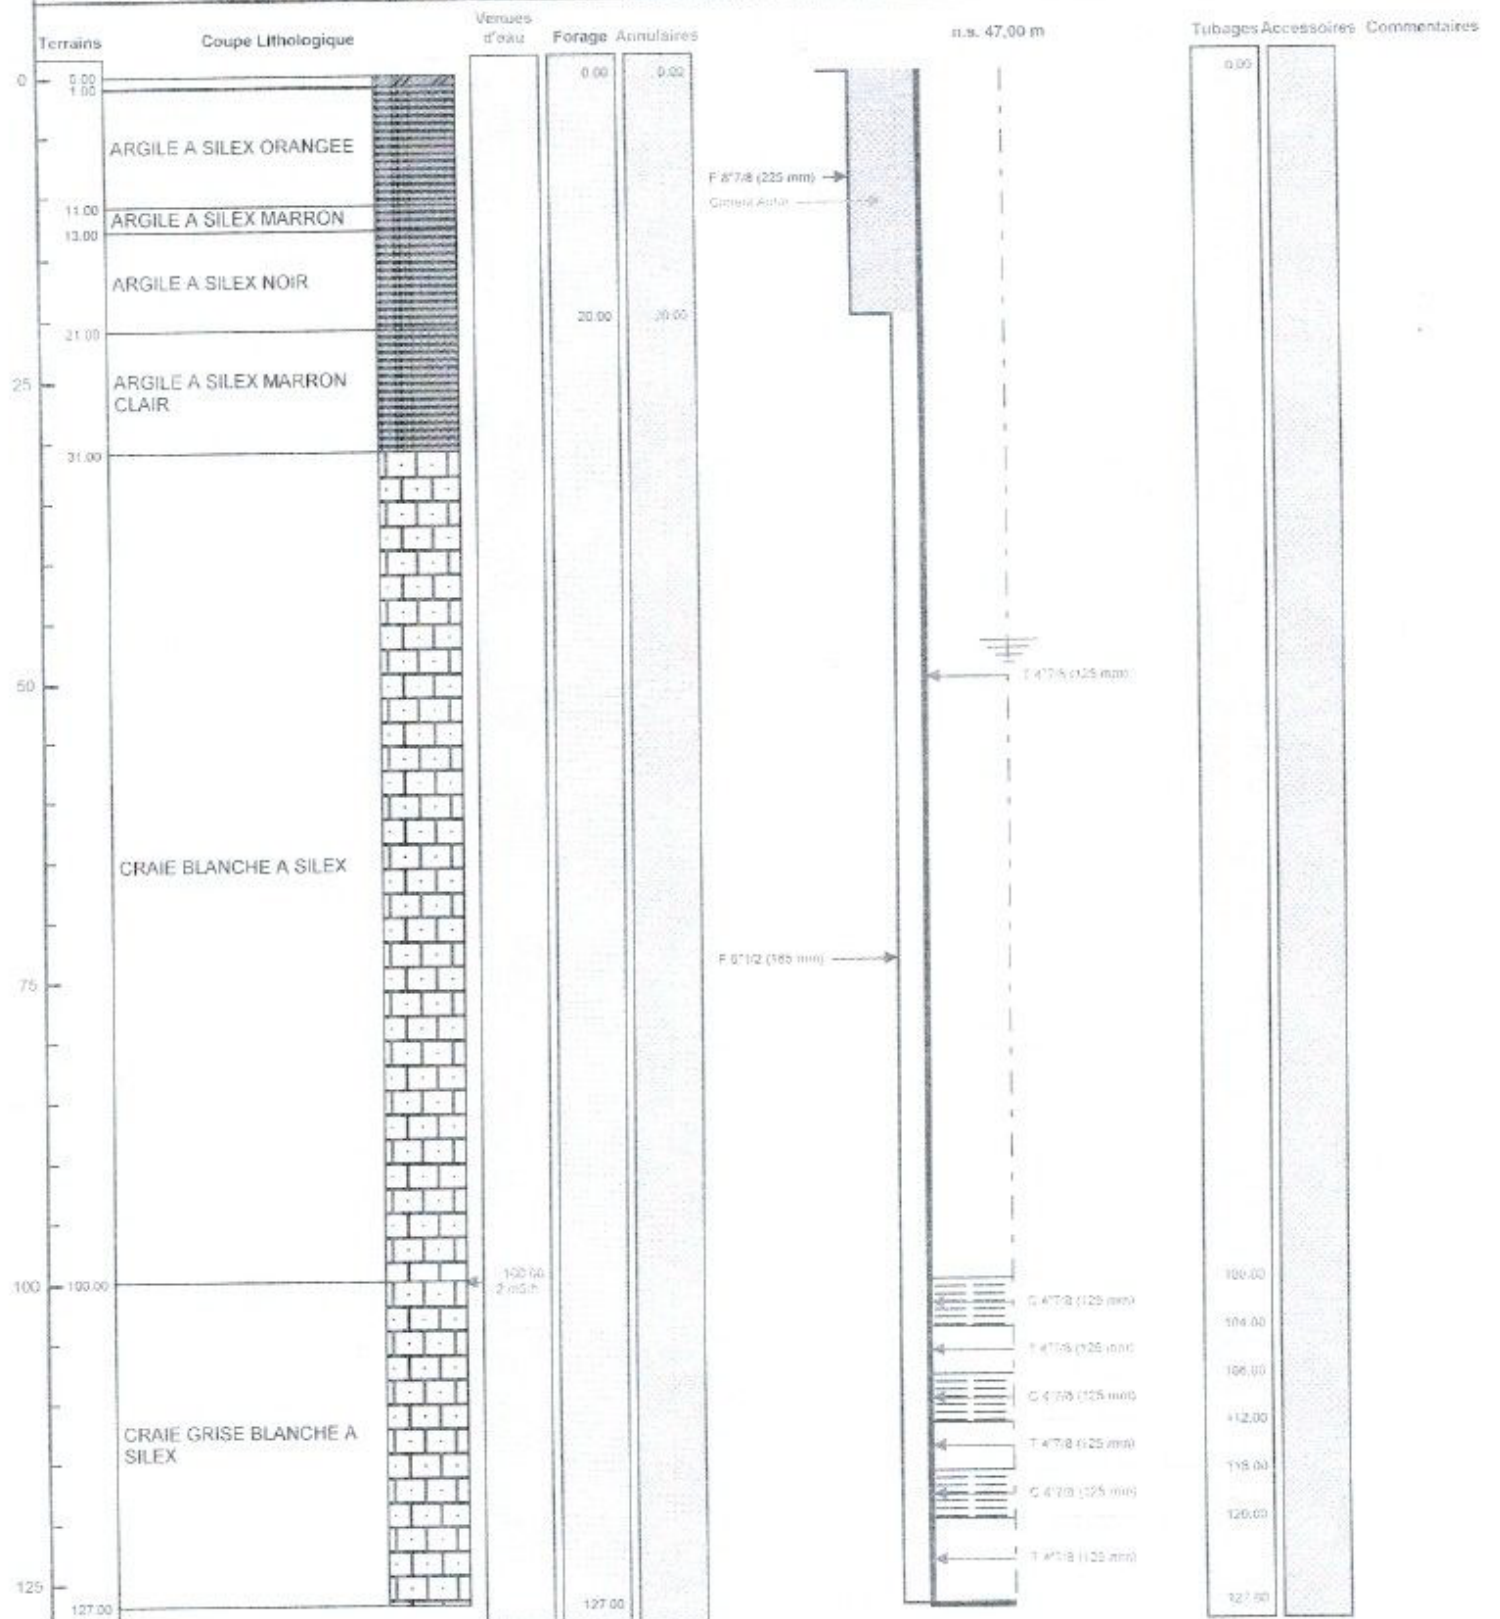

Le 19.05.2021 à versson
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise

NORMANDIE FORAGE
N° 14790 PERSON
Siren 420 697 708 00022

Lambert 1 carto métrique Long.:
