



S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-51.com

BSS004GJNW

TRAVAUX DE FORAGE POUR LES BESOINS D'UN METHANISEUR

à

Witry Les Reims (51) AOC BIOMETHA

Forage certifié conforme
aux documents du rapport :

S.A.R.L. BONIFACE

Forages d'Eau

5, rue Pierre Boileau

51420 WITRY LES REIMS

Tél. 03 26 97 11 61 - Fax. 03 26 97 21 75

SIRET: 330 588 278 00029 - APE: 4399 D


**TRAVAUX REALISES
DU**

9 au 12 Janvier 2023

Entreprise de forage - Forages d'eau - Sondages - Acidification - Essais de débits

Capital de 100 000 Euros - TVA intracommunautaire : FR 833 305 882 78 - SIRET 330 588 278 B 00029 - APE 4399 D

Conditions de ventes au verso

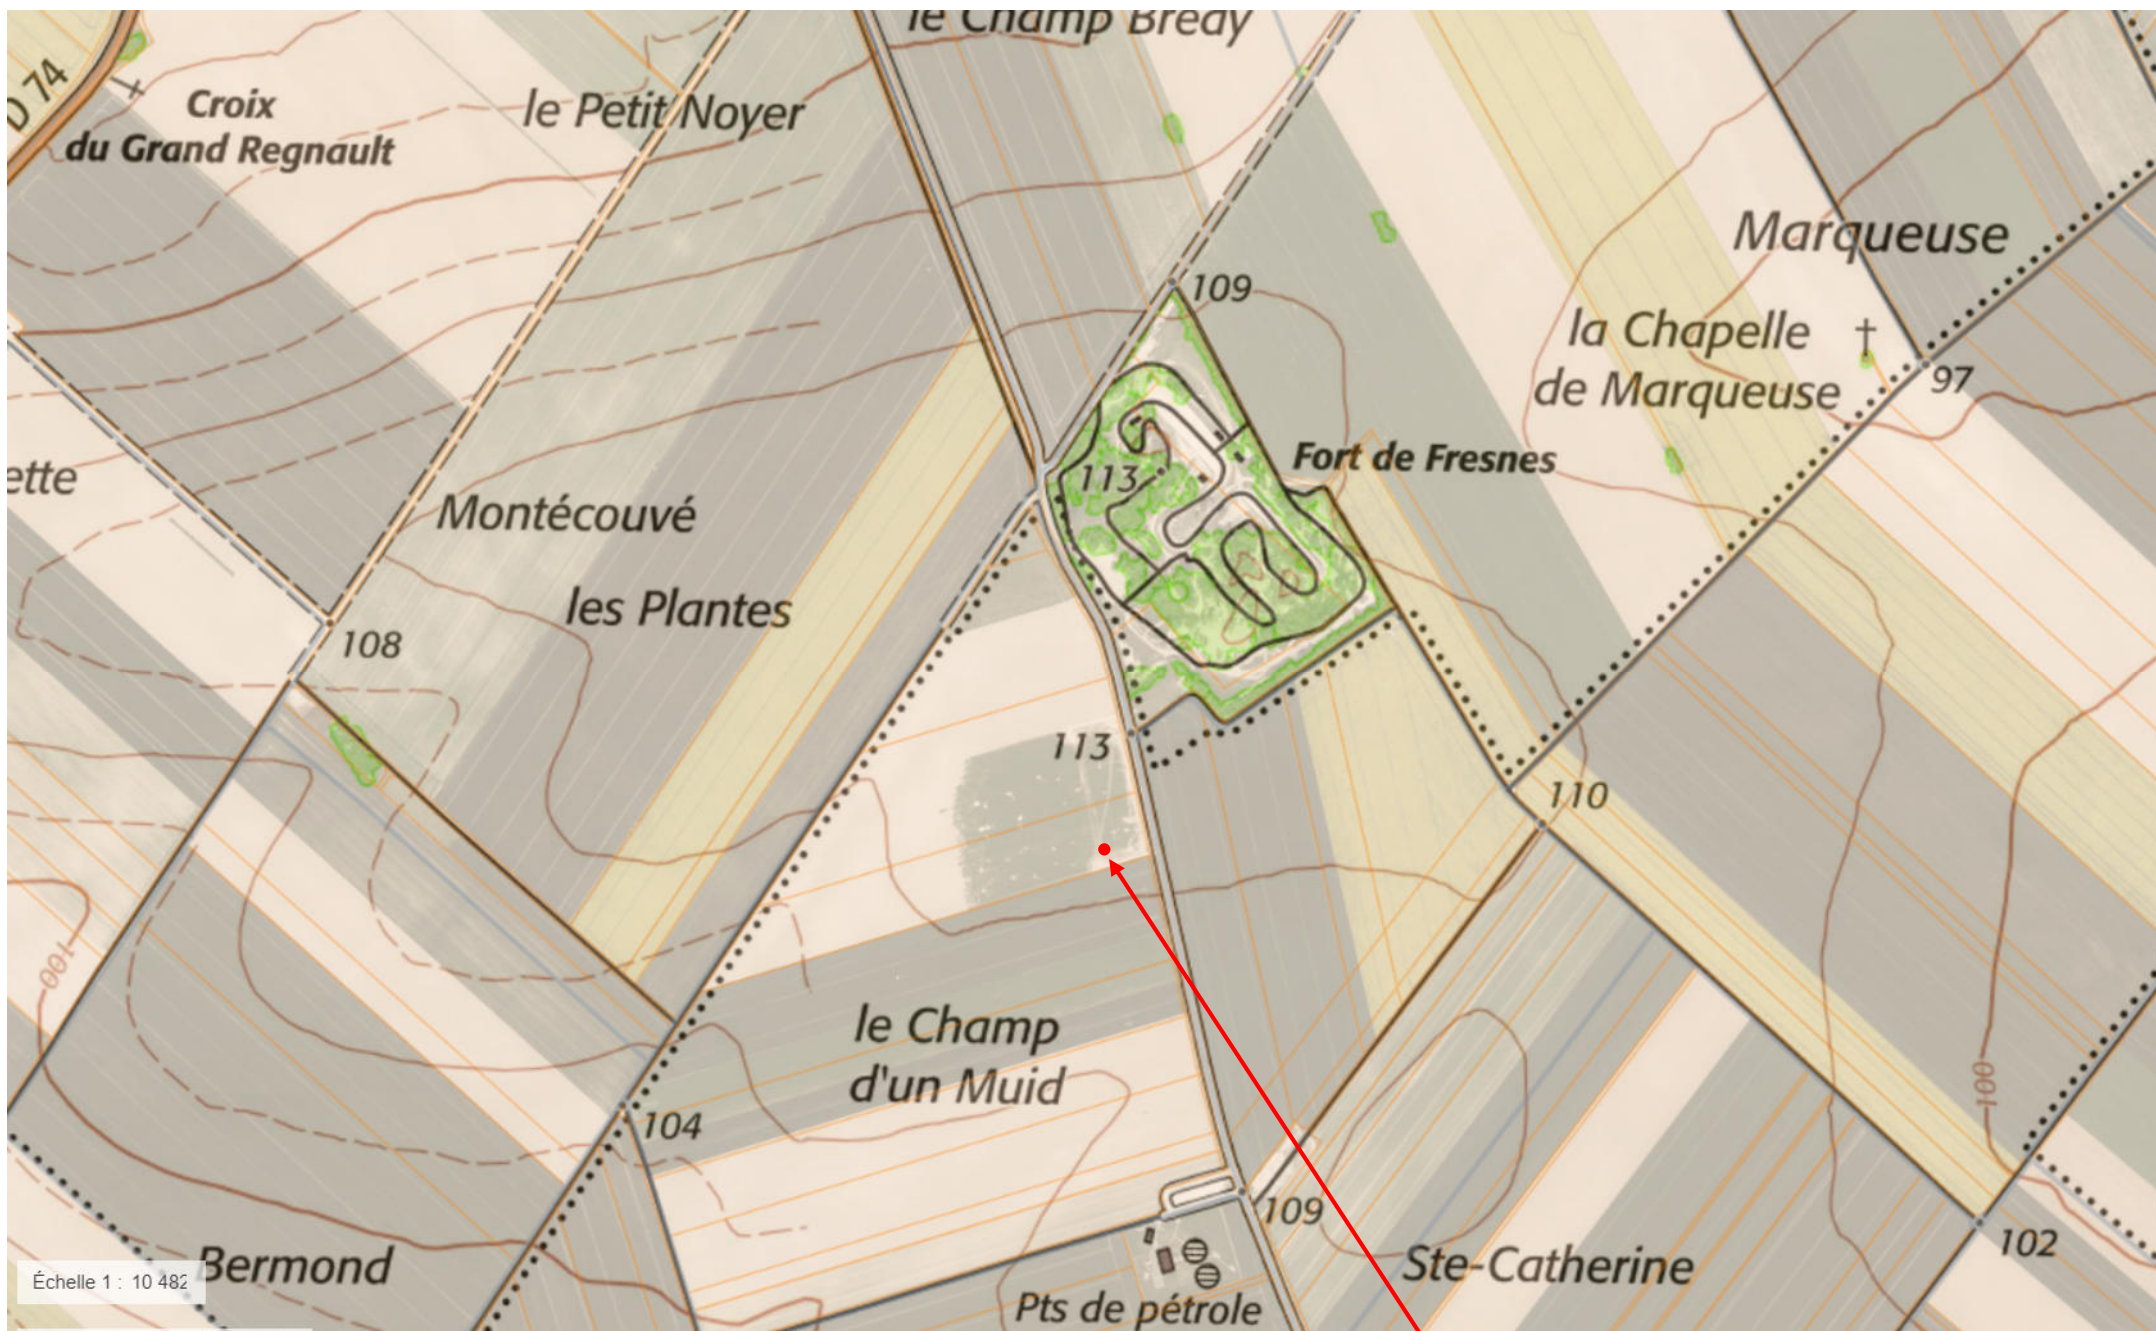

BSS004GJNW

PROJET
Alt : 111 m

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	AOC BIOMETHA, 5 route de Rosnay - 51390 GUEUX	
Date :	09/01/2023	n° DREAL : 323831 - BSS004GJNW
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins du méthaniseur	
Lieu du chantier :	Witry Les Reims / Fresnes Les Reims	

TERRAIN

[illegible]**FORAGE**

Profondeur finale :	49,60
----------------------------	--------------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	5,00	350	Tarière	à sec
5,00	49,60	220	Rotary	Eau

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
0,00	5,00	250	250/234	PVC		x
-0,65	20,20	140	140/126	PVC		x
20,20	49,60	140	140/126	PVC	x 2 mm	

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	AOC BIOMETHA, 5 route de Rosnay - 51390 GUEUX	
Date :	09/01/2023	n° DREAL : 323831 - BSS004GJNW
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins du méthaniseur	
Lieu du chantier :	Witry Les Reims / Fresnes Les Reims	

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	5,00	CPJ45	x		350	250
0,00	15,00	CPJ45	x		220	140
15,00	15,50	Jupe			220	140

POMPAGE NS (m) : 23,35 Côte / Sol (m): -0,65 Pompe : SP 5A17

ND (m)	Q (m3)	Temps
46,50	0,50	4h
Acidification :	1,00	tonne(s)
44,60	5,00	4h
40,50	3,50	2h
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m3)	Temps
40,50	3,50	2h00
Débit spécifiques		
Q' =	0,20	m ³ / h / m
Coordonnées : - X : 4,10499 - Y : 49,32077 - Z : 112,00 m		
Observations : Ce forage devra être exploité à un débit max. de 3 m ³ /h La pompe peut être placée à -47 m Une sonde sécurité manque d'eau est fortement recommandée		

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	AOC BIOMETHA, 5 route de Rosnay - 51390 GUEUX	
Date :	09/01/2023	n° DREAL : 323831 - BSS004GJNW
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins du méthaniseur	
Lieu du chantier :	Witry Les Reims / Fresnes Les Reims	

