

FORAGE D'EAU

[illegible]**Code National BSS :**

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : La Vienne
61190 IRAI

Coordonnées : Longitude 530 515 Latitude 6 845 227 **Altitude :** 233.05 m
Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 01/03/2021

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 04/03/2021

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Fraste

Resp. Chantier : MR VIÉ

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 17.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 5.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabatement correspondant : 20.00 m

Notes :

Air lift de nettoyage pendant 1 heure

Pompage de développement pendant 4 heures (niveau dynamique à 37 m a 5 m³/h)



TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU



LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.50	Terre
0.50	15.00	Argile à silex
15.00	51.00	Craie blanche
51.00	68.00	Craie grise

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	68.00	9"7/8	250.00	Rotary	Boue

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	18.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
18.00	59.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes-continues	1.00	
59.00	62.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
62.00	65.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes-continues	1.00	
65.00	68.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-decanteur		


REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	15.00	5"1/2	140.00	Ciment	Clk	Gravitaire			0.80
15.00	16.00	5"1/2	140.00	Billes-argile	Compactonite				0.05
16.00	68.00	5"1/2	140.00	Gravier	Autre	Gravitaire	Roule	2.00-4.00	3.40

FORAGE D'EAU

au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

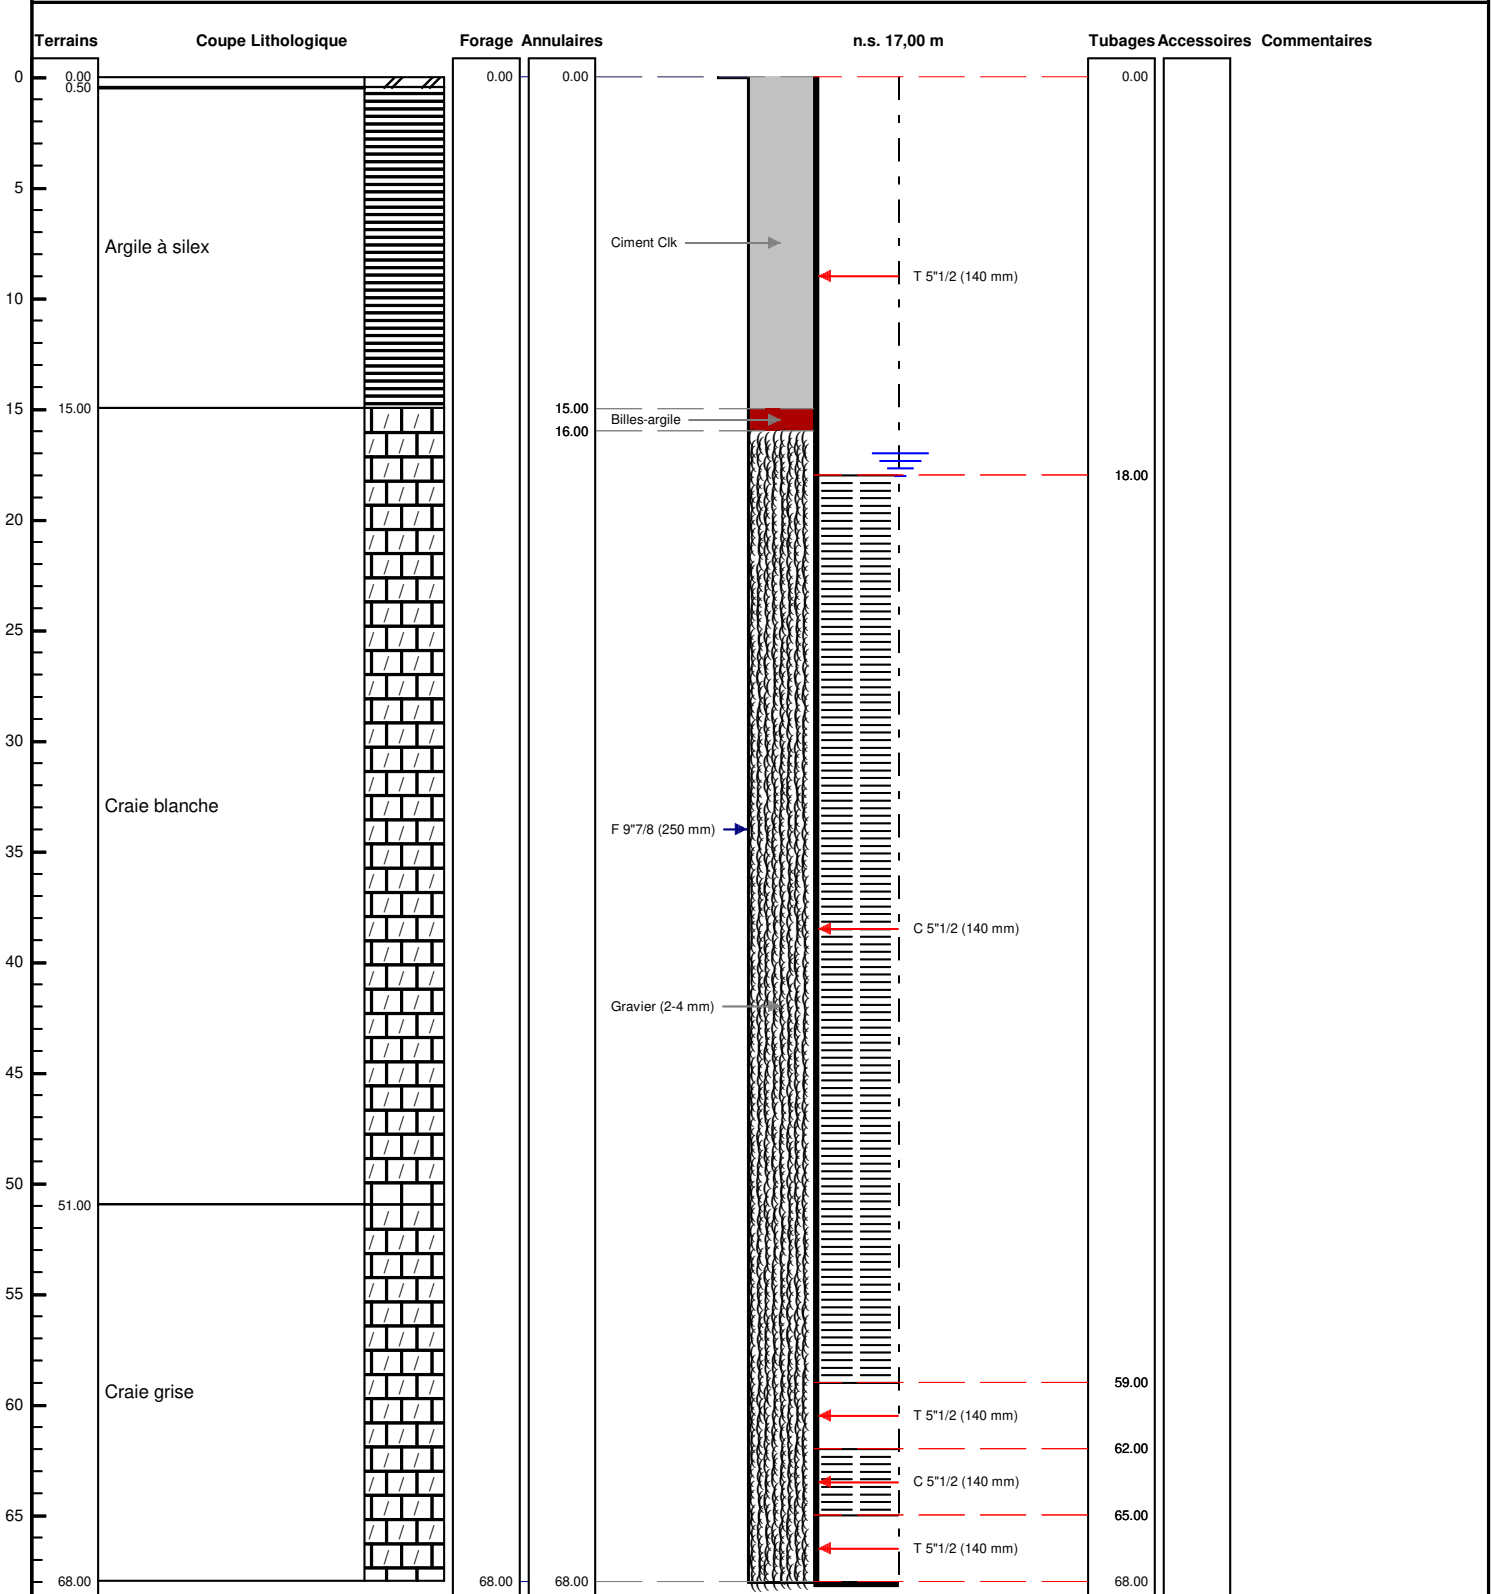

Le/...../..... à
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
 Tampon et signature du chef d'entreprise
