

S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS  
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22  
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-51.com

**BSS004GZDQ**

# TRAVAUX DE FORAGE POUR LES BESOINS DE L'ELEVAGE

à


**Chatelraould Saint Louvent  
(51)**

Forage certifié conforme  
aux documents du rapport :

**S.A.R.L. BONIFACE**  
**Forages d'Eau**  
5, rue Pierre Boileau  
51420 WITRY LES REIMS  
Tél. 03 26 97 11 61 - Fax. 03 26 97 21 75  
SIRET 330 588 278 00029 - APE 4399 D

**Affaire suivie par :**

**TRAVAUX REALISES  
LE  
3 Octobre 2016**

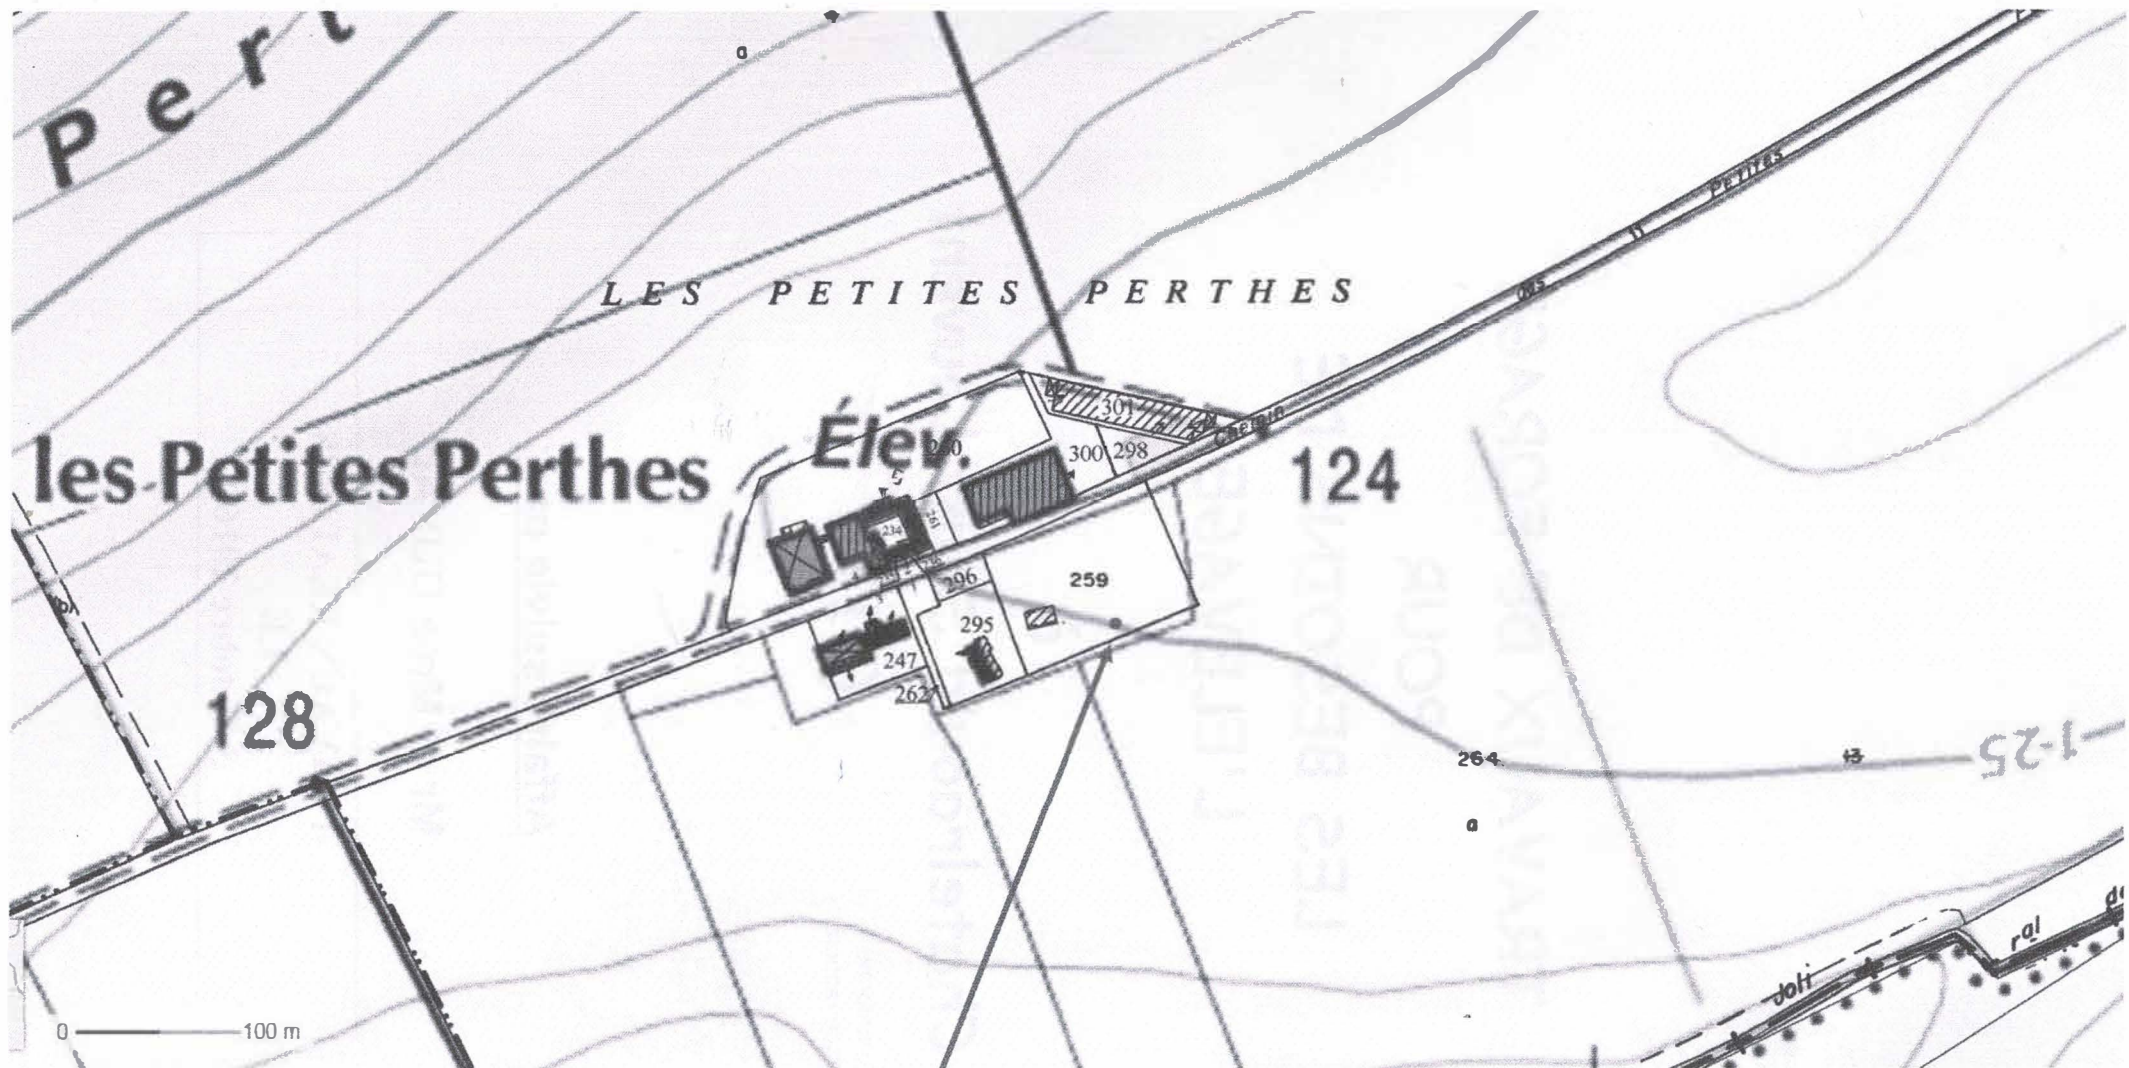

**Forage**

X : 4,518 DD,  
Y : 48,65408 DD  
Z : 125.30 m  
(WGS 84)





# RAPPORT DE CHANTIER

<b>Entreprise :</b> Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		<b>TEL :</b> 03.26.97.11.61
<b>Client :</b>		, Ferme Petites Perthes - 51300 Chatelraould St Louvent
<b>Date :</b>	03/10/2016	<b>n° DRIRE :</b> 386205
<b>Affaire suivie par :</b>	Vous-mêmes	
<b>Type de chantier :</b>	Forage d'eau pour les besoins de l'élevage	
<b>Lieu du chantier :</b>	Chatelraould Saint Louvent	

## MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

# CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	1,50	Prompt	x		270	200
0,00	9,50	CPJ45	x		180	140
9,50	10,00	Jupe			180	140

<b>POMPAGE</b>	<b>NS (m) :</b>	<b>11,53</b>	<b>Côte / Sol (m) :</b>	<b>-0,7</b>	<b>Pompe :</b>	<b>SP 8/10</b>
----------------	-----------------	--------------	-------------------------	-------------	----------------	----------------

<b>ND ( m )</b>	<b>Q ( m3/h )</b>	<b>Temps</b>
<b>12,20</b>	<b>12,30</b>	<b>3h</b>
<b>Pompage alternatif du 4 au 10/10 :</b>		
<b>11,82</b>	<b>7,00</b>	<b>6j</b>
<b>Acidification :</b>	<b>- tonne(s)</b>	
<b>ND ( m )</b>	<b>Q ( m3/h )</b>	<b>Temps</b>
<b>ND ( m )</b>	<b>Q ( m3/h )</b>	<b>Temps</b>
<b>ND ( m )</b>	<b>Q ( m3/h )</b>	<b>Temps</b>

ND ( m )	Q ( m <sup>3</sup> /h )	Temps
12,20	12,30	24h
<b>Débit spécifiques</b>		
Q' =	18,36	m <sup>3</sup> / h / m
<b><u>Observations :</u></b>		
<p>Pertes d'eau partielles lors de la foration.</p> <p>Installer la pompe dans la partie pleine du tubage de - 34,76 à -38,70 m.</p>		
<b><u>Numéro BSS :</u> BSS004GZDQ</b>		

**Remarques :** Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.  
Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.  
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

# RAPPORT DE CHANTIER

<b>Entreprise :</b>	<b>Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS</b>	<b>TEL : 03.26.97.11.61</b>
<b>Client :</b>	<b>, Ferme Petites Perthes - 51300 Chatelraould St Louvent</b>	
<b>Date :</b>	<b>03/10/2016</b>	<b>n° DRIRE : 386205</b>
<b>Affaire suivie par :</b>	<b>Vous-mêmes</b>	
<b>Type de chantier :</b>	<b>Forage d'eau pour les besoins de l'élevage</b>	
<b>Lieu du chantier :</b>	<b>Chatelraould Saint Louvent</b>	

