

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU N°11

Entreprise:	SAS FORAQUITAINE
Client:	
Maître d'oeuvre:	
Exploitant:	

Code National BSS : BSS004HLWH / F11

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage :

33610 CESTAS

Coordonnées : **Longitude** 406 441 **Latitude** 6 400 505 **Altitude :** 0.00 m
Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 04/04/2023 **Resp. M. Ouvrage :**

Date fin de l'ouvrage : 06/04/2023 **Resp. M. Oeuvre :**

Machine : FAILING 1500 **Resp. Chantier :**

Date début pompage : 06/04/2023 **Niveau statique non perturbé :** 1.40 m

Date fin de pompage : 06/04/2023 **Débit Maxi. d'essai :** 12.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : **Rabattement correspondant :** 1.00 m

Notes : F34

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU N°11

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

33610

CESTAS

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE VEGETALE
1.00	2.00	SABLE GRAS MARRON
2.00	4.00	SABLE JAUNE
4.00	15.10	SABLE BLANC
15.10	15.50	ARGILE

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	2.00	13"3/4	350.00	Tariere	Eau-claire
2.00	15.50	12"3/4	323.00	Battage	Eau-claire

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
-0.50	2.00	12"3/4	323.00	6.30		Acier-ordinaire	Tube-plein		
-0.50	8.50	9"7/8	250.00	9.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
8.50	15.50	9"7/8	250.00	9.00		P.v.c.	Crepine fentes	0.75	

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	2.00	12"3/4	323.00	Ciment	Cpa 55	Sous pression	Roule		0.10
0.00	15.50	9"7/8	250.00	Gravier	Graviers de silacq	Circulation inverse	Roule	1.00-2.50	0.55

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage :

33610 CESTAS

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert-93 métrique

Longitude (X):

406 441

Latitude (Y):

6 400 505


Altitude sol (Z):

+0,000 m

Echelle : 1/80

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

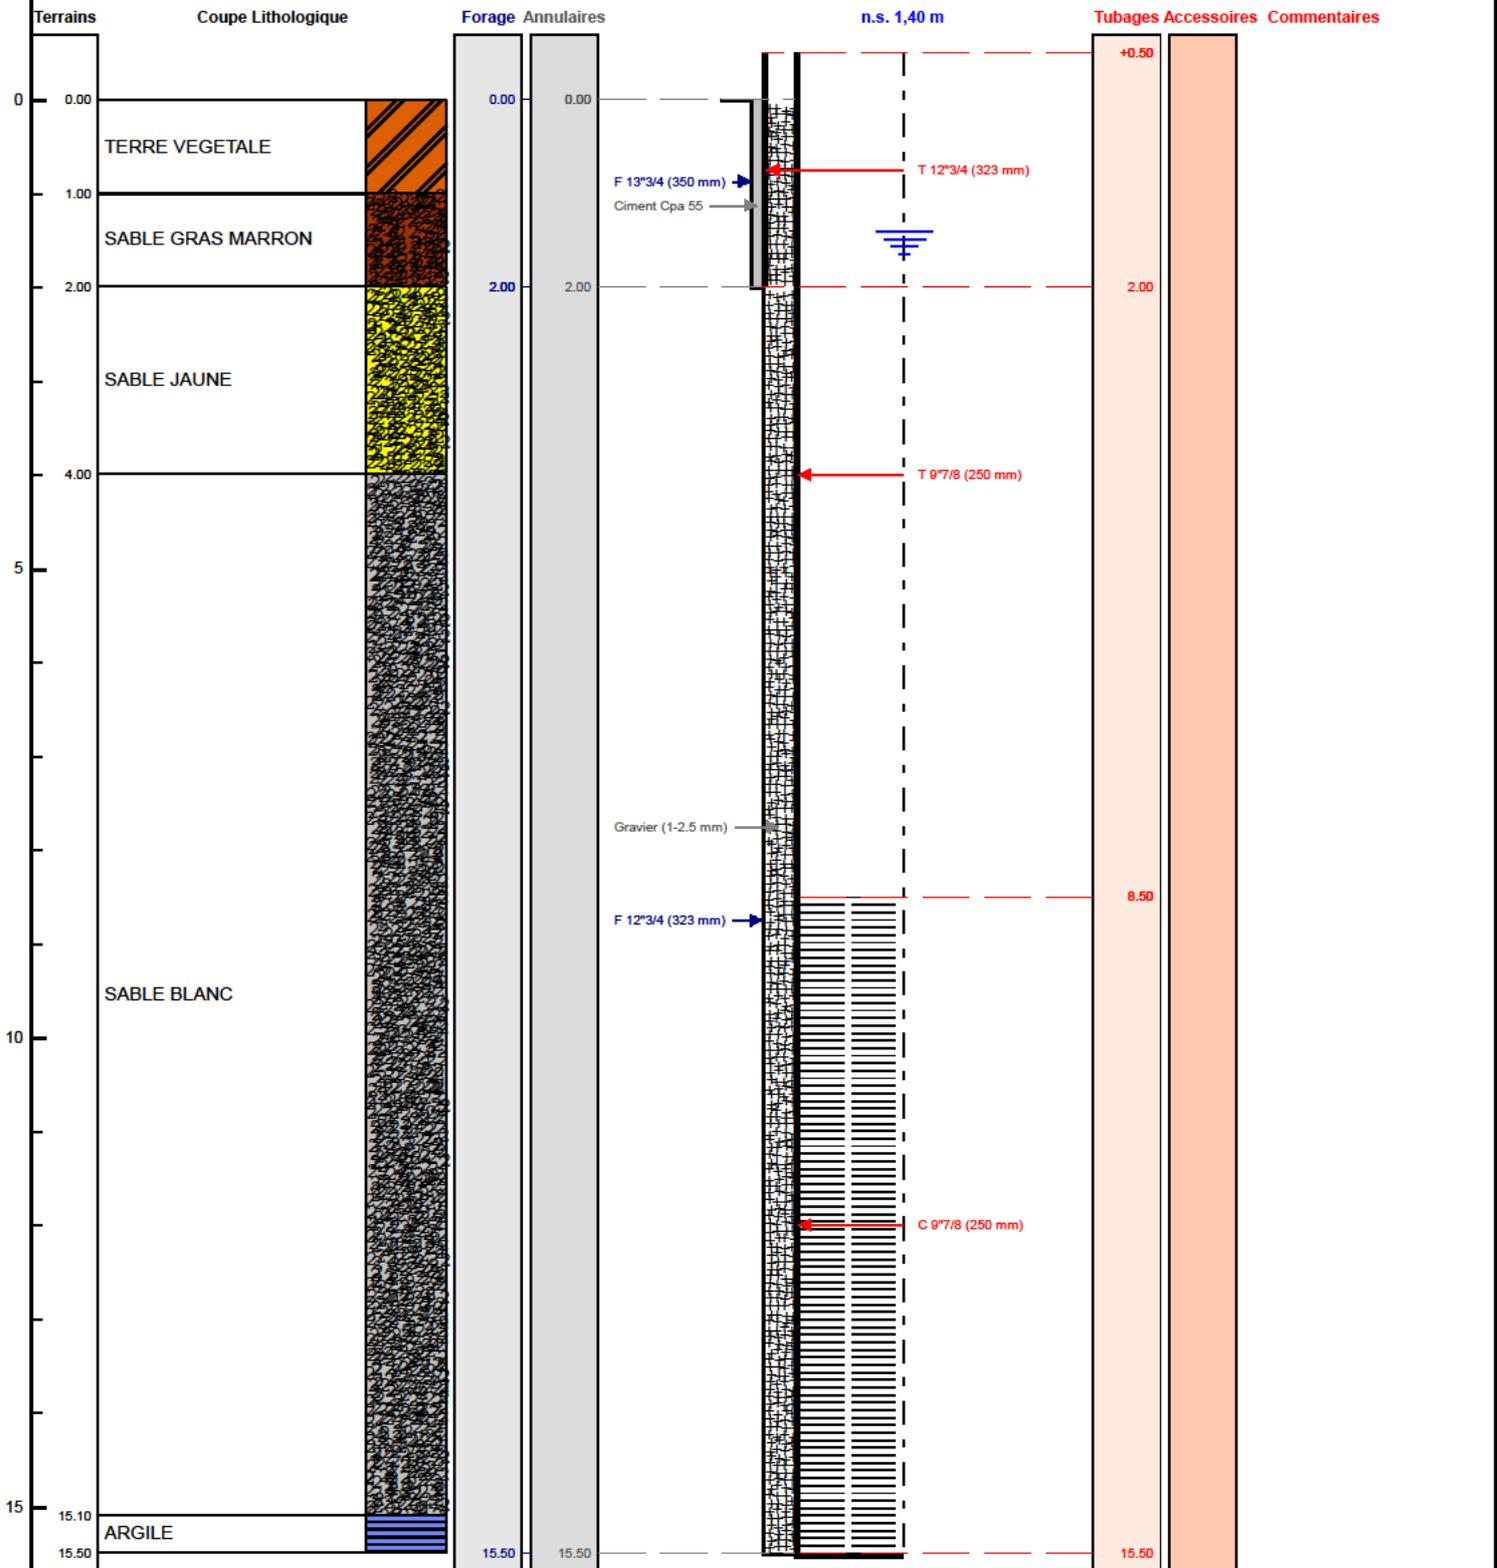

Le à
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise
