

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU

Entreprise: NORMANDIE FORAGE .

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS : BSS004GAEW

N° Déclaration \*\* : 12454

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 5 RUE DE LA VIELLE HABLOVILLE  
61210 HABLOVILLE

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 0.00 m  
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 06/04/2023

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 06/04/2023

Resp. M. Oeuvre :

Machine : ECOFORE

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 5.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabatement correspondant : 0.00 m

Notes : FORAGE DE PRELEVEMENT

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

Client:	
Maître d'oeuvre:	
Lieu de l'ouvrage :	5 RUE DE LA VIELLE HABLOVILLE 81210 HABLOVILLE

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	12.00	CALCAIRE JAUNE DEGRADE
12.00	42.00	SCHISTE BLEU MARRON PASSAGE CAILLOUX

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	8"7/8	225.00	M.f.t.	Air
10.00	42.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
27.00	3.00

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecor.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	26.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
26.00	38.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		50
38.00	42.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

## REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gr. (mm)	Vol. m3
0.00	10.00	4"7/8	125.00	Ciment	Cik	Gravitaire			

# FORAGE D'EAU

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage :

5 RUE DE LA VIEILLE HABLOVILLE  
61210 HABLOVILLE

Travaux réalisés :  
du 06/04/2023 au 06/04/2023

Coordonnées de l'ouvrage :

Rampart : carto métrique

Longitude (X) :


Latitude (Y) :

Altitude (Z) :

Echelle : 1/211

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro 901 (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

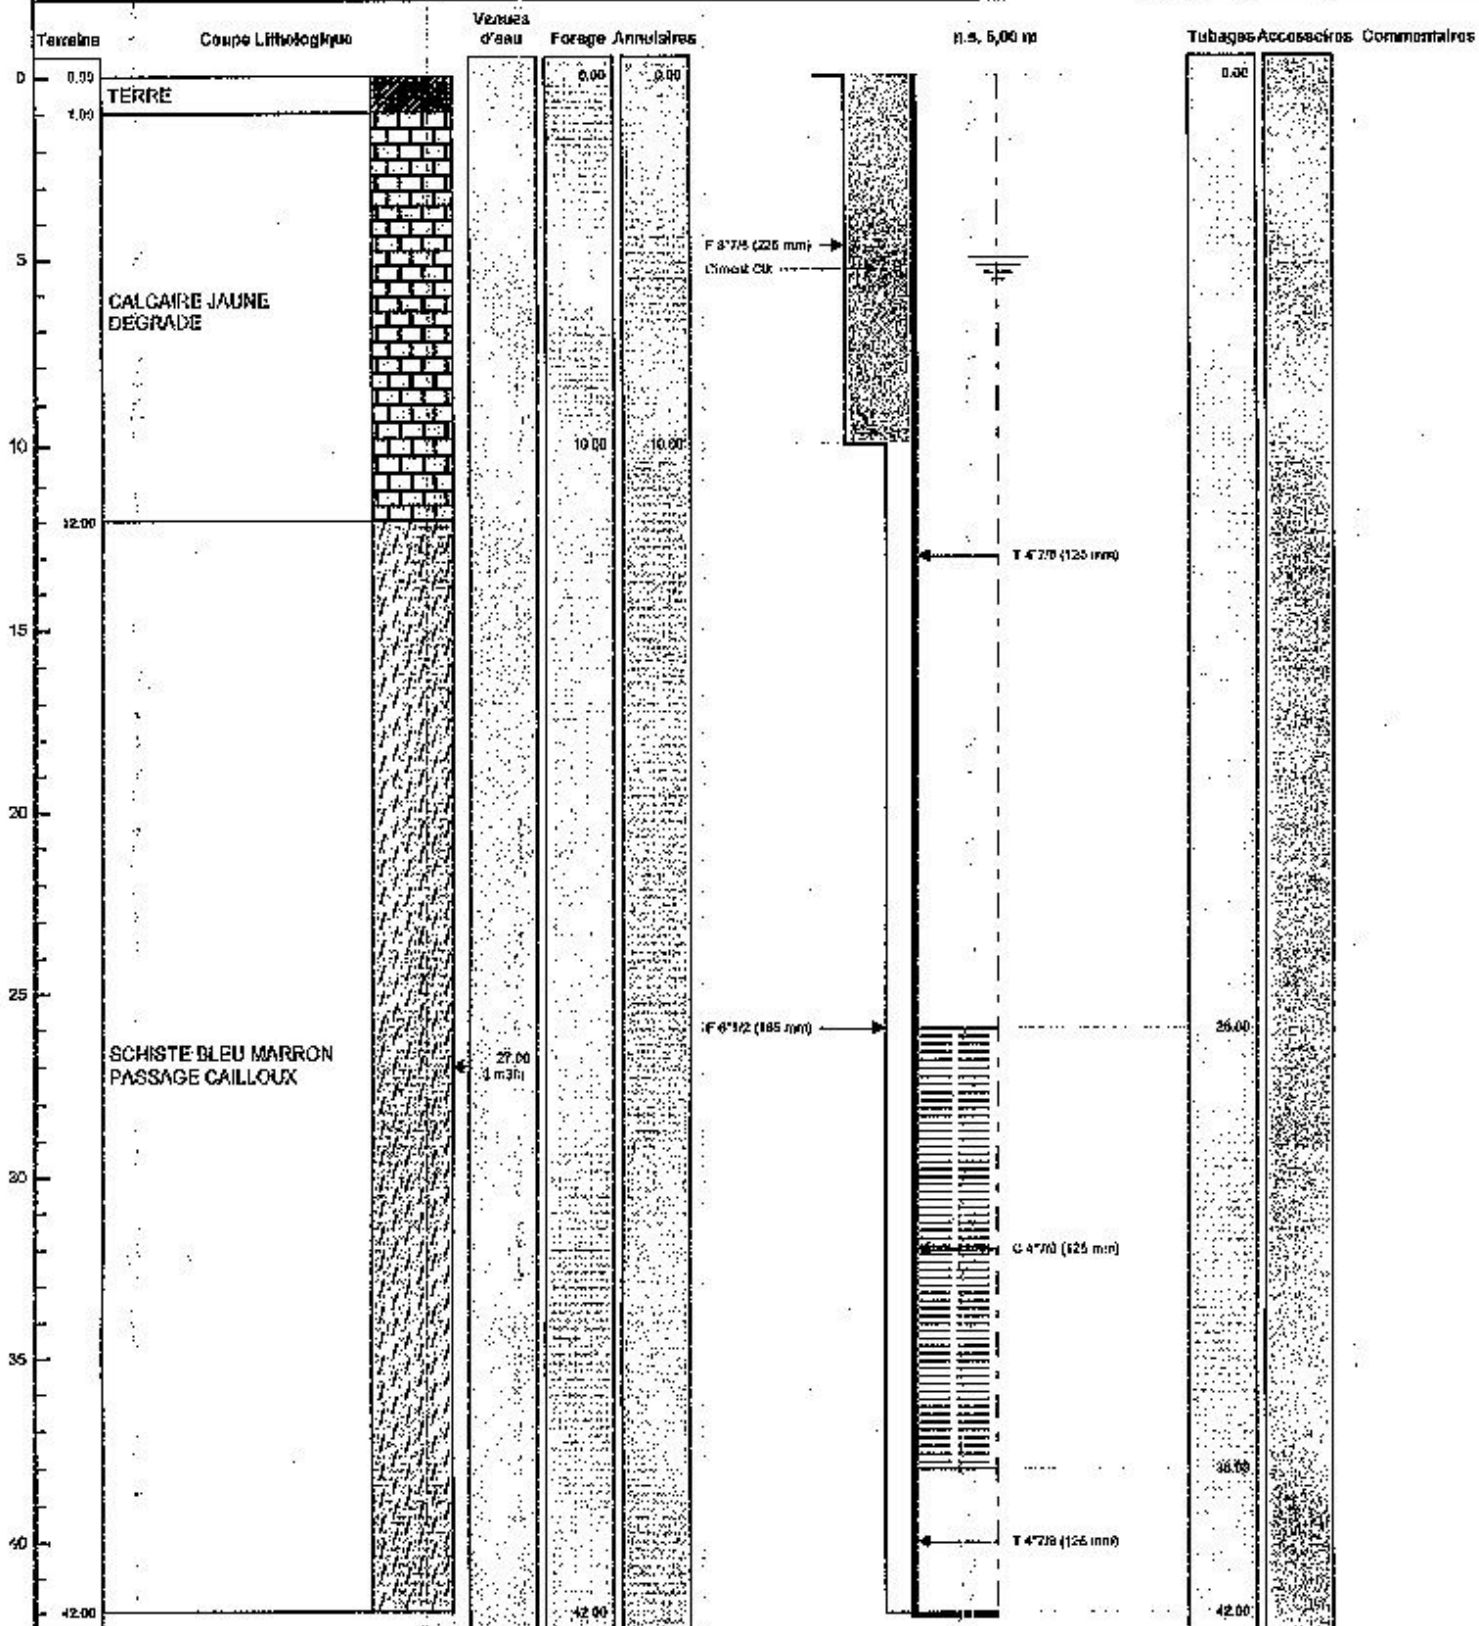

Le 17/04/2023 à 17h00  
CERTIFIE CONFORME A LOI  
Tampon et signature du chef d'entreprise

Lambert 1 carto métrique
