

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU 68 ML REJET

Entreprise: SARL BREBANT FORAGE

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 3 Rue du Prieuré
14680 CINTHEAUX

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 **Altitude :** 0.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 29/03/2023

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 29/03/2023

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Stenuick

Resp. Chantier :

Date début pompage : **Niveau statique non perturbé :** 0.00 m

Date fin de pompage : **Débit Maxi. d'essai :** 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : **Rabattement correspondant :** 0.00 m

Notes : NIVEAU STATIQUE DE REJET 28.94 METRES
NIVEAU DYNAMIQUE 30.16 METRES A UN DEBIT DE 7 M3/HEURE

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU 68 ML REJET

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : 3 Rue du Prieuré

14680

CINTHEAUX

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	7.00	ARGILE
7.00	61.00	CALCAIRE
61.00	68.00	ARGILE

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
10.00	68.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
68.00	1.50

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	28.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
28.00	32.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
32.00	36.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
36.00	40.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
40.00	44.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
44.00	52.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
52.00	56.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
56.00	60.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
60.00	64.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
64.00	68.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		

REMPLISSAGE


De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	9.00	4"7/8	125.00	Ciment	Ciment-bentonite	Sous pression			
9.00	10.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactonite				

		FORAGE D'EAU 68 ML REJET		Travaux réalisés :		111	
Client :				du : 29/03/2023 au : 29/03/2023			
Maitre d'oeuvre :				Coordonnées de l'ouvrage :			
Localisation de l'ouvrage :		3 Rue du Prieuré		Lambert 1 carto métrique			
		14680 CINTHEAUX		Longitude (X):			
				Latitude (Y):			
				Altitude sol (Z):			

1\1

+0,000 m

Nombre de forages : 1

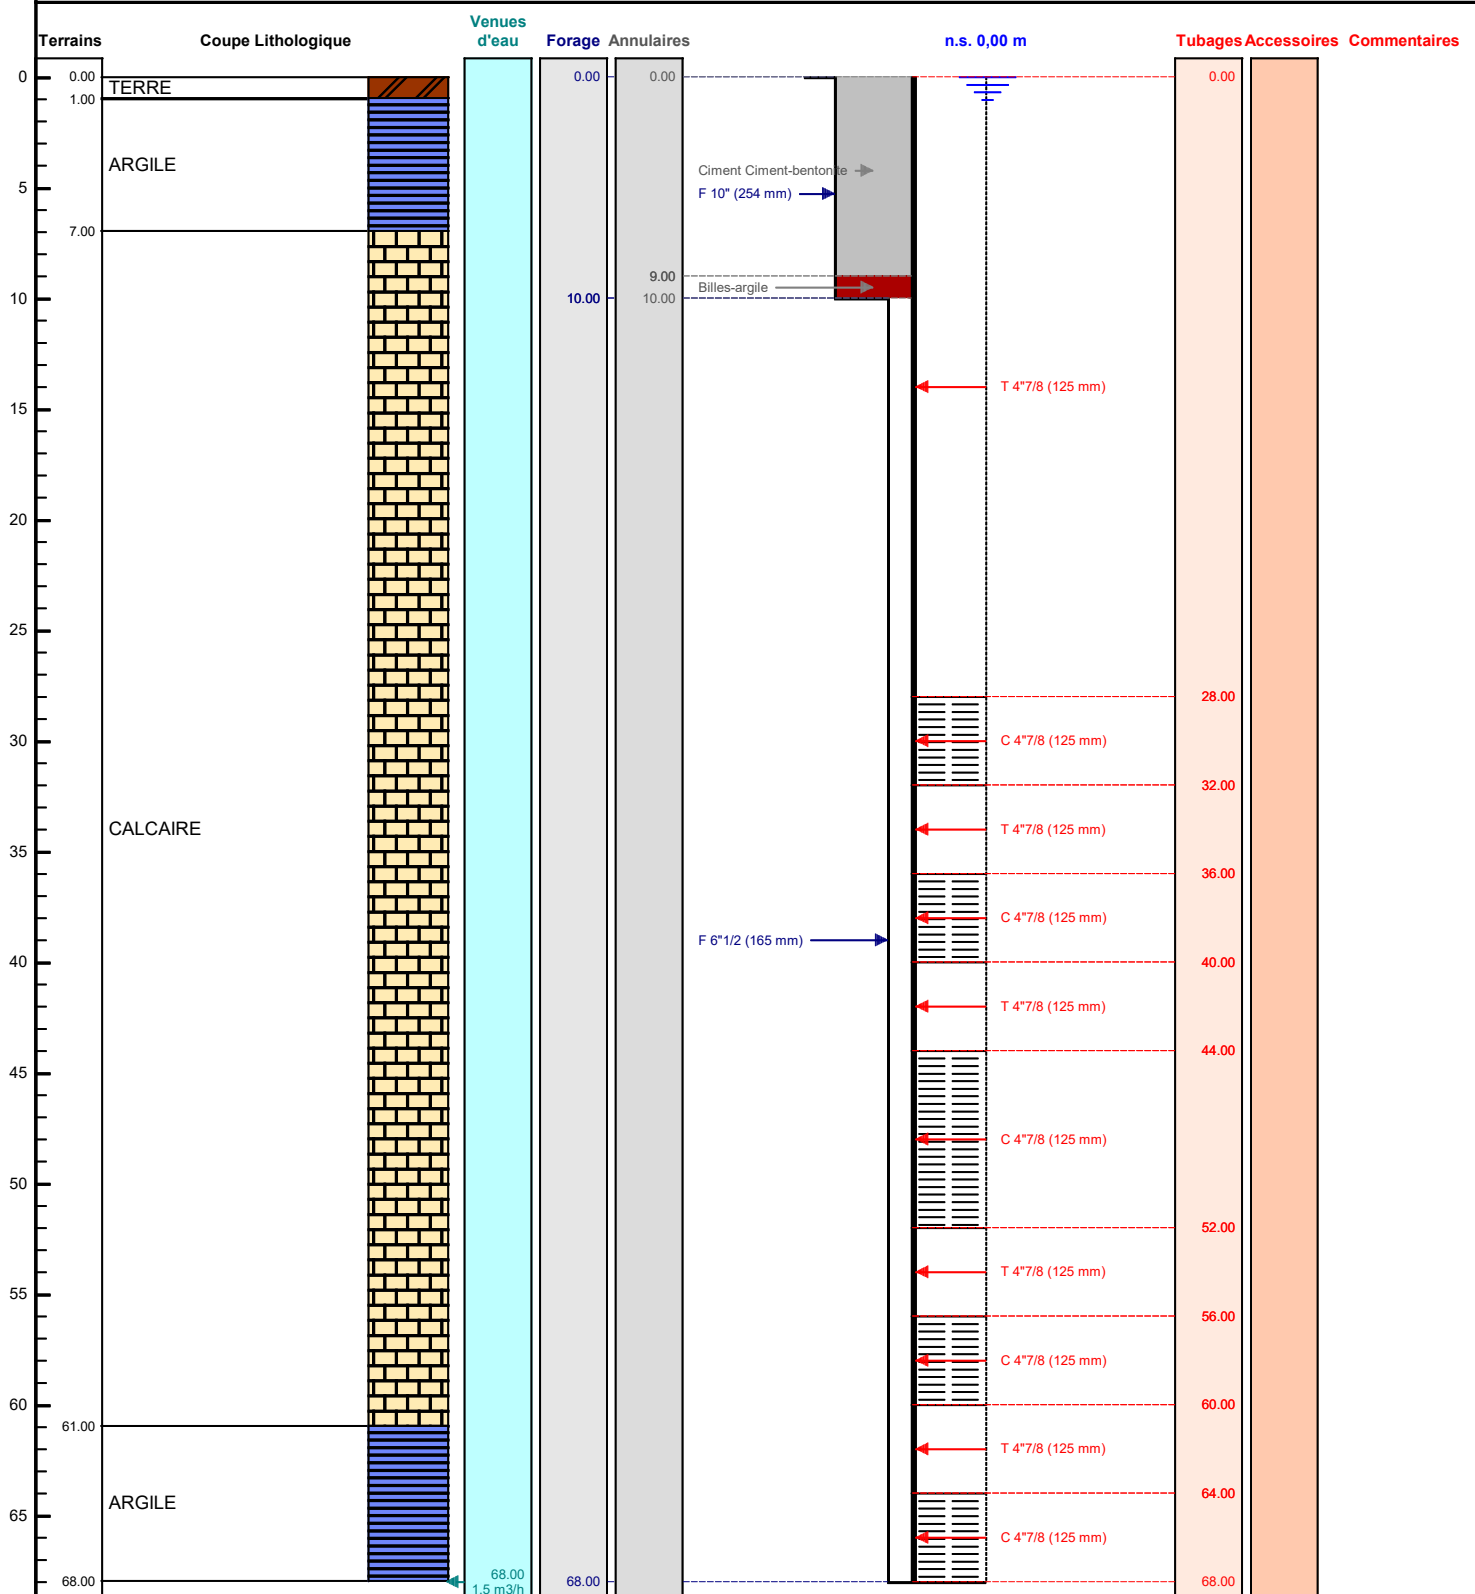

Tampon et signature du chef d'entreprise
