

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise: **LES FORAGES DU GATINAIS**

Client:

Route de la Garenne
18800 BAUGY

Maître d'oeuvre: **LES FORAGES DU GATINAIS**

10 ter, rue de Vimory
45200 MONTARGIS

Exploitant:

10 ter, rue de Vimory
45200 MONTARGIS

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Route de la Garenne
18800 BAUGY

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 **Altitude :** 0.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 01/03/2022

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 04/03/2202

Resp. M. Oeuvre :

Machine :

Resp. Chantier :

Date début pompage : 03/03/2022

Niveau statique non perturbé : 0.40 m

Date fin de pompage : 03/03/2022

Débit Maxi. d'essai : 5.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE
FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

LES FORAGES DU GATINAIS

Lieu de l'ouvrage :

Route de la Garenne
18800 BAUGY

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.50	Terre végétale
0.50	3.00	Argile crème + passage de calcaire
3.00	6.00	Argile grise + eau
6.00	32.00	Calcaire gris + argile + eau

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	31.00	7"7/8	200.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	4.00	6"5/8	168.00	0.00		Acier-api	Tube-plein		
0.00	4.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
4.00	31.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes		

FORAGE D'EAU

Travaux réalisés : 1/1
du : 01/03/2022 au : 04/03/2022

Client :

Maitre d'oeuvre :

LES FORAGES DU GATINAIS

Localisation de l'ouvrage : Route de la Garenne

18800 BAUGY

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique

Longitude (X): 0


Latitude (Y): 0

Altitude sol (Z): +0,000 m

Echelle : 1/161

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

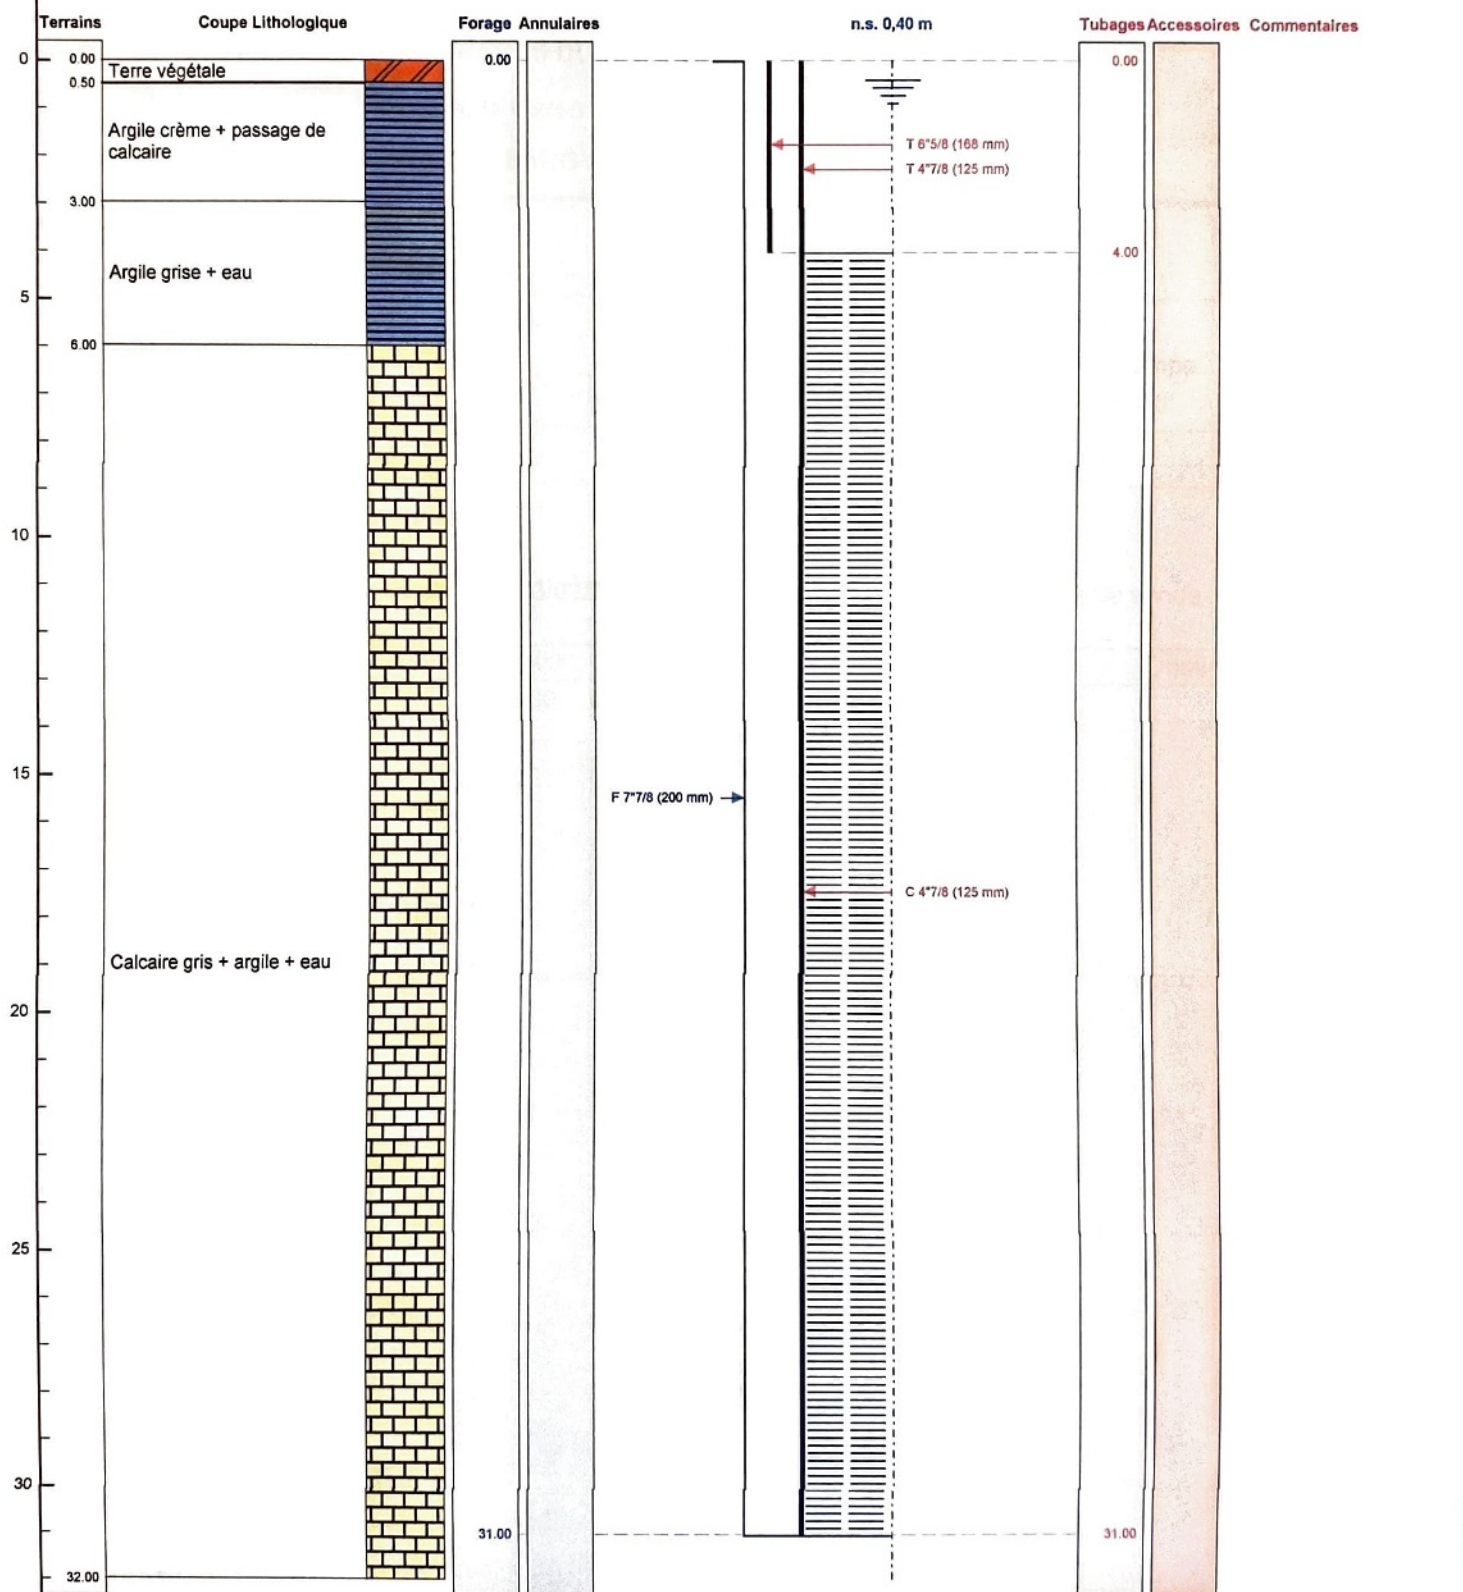

Le à
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise

POMPAGE D'ESSAI

FORAGE D'EAU

Pompage d'essai

Client: [REDACTED]			
Maître d'oeuvre: LES FORAGES DU GATINAIS			
Lieu de l'ouvrage : Route de la Garenne			
18800 BAUGY			
Profondeur utile du forage:	31.00	m	Niveau repère/sol: 0.00 m
Diamètre de la chambre de pompage:	168	mm	Niveau statique/sol: 0.40 m
Type de la pompe:			Puissance de la pompe: 2 Kw
Diamètre nominal:	4"		Diamètre hors tout de la pompe: 0 mm
Débit maxi de la pompe:	0.00	m3/h	Hauteur de refoulement maxi: 0 mm
Installée à (profondeur):	29.00	m	Longueur de refoulement: 50 m

Observations :

Date et heure de début de pompage le 03/03/2022 à 00:00

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
03/03/2022	10:20	10h20	5.00	0.40	0.40	0.00	
	10:25	10h25		0.65	0.65	0.25	
	10:30	10h30		0.91	0.91	0.51	
	10:35	10h35		0.91	0.91	0.51	
	10:45	10h45		0.91	0.91	0.51	
	11:00	11h00		0.91	0.91	0.51	
	11:30	11h30		0.91	0.91	0.51	
	12:00	12h00		0.91	0.91	0.51	
