


B. Comblement des piézomètres L1 et L2

Les travaux de comblement des piézomètres L1 et L2 ont été réalisés au mois de février 2023.


Le comblement a été réalisé d'après le protocole proposé par AnteaGroup :

- Curage des dépôts de fond ;
- Comblement du fond de l'ouvrage jusqu'à 10 m de profondeur avec des sables ou graviers siliceux, désinfectés ;
- Mise en place d'un bouchon d'argile gonflante de 10 à 8 m de profondeur ;
- Cimentation jusqu'au ras du sol avec retrait de la bouche à clé (piézomètre L1) et de la tête de protection en acier (piézomètre L2).

Coupes techniques d'après le protocole :

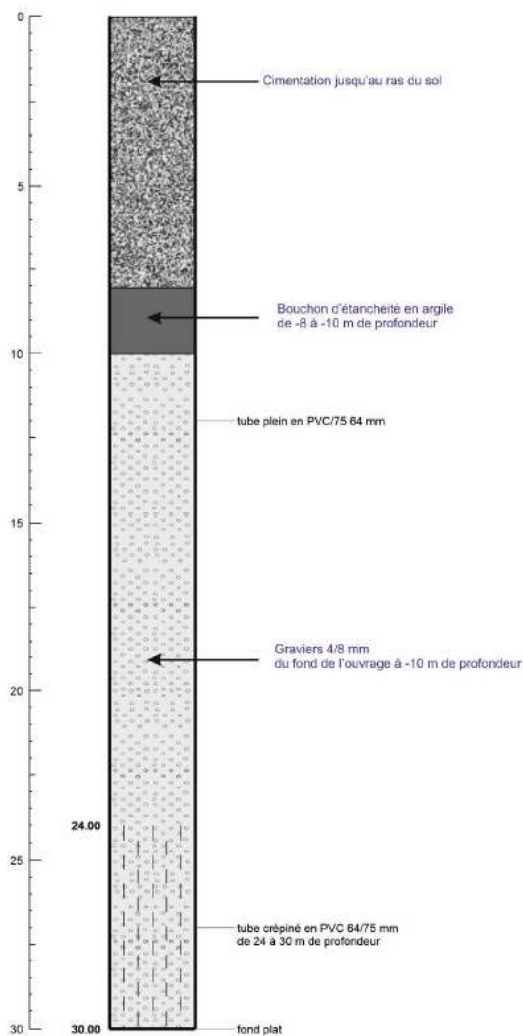

L1
BSS004HZZJ

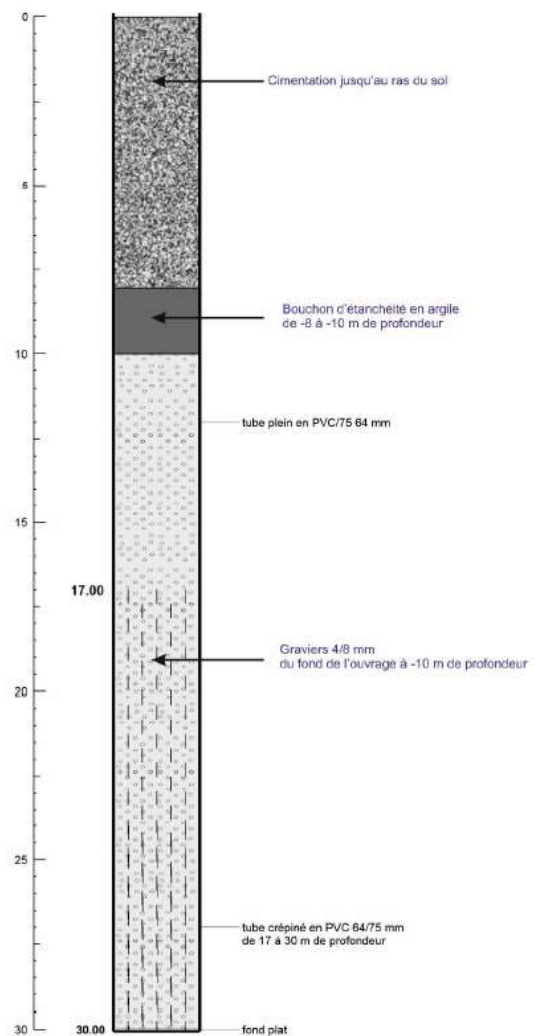

L2
BSS004HZZK
