

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU

Entreprise: **TOURAIN FORAGE**

Client:

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** 5 Route de Villedomain  
36240 PREAUX

**Coordonnées :**      **Longitude**      0      **Latitude**      0      **Altitude :**      0.00      m  
**Zone**      Lambert 1 carto métrique

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :** 30/05/2023

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 30/05/2023

**Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :** Stenuick

**Resp. Chantier :** LUCIER

**Date début pompage :** 30/05/2023

**Niveau statique non perturbé :** 10.50      m

**Date fin de pompage :**

**Débit Maxi. d'essai :** 2.00      m3/h

**Nombre de nappes identifiées :**

**Rabattement correspondant :** 7.50      m

**Notes :** Débit 2m3/h

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

Client:

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.60	Terre végétal
0.60	2.50	Argile marron
2.50	6.00	Argile à silex marron
6.00	19.00	Tuffeau

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	19.00	8"7/8	225.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
15.00	2.00

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	10.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
10.00	18.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	

## REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	2.00	4"7/8	125.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			
2.00	3.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactonite				
3.00	18.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	2.00-4.00	
18.00	19.00	Rebouc	0.00	Remblai					

FORAGE D'EAU


Client :

Travaux réalisés :  
du : 30/05/2023 au : 30/05/2023

1/1

Coordonnées de l'ouvrage :  
Lambert 1 carto métrique  
Longitude (X): 0  
Latitude (Y): 0  
Altitude sol (Z): +0,000 m

Echelle : 1/95 Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus) Nombre de forages : 1

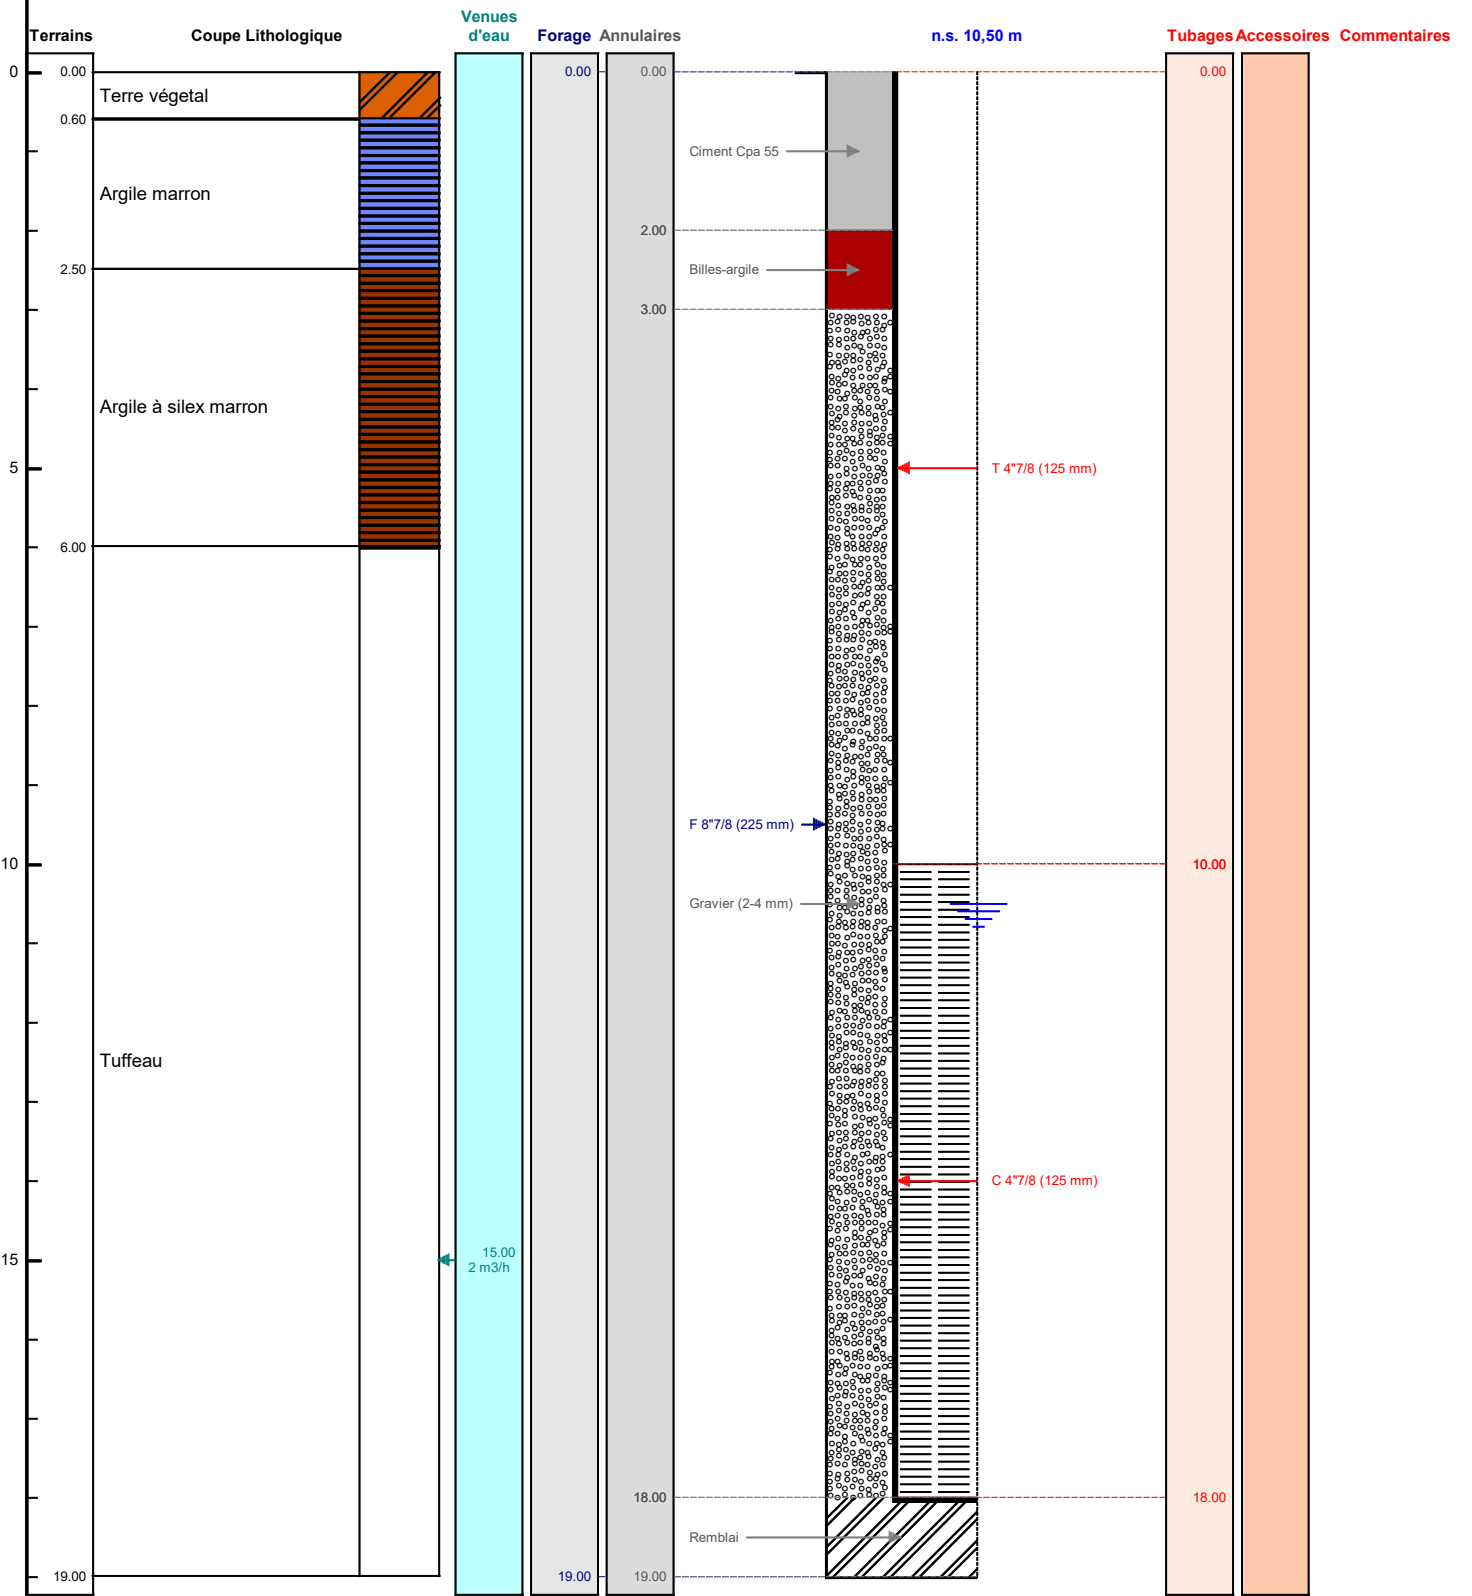

Le ...../...../..... à .....  
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE  
Tampon et signature du chef d'entreprise
