



**S.A.R.L. BONIFACE**


**ENTREPRISE DE FORAGE**

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS  
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22  
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : [www.boniface-51.com](http://www.boniface-51.com)

# **TRAVAUX DE FORAGE POUR LES BESOINS DE L'ARROSAGE DOMESTIQUE à Lamorlaye (60)**

**TRAVAUX REALISES  
DU  
2 au 7 Septembre 2022**



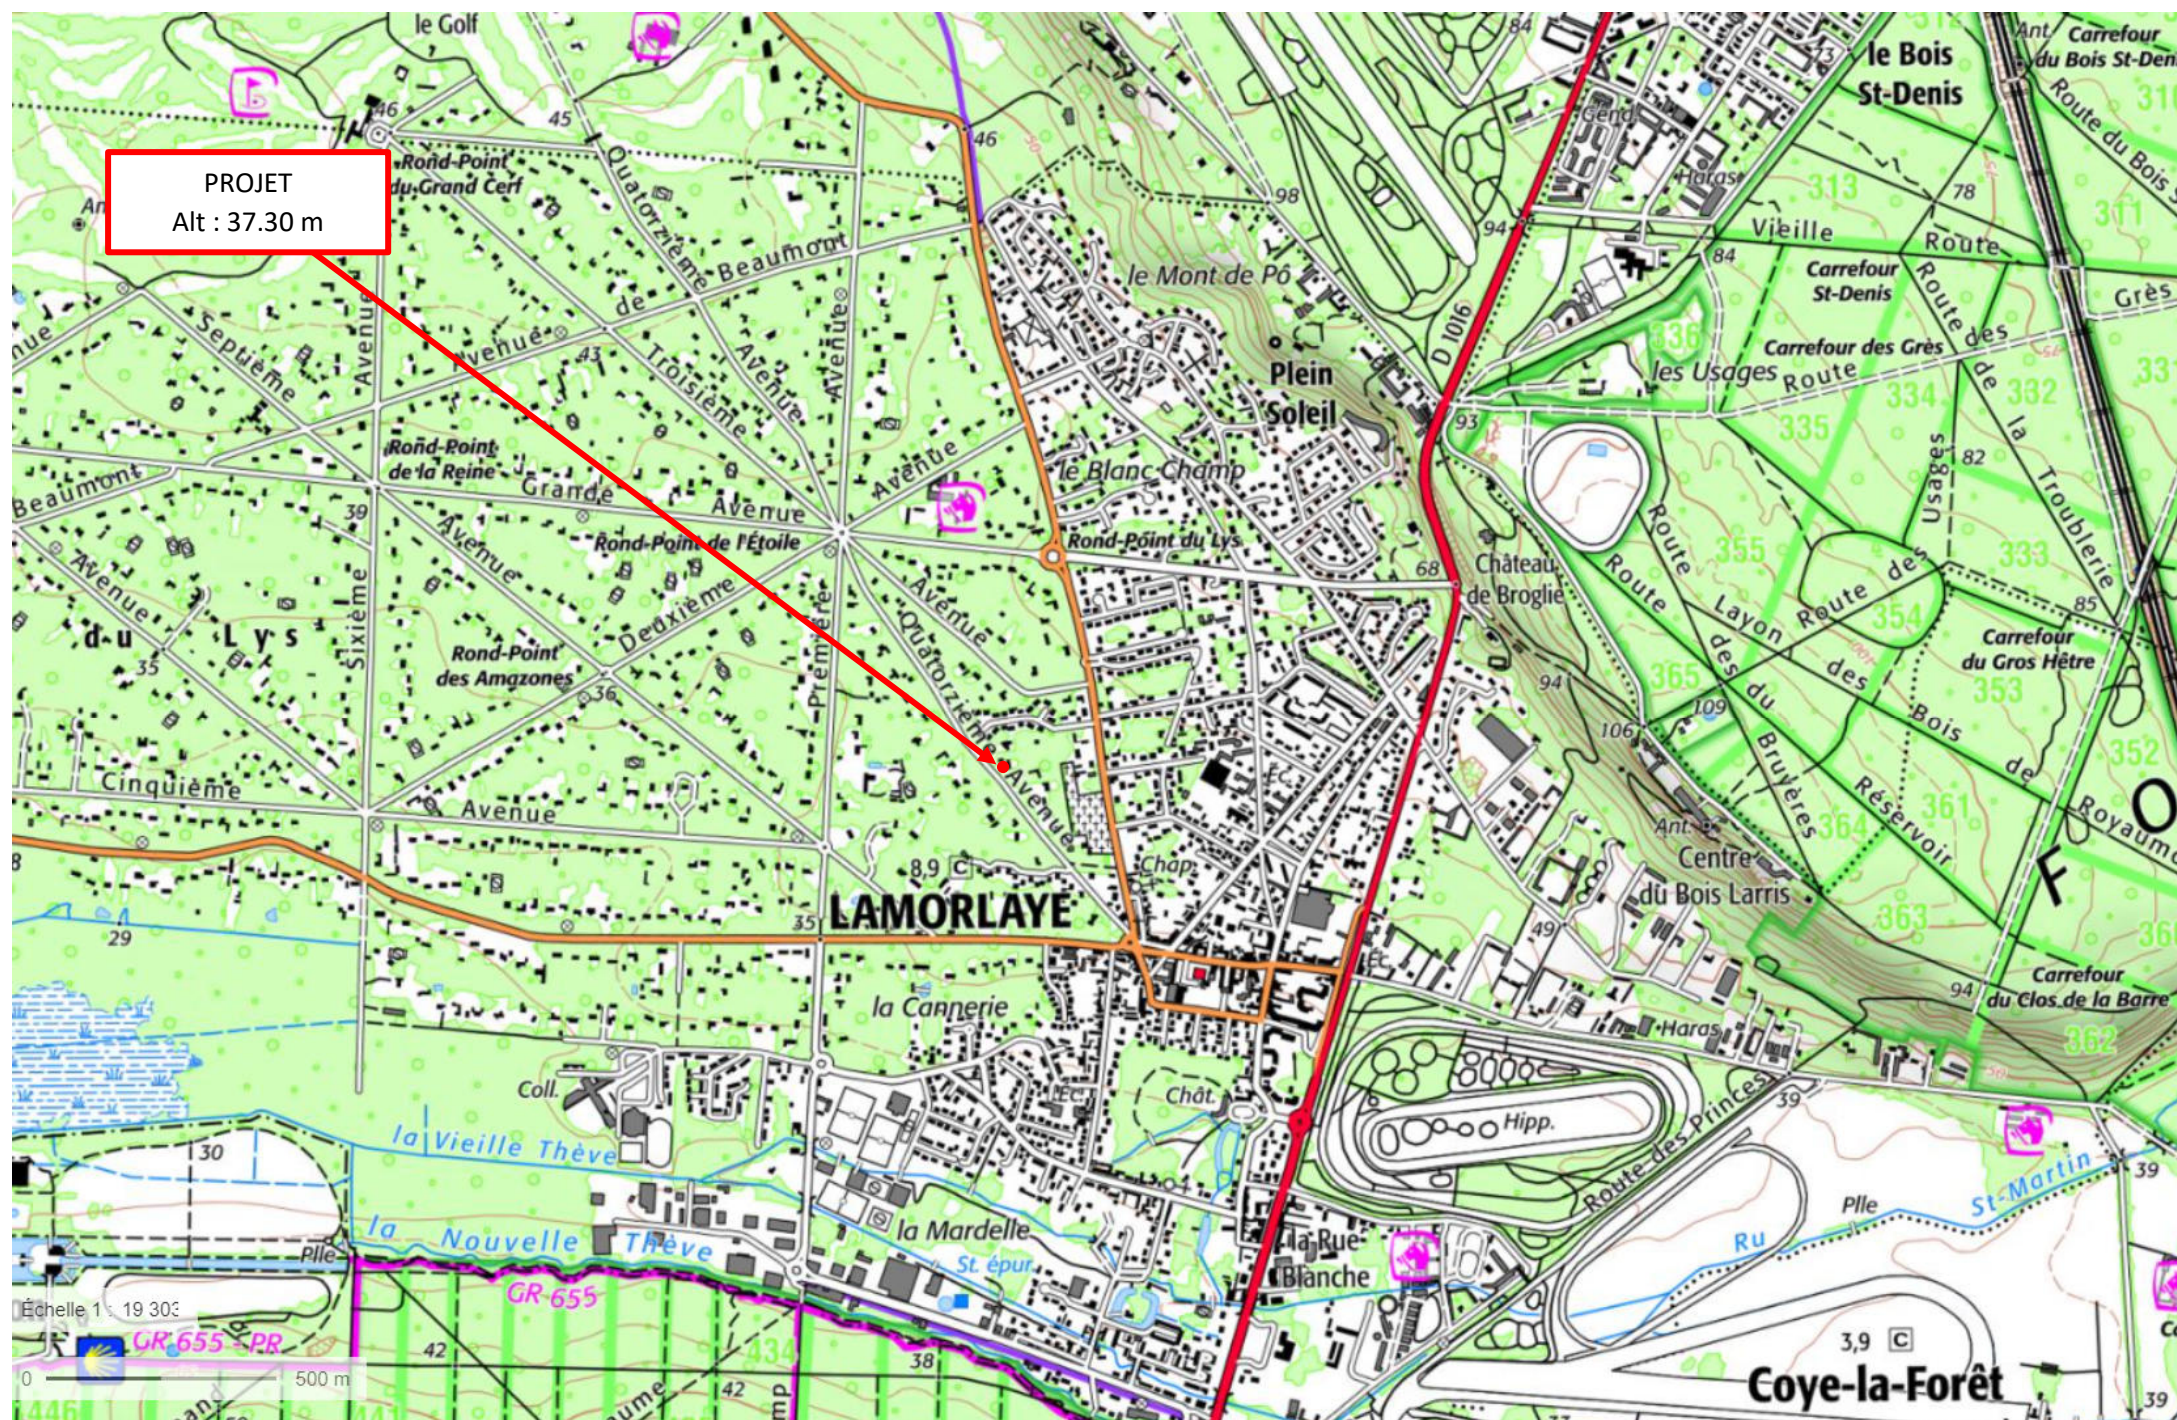



## RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :		
Date :	02/09/2022	n° DREAL : 223680
Affaire suivie par :	Mr TABOR Robert, TABOR Eco Chauffage	
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'arrosage	
Lieu du chantier :	Lamorlaye, 12 14e avenue	

## TERRAIN

[illegible]**FORAGE**

<b>Profondeur finale :</b>	<b>37,90</b>
----------------------------	--------------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	5,40	350	Tarière	à sec
5,40	40,00	220	Rotary	Eau

**TUBAGE**

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
0,00	5,40	250	250/234	PVC		x
-0,50	5,90	140	140/126	PVC		x
5,90	37,90	140	140/126	PVC	x 2 mm	

# RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS			TEL : 03.26.97.11.61		
Client :					
Date :		02/09/2022		n° DREAL : 223680	
Affaire suivie par :		Mr TABOR Robert, TABOR Eco Chauffage			
Type de chantier :		Forage d'eau pour les besoins de l'arrosage			
Lieu du chantier :		Lamorlaye, 12 14e avenue			

## MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

## CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	5,40	CPJ45	x		350	250
0,00	5,00	CLK	x		234	140
5,00	5,40	Sobranite	x		234	140
5,40	5,90	Jupe			234	140

<b>POMPAGE</b>	NS (m) :	9,07	Côte / Sol (m):	-0,5	Pompe :	SP 8/10
----------------	----------	------	-----------------	------	---------	---------

ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
22,27	12,00	0h20
22,40	12,00	0h30
Arrêts / démarrages :		
17,60	12,00	0h20
Arrêt : 10 mn		
20,30	12,00	0h20
Arrêt : 10 mn		
12,10	7,00	0h30
12,05	7,00	1h00
12,01	7,00	3h00
Acidification :	1,00	tonne(s)
11,20	12,00	0h30
11,25	12,00	1h30
11,26	12,00	4h00

ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
11,26	12,00	4h00
Débit spécifiques		
Q' =	5,48	m <sup>3</sup> / h / m
Coordonnées :		
- X : 2,43469		
- Y : 49,15909		
- Z : 37,00 m		
Observations :		

**Remarques :** Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.  
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.  
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

# RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :		
Affaire suivie par :	Mr TABOR Robert, TABOR Eco Chauffage	
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'arrosage	
Lieu du chantier :	Lamorlaye, 12 14e avenue	

