

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU 37 ML

Entreprise: **SARL BREBANT FORAGE**

Client:

Maître d'oeuvre: **SARL BREBANT FORAGE**  
ZA 8 RUE DU COURTIL  
50510 CERENCES

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** La Rampotière  
50660 QUETTREVILLE SUR SIENNE

**Coordonnées :** Longitude 0 Latitude 0 **Altitude :** 0.00 m  
Zone Lambert 1 carto métrique

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :** 09/09/2021

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 09/09/2021

**Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :** Stenuick

**Resp. Chantier :**

**Date début pompage :** **Niveau statique non perturbé :** 10.00 m

**Date fin de pompage :** **Débit Maxi. d'essai :** 0.00 m3/h

**Nombre de nappes identifiées :** **Rabattement correspondant :** 0.00 m

**Notes :** POMPAGE MAXIMUM 5.5 M3/HEURE

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU 37 ML

Client:

Maître d'oeuvre:

SARL BREBANT FORAGE

Lieu de l'ouvrage :

La Rampotière

50660

QUETTREVILLE SUR SIENNE

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	9.00	SCHISTE MARRON
9.00	37.00	SCHISTE BLEU TRES TENDRE FRACTURE

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
10.00	37.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
20.00	2.00
30.00	10.00
37.00	11.00

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	17.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
17.00	21.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes		
21.00	29.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
29.00	37.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes		

## REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	9.00	4"7/8	125.00	Ciment	Ciment-bentonite	Sous pression			
9.00	10.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactonite				

# FORAGE D'EAU 37 ML

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage :

SARL BREBANT FORAGE

La Rampotière

50660

QUETTREVILLE SUR SIENNE

Travaux réalisés :

du : 09/09/2021 au : 09/09/2021

1/1

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique

Longitude (X):

0

Latitude (Y):

0


Altitude sol (Z):

+0,000 m

Echelle : 1/186

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

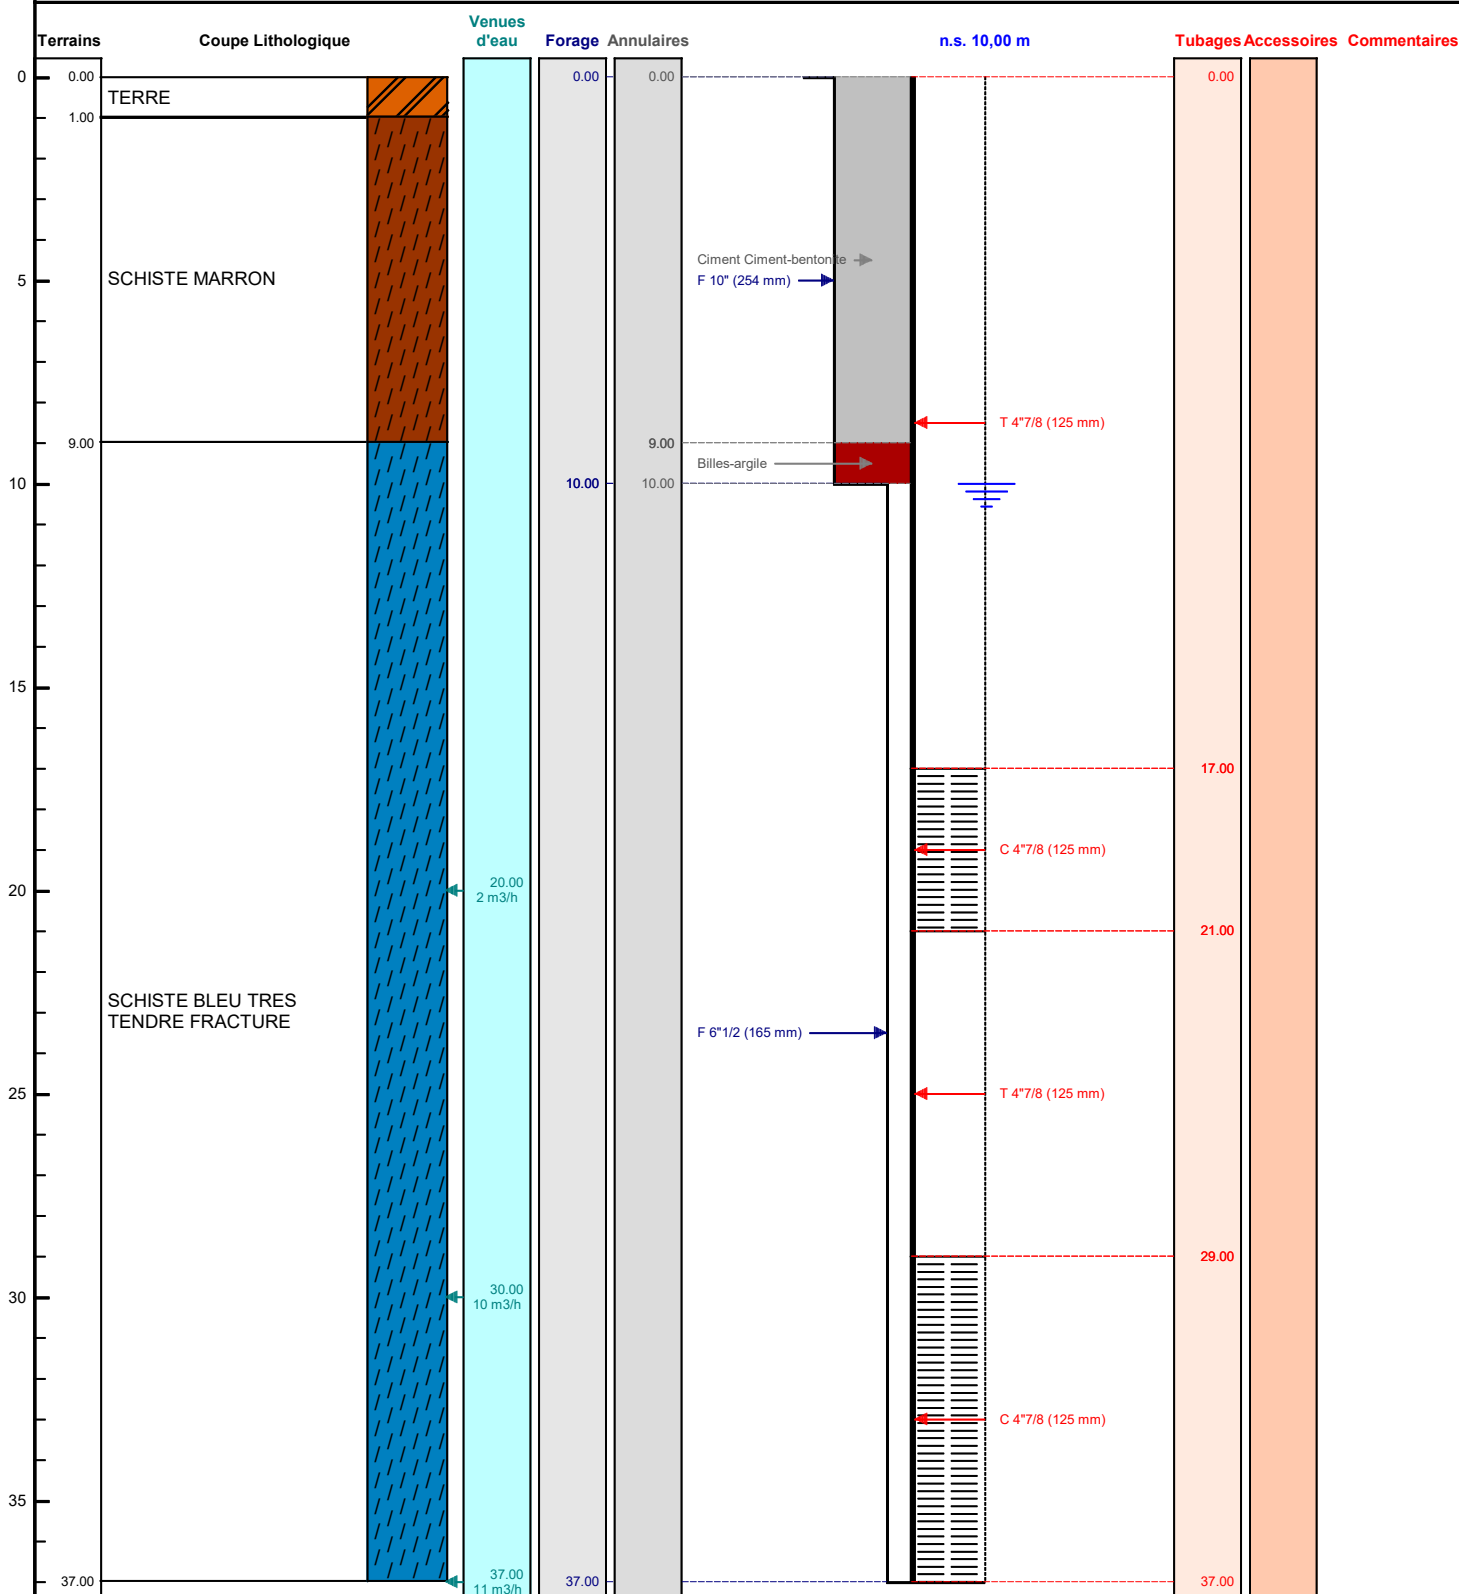

Le ...../...../..... à .....

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise

Lambert 1 carto métrique

Long.:

0

Lat.:

0

Alt.: +0,000 m

PAGE: 3
