

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU 31 ML

Entreprise: **SARL BREBANT FORAGE**

Client:

Maître d'oeuvre: **BREBANT FORAGE**
ZA DU CLOS DES MARES
50290 BREHAL

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : LDT MOISSEY
61220 BRIOUZE

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 0.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 17/03/2022

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 17/03/2022

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Stenuick

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 8.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes : POMPAGE MAXIMUM 7.5 M3/HEURE

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU 31 ML

Client:

Maître d'oeuvre:

BREBANT FORAGE

Lieu de l'ouvrage :

LDT MOISSEY

61220

BRIOUZE

LITHOLOGIE

| De | à | Libellé |
|-------|-------|---------------------|
| 0.00 | 2.00 | TERRE |
| 2.00 | 11.00 | SCHISTE MARRON |
| 11.00 | 31.00 | SCHISTE GRIS MARRON |

FORAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Mode de forage | Fluide de forage |
|-------|-------|-------|--------|----------------|------------------|
| 0.00 | 12.00 | 10" | 254.00 | M.f.t. | Air |
| 12.00 | 31.00 | 6"1/2 | 165.00 | M.f.t. | Air |

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

| Profondeur (m) | Débit (m3/heure) |
|----------------|------------------|
| 20.00 | 2.00 |
| 25.00 | 13.00 |
| 31.00 | 15.00 |

TUBAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Epais. | Ecra. | Nature du tubage | Type | Slot | Vide % |
|-------|-------|-------|--------|--------|-------|------------------|----------------|------|--------|
| 0.00 | 15.00 | 4"7/8 | 125.00 | 5.00 | | P.v.c. | Tube-plein | | |
| 15.00 | 23.00 | 4"7/8 | 125.00 | 5.00 | | P.v.c. | Crepine fentes | | |
| 23.00 | 27.00 | 4"7/8 | 125.00 | 5.00 | | P.v.c. | Tube-plein | | |
| 27.00 | 31.00 | 4"7/8 | 125.00 | 5.00 | | P.v.c. | Crepine fentes | | |

REMPLISSAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Matériau | Nature | Méthode de pose | Texture | Gra. (mm) | Vol. m3 |
|-------|-------|-------|--------|---------------|------------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 0.00 | 11.00 | 4"7/8 | 125.00 | Ciment | Ciment-bentonite | Sous pression | | | |
| 11.00 | 12.00 | 4"7/8 | 125.00 | Billes-argile | Compactonite | | | | |

FORAGE D'EAU 31 ML

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage :

61220 BRIOUZE

Travaux réalisés :

du : 17/03/2022 au : 17/03/2022

1/1

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique

Longitude (X):

0

Latitude (Y):

0


Altitude sol (Z):

+0,000 m

Echelle : 1/156

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

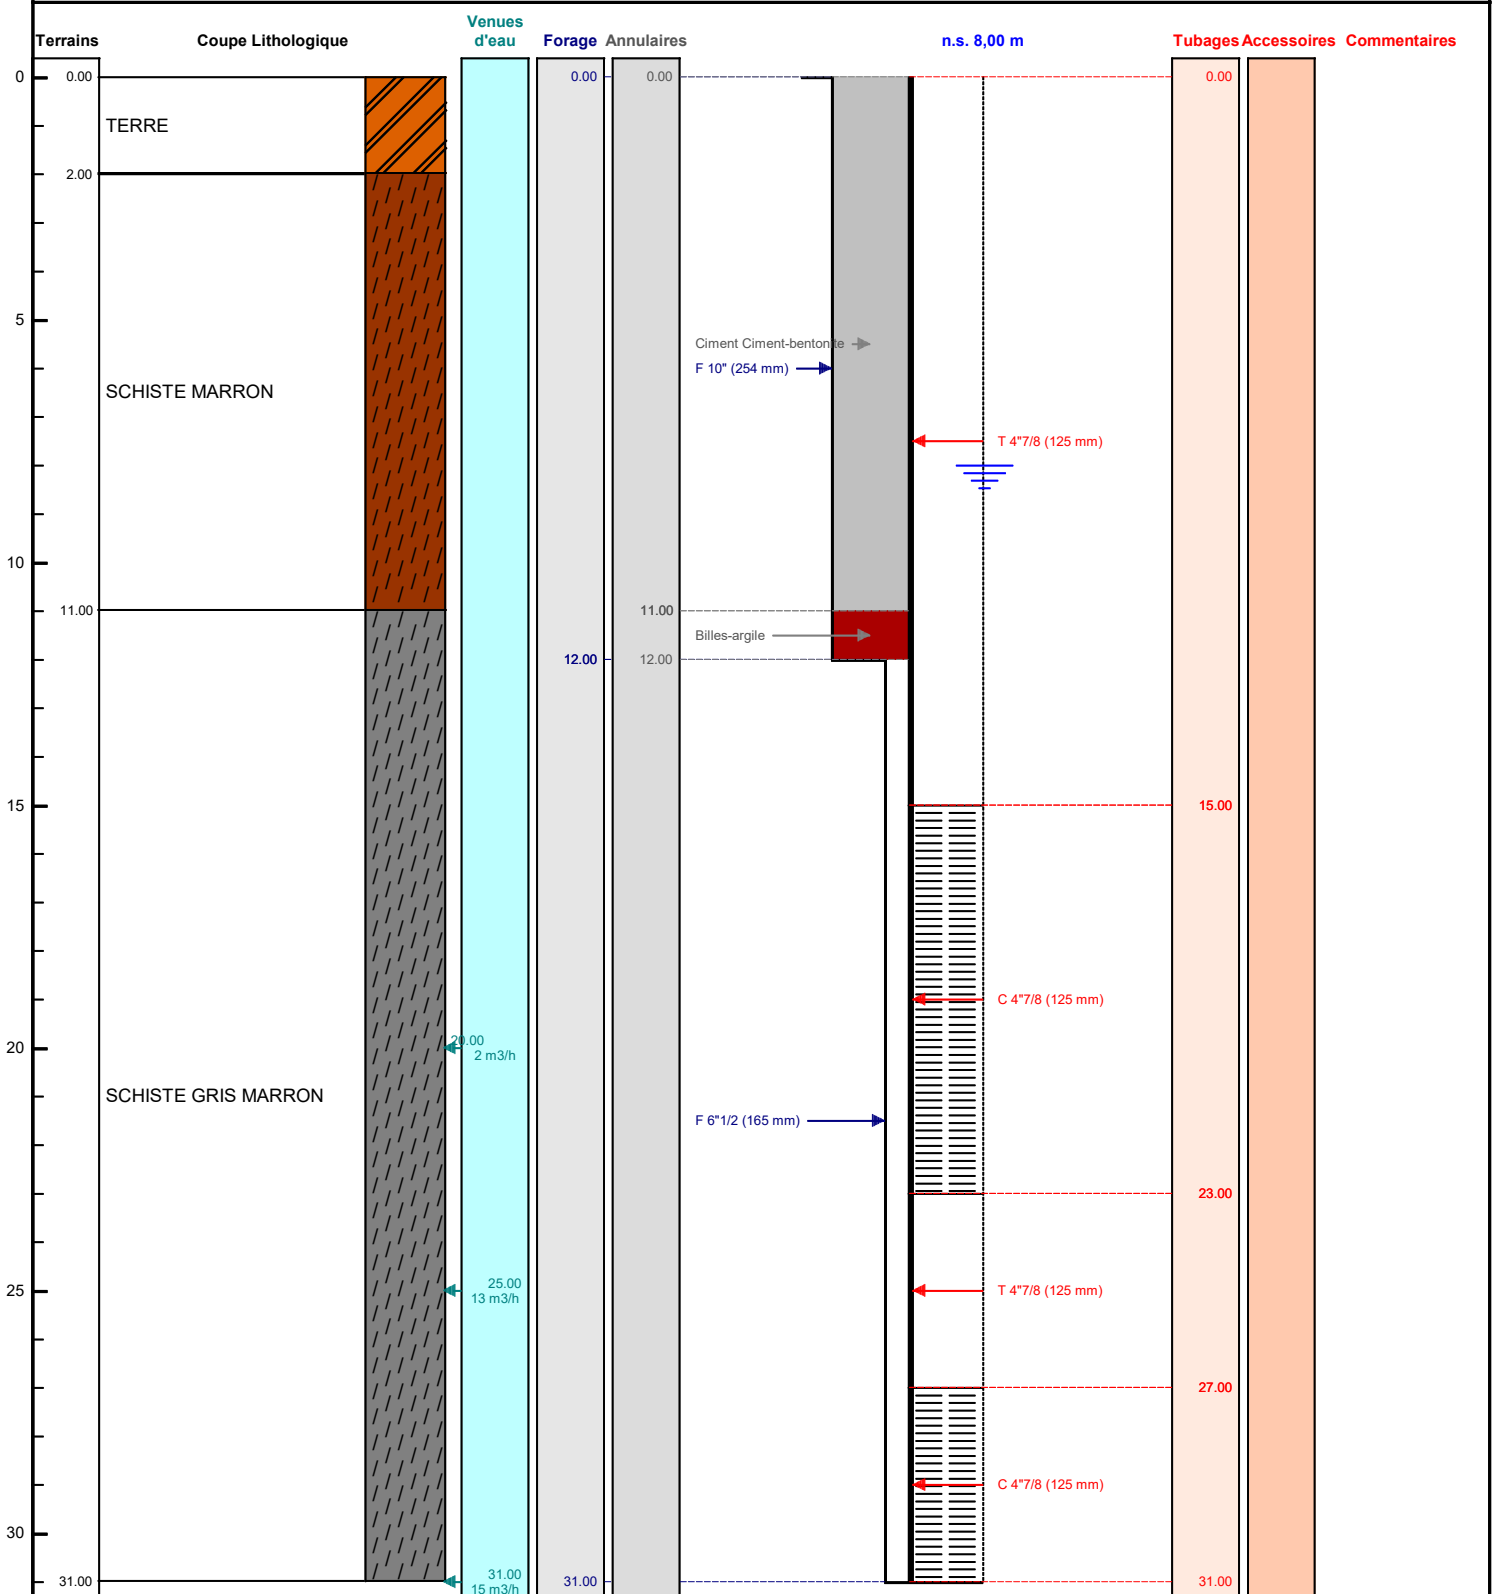

Le/...../..... à

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise
