



S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-51.com


TRAVAUX DE FORAGE POUR L'ABREUVAGE DES ANIMAUX

à

Guignicourt - Variscourt (02)

~

**TRAVAUX REALISES
LE
20 Juin 2022**

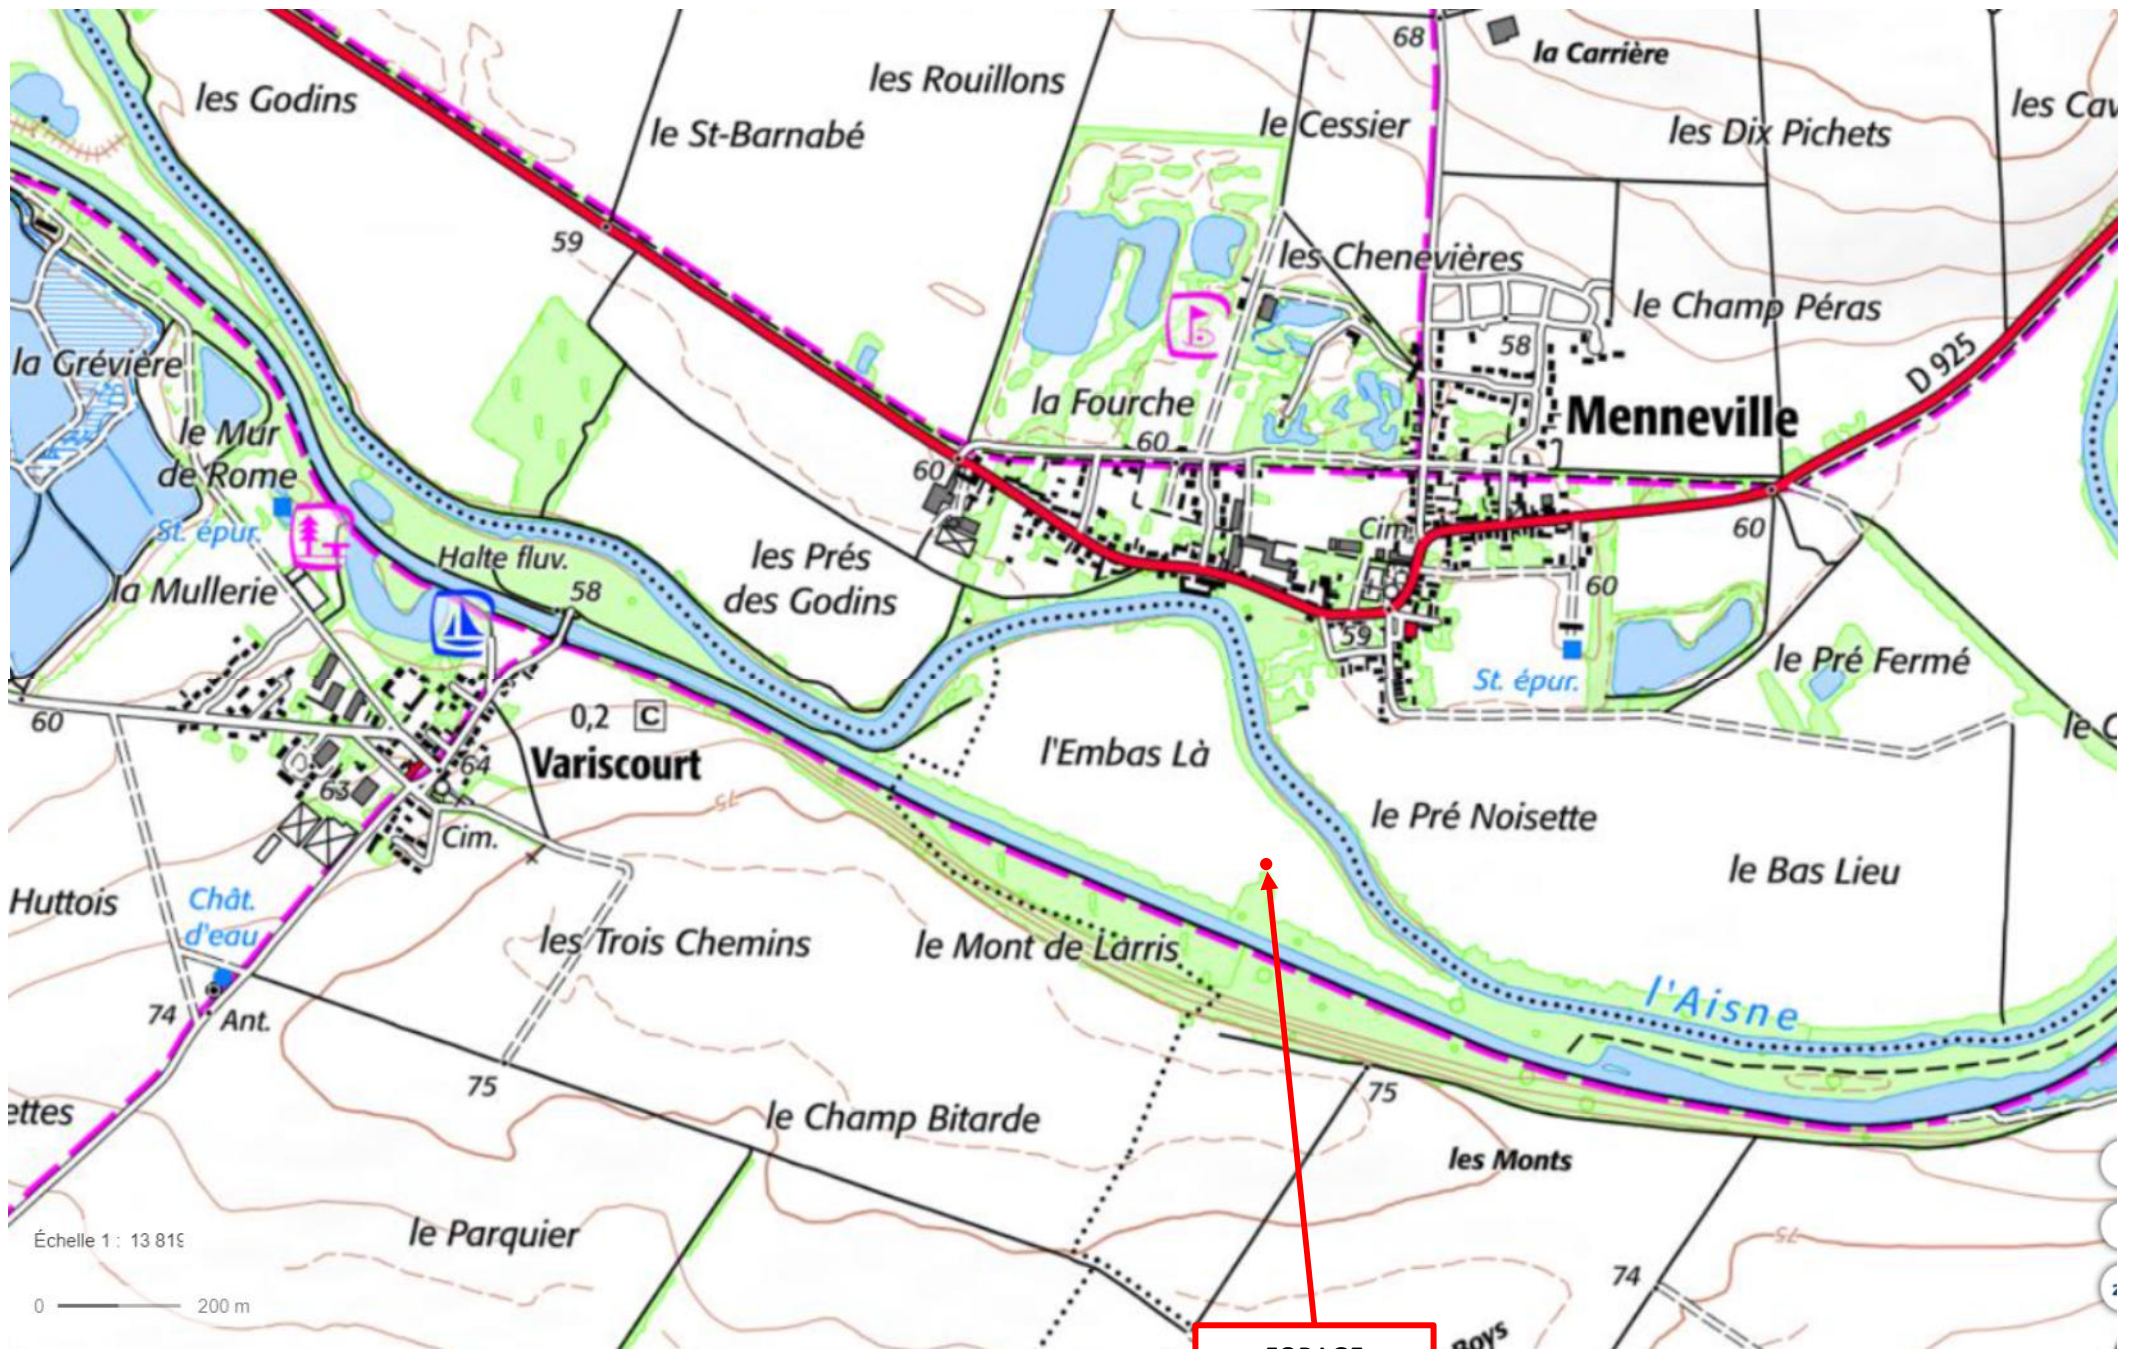

FORAGE
Alt : 56.50 m

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL :	03.26.97.11.61
Client :			
Date :	20/06/2022	n° DREAL :	204183
Affaire suivie par :			
Type de chantier :	Forage d'eau pour abreuvement des animaux		
Lieu du chantier :	Variscourt (51)		

TERRAIN

[illegible]**FORAGE**

Profondeur finale :	22,00
----------------------------	--------------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	7,00	311	Tarière	à sec
7,00	7,85	200	Battage	à sec
7,85	22,00	180	Tarière	à sec

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
0,00	7,85	200	200/184	PVC		x
-0,60	10,00	140	140/126	PVC		x
10,00	22,00	140	140/126	PVC	x 2 mm	

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61
Client :		
Date :	20/06/2022	n° DREAL : 204183
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour abreuvement des animaux	
Lieu du chantier :	Variscourt (51)	

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de	Méthode		Entre Ø	et Ø
		ciment	Gravité	Tube		
0,00	7,00	CPJ45	x		311	200
0,00	9,00	CPJ45	x		180	140
9,00	9,50	Jupe			180	140

POMPAGE	NS (m) :	2,78	Côte / Sol (m):	-0,6	Pompe :	SP 8/10
----------------	-----------------	-------------	------------------------	-------------	----------------	----------------

ND (m)	Q (m3)	Temps
2,95	12,00	3h
2 Arrêts / démarrages : 10'/10'		
Acidification :	-	tonne(s)
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m3)	Temps
2,95	12,00	3h
Débit spécifiques		
Q' =	70,59	m ³ / h / m
<u>Coordonnées :</u> - X : 4,00472 - Y : 49,41569 - Z : 56,50 m		
<u>Observations :</u>		

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61	
Client :			
Date :	20/06/2022	n° DREAL :	204183
Affaire suivie par :			
Type de chantier :	Forage d'eau pour abreuvement des animaux		
Lieu du chantier :	Variscourt (51)		

